


Sørheim Omsorgssenter - Nytt varmeanlegg Fremdriftsplan milepæler


Aktivitet	2021						
	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober
Utsendelse tilbudsgrunnlag for utførelse	15.apr						
Tilbudsfrist		05.mai					
Avklaring tilbud/ innstilling ca. 10 dager		14.mai					
Klagefrist (1 uke)		21.mai					
Bestilling/kontrakt		25.mai					
Søknad igangsettingstillatelse			01.jun				
Igangsettingstillatelse (et -trinn) 3 uker behandlingstid			25.jun				
Nødvendige avklaringer/ prosjektering (5 uker)			01.jun	10.jul			
Riving pelletsanlegg (2 uker)			15.jun	01.jul			
Bygging ny fordelerstokk inklusiv tappevann (6 uker)			15.jun		01.aug		
Omkobling EL-kjel og oljekjel til ny fordelerstokk (2 uker)					1-15 aug		
Nytt Radiatoranlegg del A (2 mnd)			10.jun		01.aug		
Nytt Radiatoranlegg del B (1,5 mnd)					10.aug		15.sep
Nye batterier i aggregater (2 uker)					15-30. aug		
Ombygning omsorgsbolger (2 uker)					15-30 aug		
Riving resterende teknisk anlegg i varmesentral (2 uker)					1-15 Aug		
Montasje Nye varmepumper (6 uker)					15.aug		01.okt
Gravearbeider brønner/ boring og rørlegging (3 mnd)			15.jun			15.sep	
Igangkjøring VP							10.okt

AVD B

AVD A

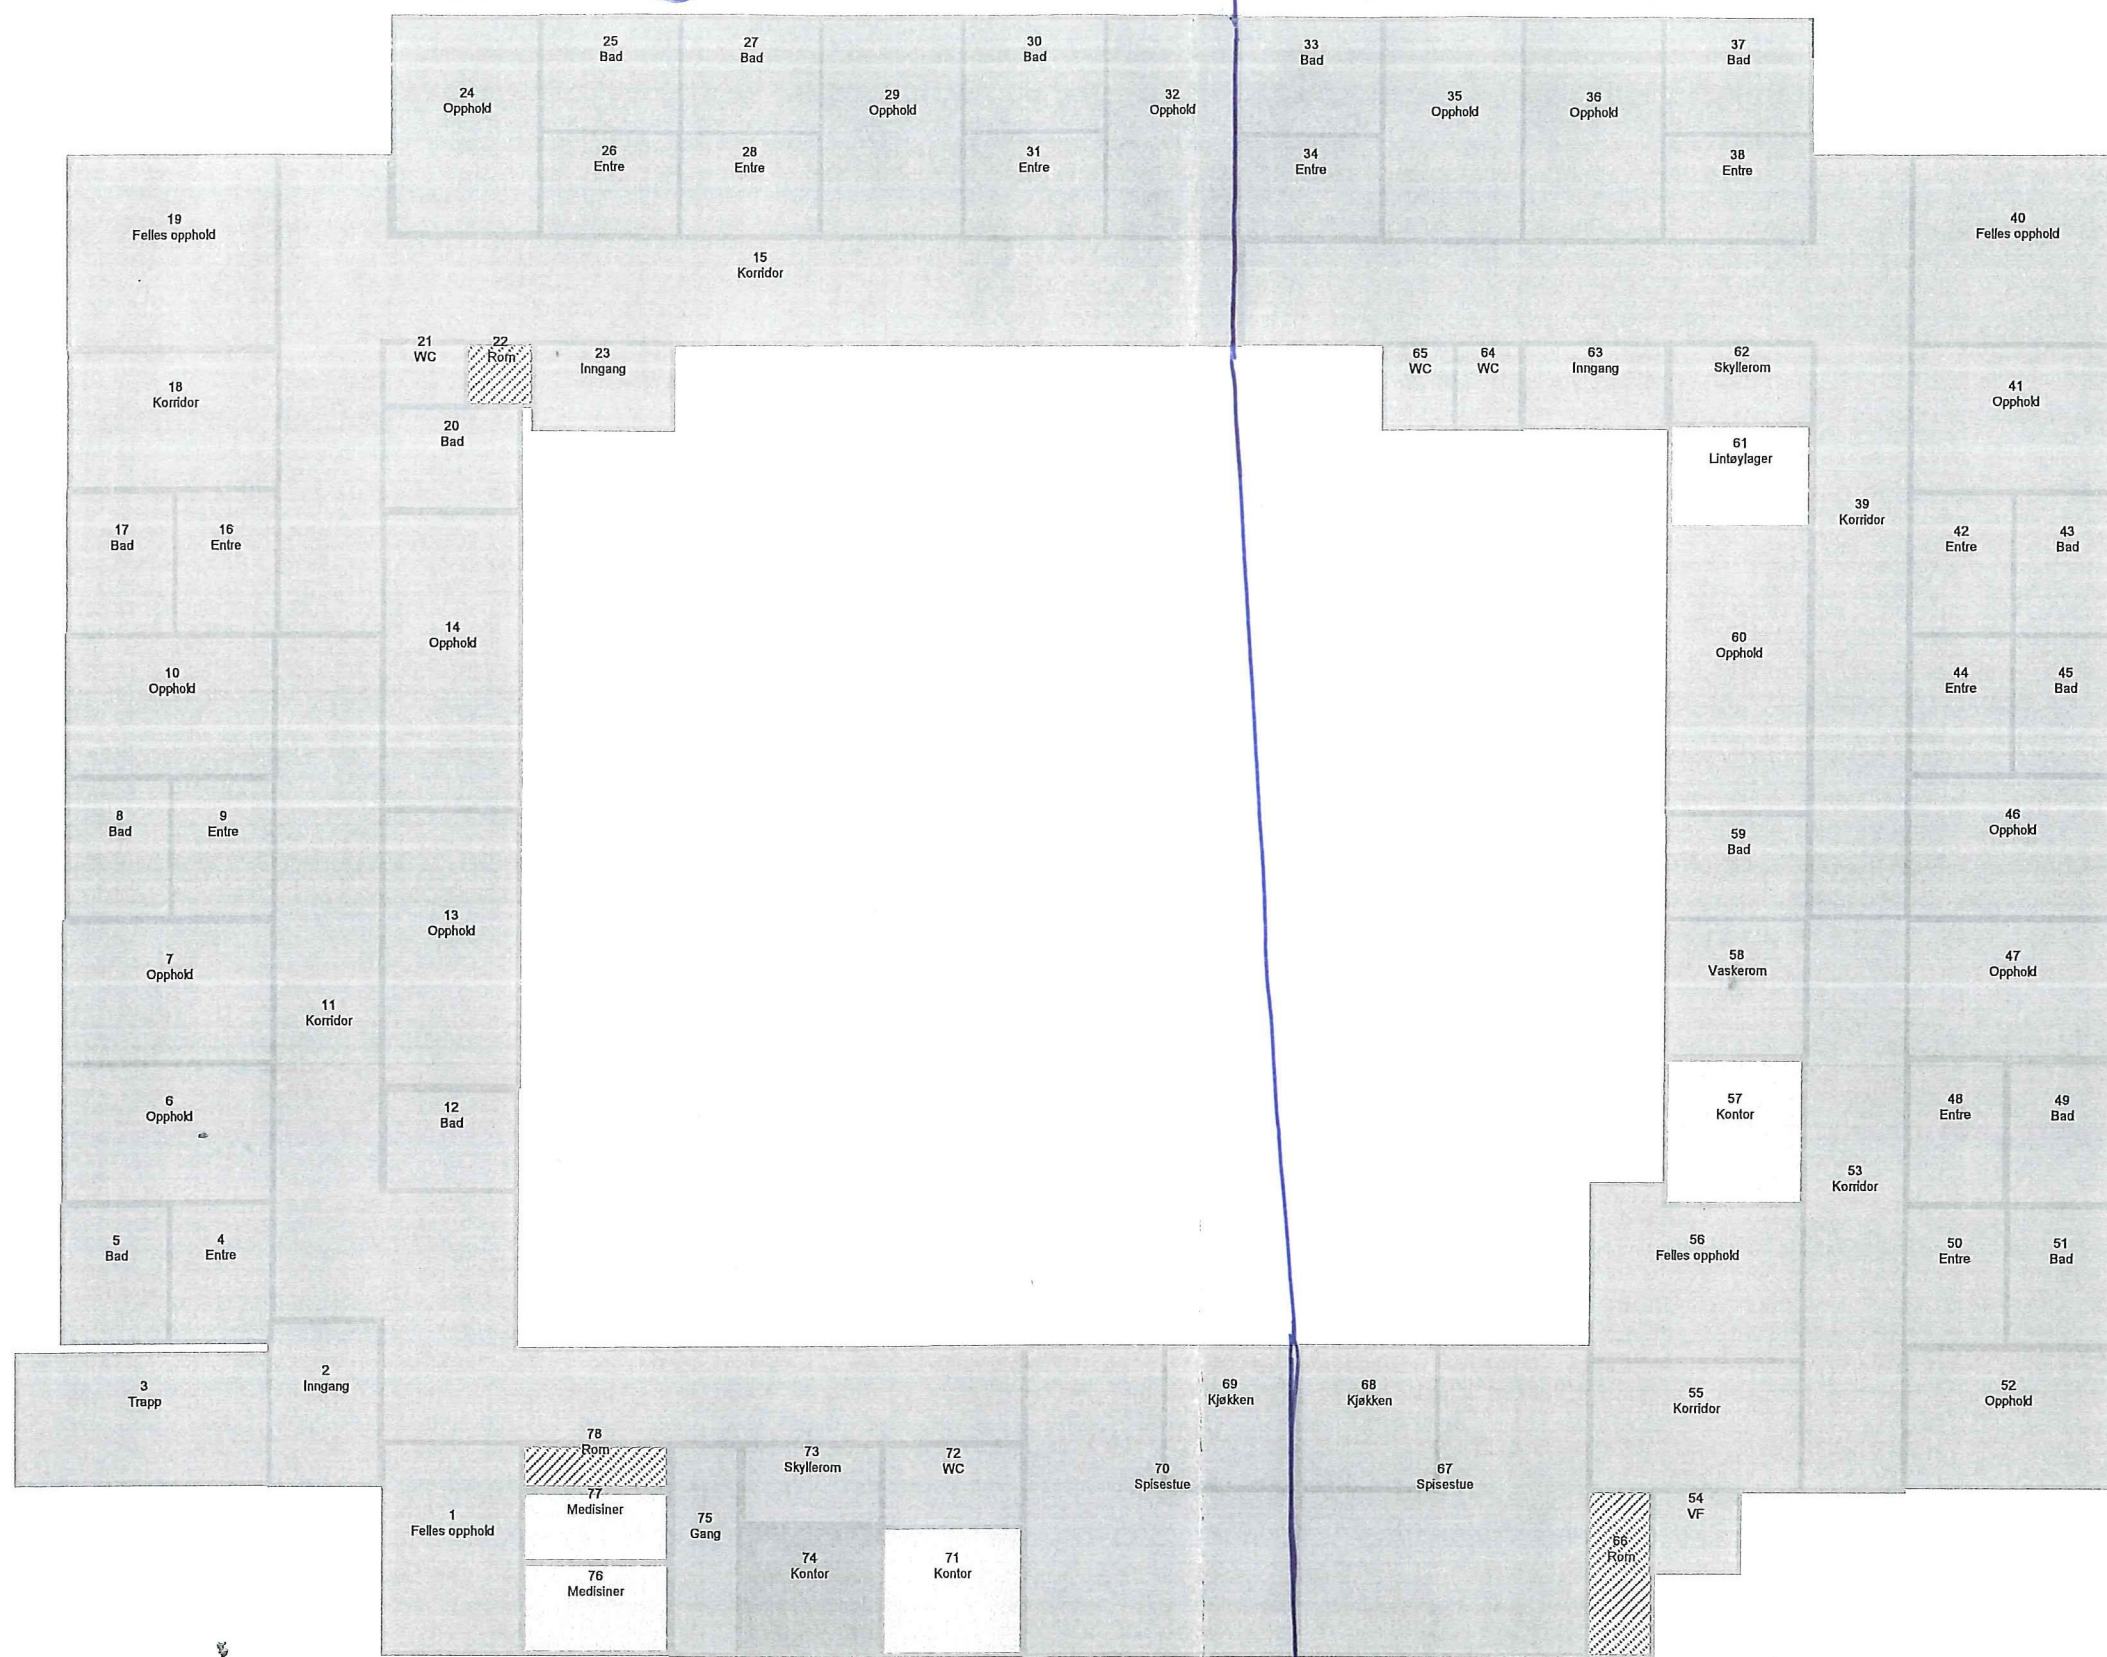

Frekvens Daglig Renhold



Lilleborg
Profesjonell

1 etg		TEGN.NR. (000) 000
Aldershjem	Plantegning	MÅL 1:170
Sørheim omsorgssenter	Lilleborg Profesjonell Sandakerveien 56, 0401 Oslo Telefon 815 36 000	DATO 01.10.2014
		SIGN NN
		JONATHAN FDV
