
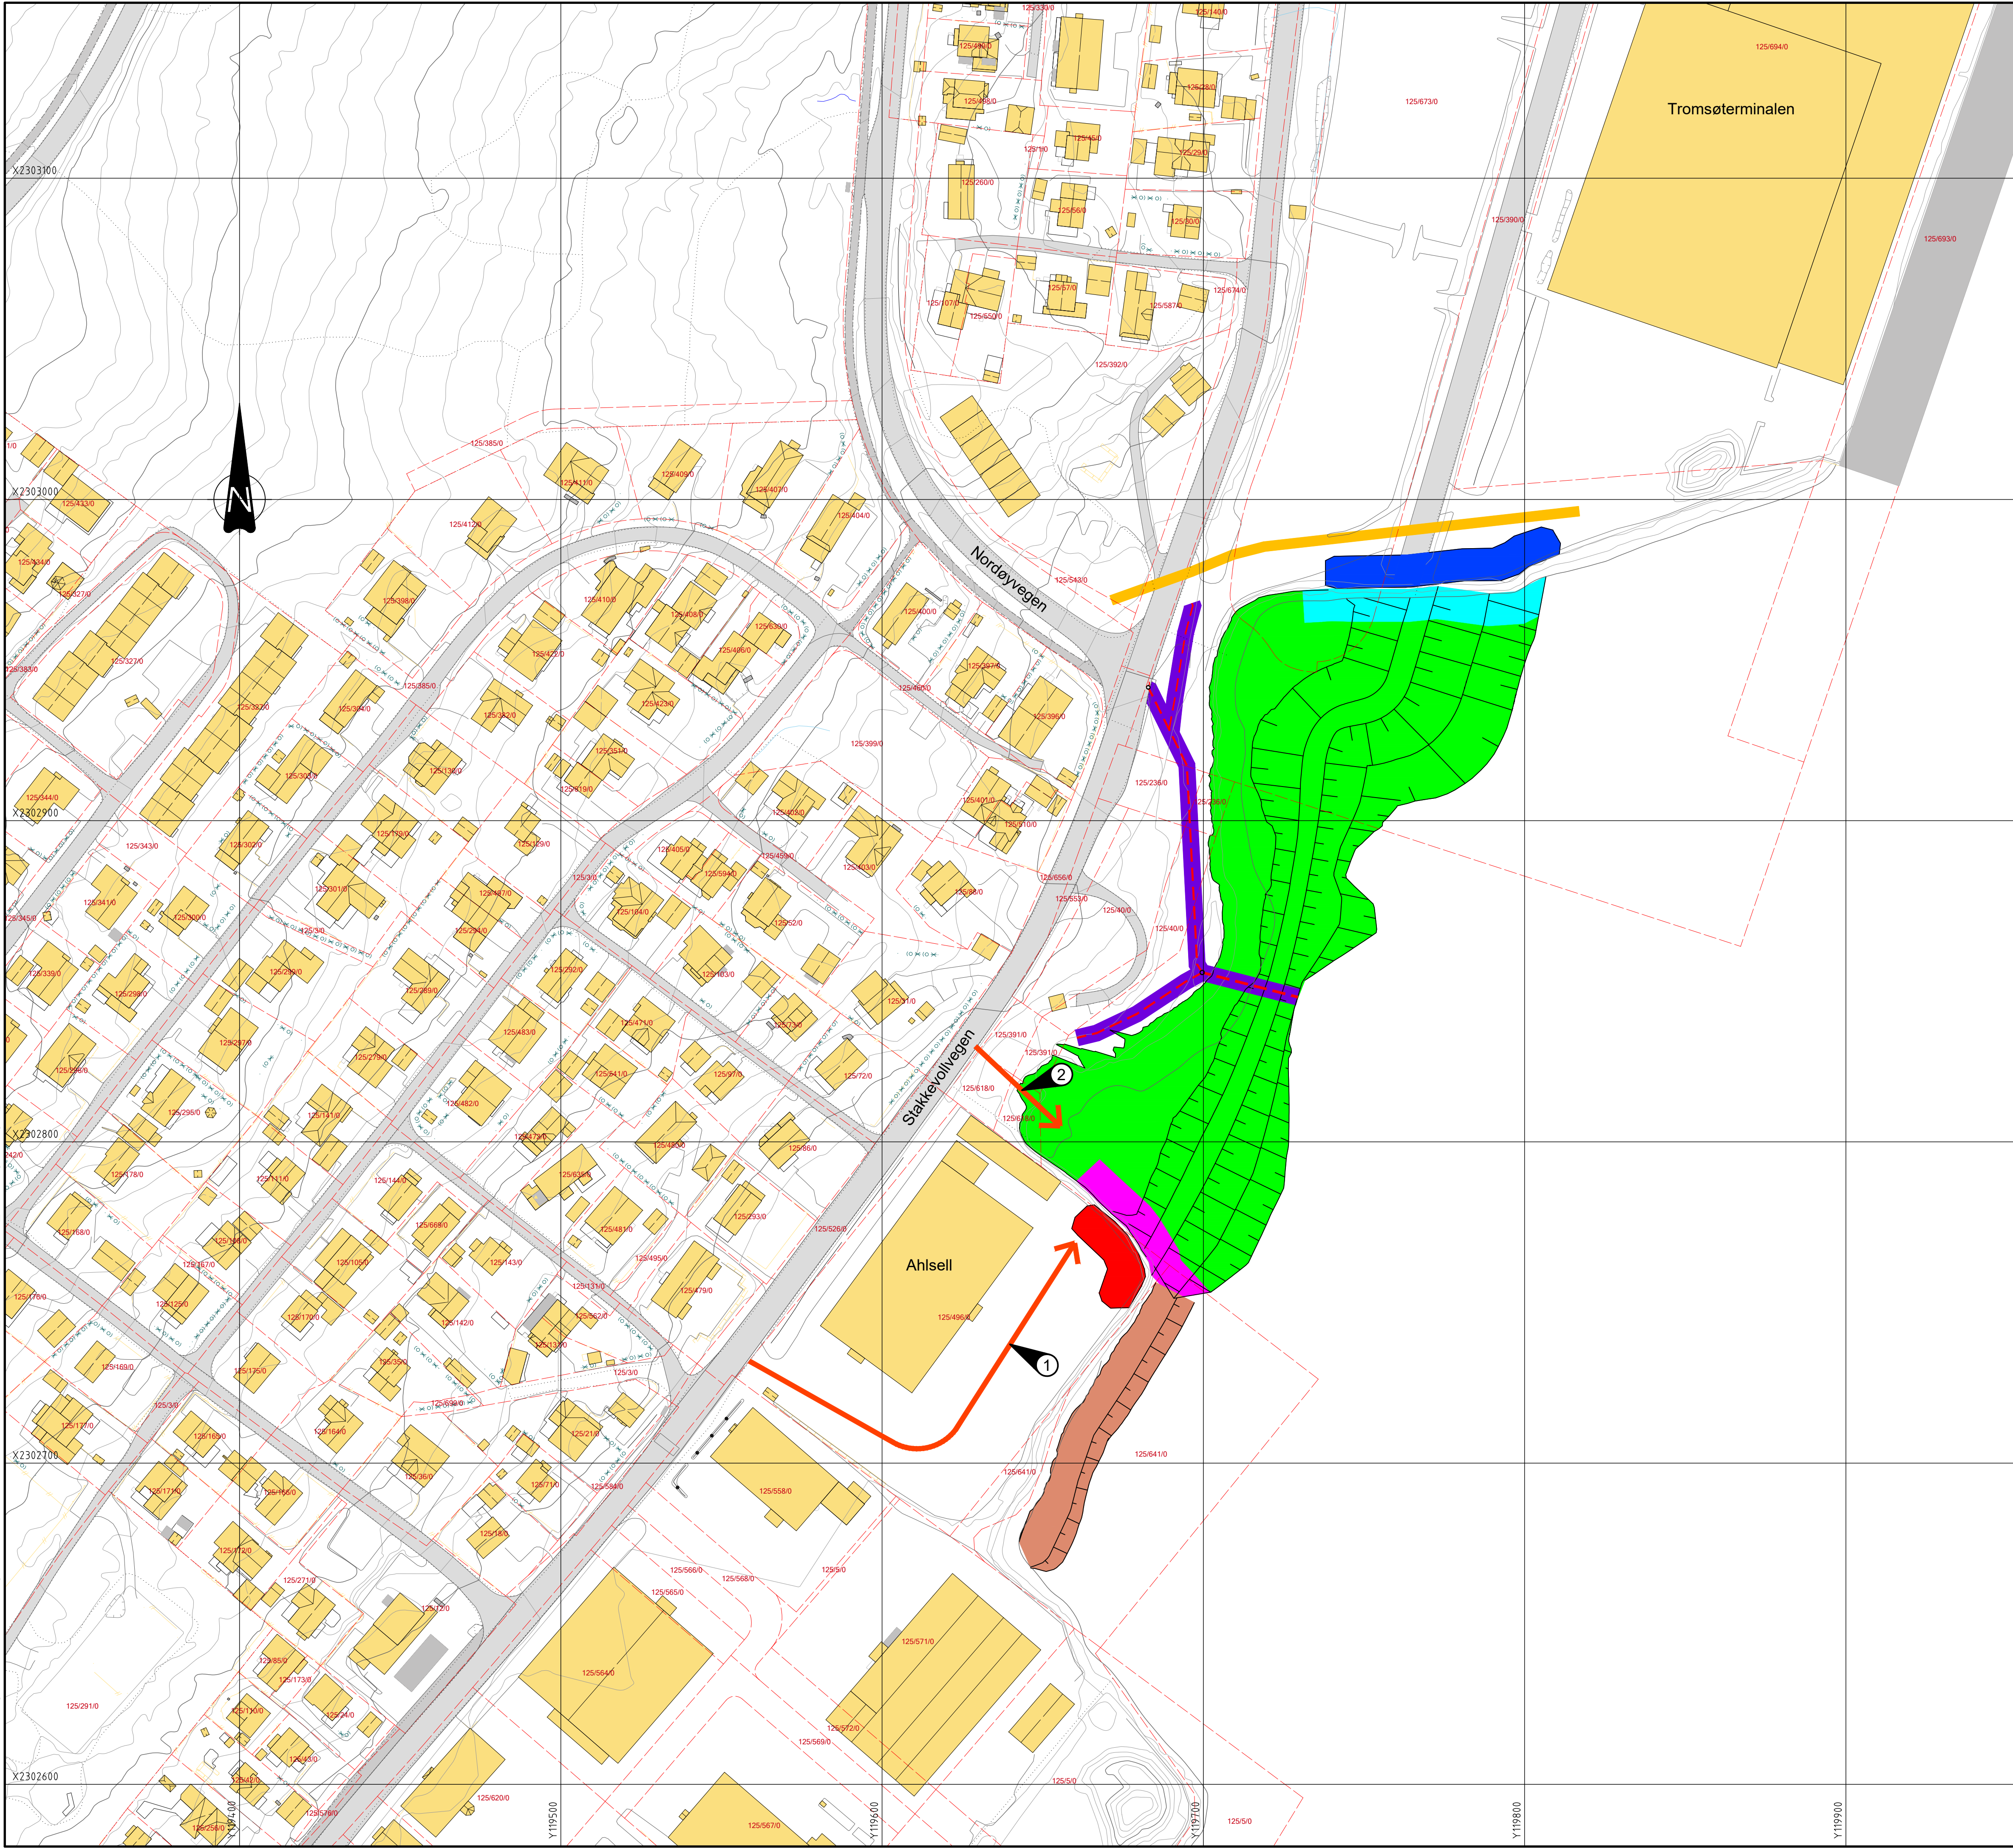


"N:\5230010\52300818\BIN\Veg\Arkiv\Del 1\LAY-Y.dwg - GAK - Plottet: 2023-04-21, 14:08:23 - XREF = T_Faseplan, Del 1, VA_Midlertidig_løsning, T_GRUNNKART, T_SEOM_SJØFYLLING-MUDRING"




TEGNFORKLARING

- Fase 1  Avlasting av eksisterende fyllinger i sør og nord.
- Fase 2  Mudring, utfylling med sprengtstein, tilbakefylling med mudringsmasser i fremkant.
- Fase 3  Tilbakefylling av avlastet fylling i sør etter at fase 2 er ferdigstilt.
- Fase 4  Seksjonsvis mudring og utfylling med sprengtstein. Tilbakefylling med mudringsmasser i fremkant og innenfor sjøfylling. Erosjonsikring. Arbeidet anbefales startet i sør og utføres i retning nord. Kan utføres samtidig som fase 3.
- Fase 5  Mudring, utfylling med sprengtstein, tilbakefylling med mudringsmasser i fremkant.
- Fase 6  Tilbakefylling av avlastet fylling i nord etter at fase 5 er ferdigstilt.
- Fase 7  Motfylling, fylling med sprengstein.
-  VA. Utføres i fase 1 til 4.
-  OPI (og omlegging av høyspent). Utføres i fase 1 til 3. OPI må stå ferdig til omlegging av sjøkabel startes. Koordineres mot Arva og Telenor (OneCo) sine arbeider ifm omleggingen.

HENVISNINGER

Det henvises til geoteknisk prosjekteringsrapport 52300818-RIG-R01 for detaljert arbeidsrekkefølge og utførelse.

MERKNADER

- ①  Anleggsatkomst fase 1, 2, 3 og start av 4.
- ②  Anleggsatkomst fase 4 og 7

A		Arbeidstegning			GAK	GREWIA	GAK	2023-04-27
Revisjon	Revisjonen gjelder				Utarb	Kontr	Gadkjent	Rev. dato
 Fv7772 Stakkevollvegen - Skattørvegen Del 1 - utfylling sjø Faseplan					Tegningsdato		2023-04-27	
					Bestiller		Øyvind Strømseth	
					Produsert for		TFFK	
					Produsert av		Norconsult AS	
					Prosjektnummer		2165032	
					Prosjektfase		P	
Arbeidstegning					Arkivreferanse		22-24	
					Målestokk A1-format		1:1000	
					Koordinatsystem		NTM18/NN2000	
					Tegningsnummer/ revisjonsboksnavn		Y001	
Utarbeidet av	Kontrollert av	Gadkjent av	Konsulentarkiv	52300818		A		
GAK		GREWIA		GAK		52300818		
