


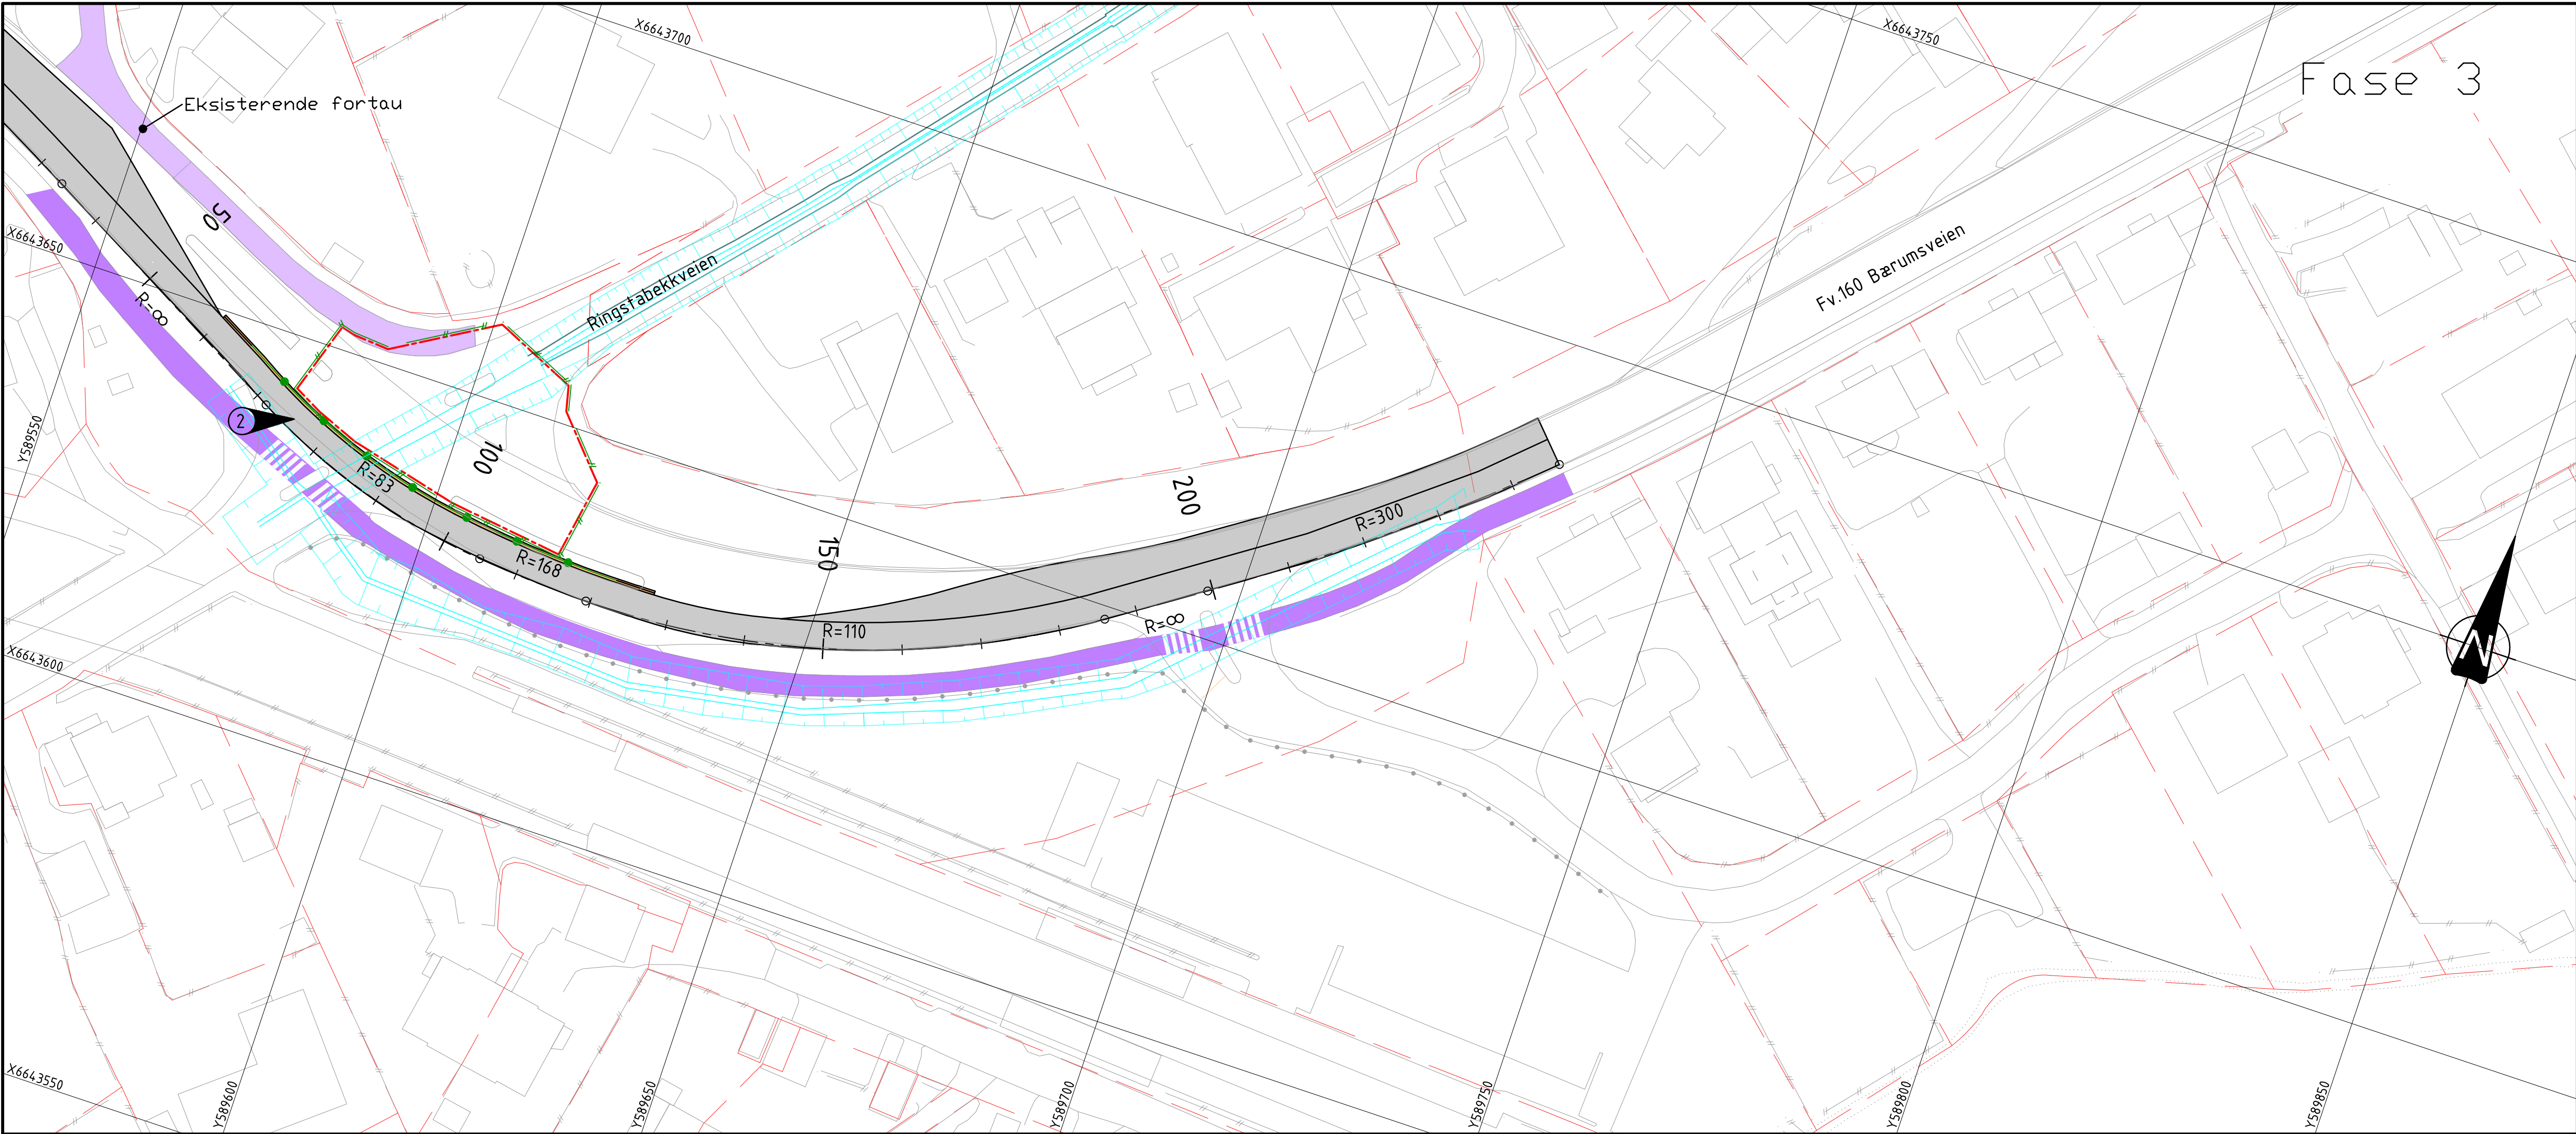

Arbeid fase 1

To kjørefelt gjennom området.

GS-veien sør for fv.160 graves opp, og gående og syklende ledes til eksisterende kjørebane. Det må sikres med funksikring mot trafikk.

Ved behov kan GS-veien flyttes og tilpasses i tråd med byggegropen.

GS-veien bør ikke være smalere enn 2m.

Arbeidsvarslingsplan skal vise nødvendige tiltak som ivaretar trafikksikkerheten for mye trafikanter under byggeperioden.

Arbeid fase 2

Ett kjørefelt i øst av anleggsområdet.

GS-veien gjenopprettes til sin opprinnelige tilstand etter at anleggsarbeidene er ferdige. I en kort periode vil gående og syklende bli ledet bort fra anleggsområdet i øst og inn på kommunale Bærumsveien.

Arbeid fase 3

Ett kjørefelt i krysset.

Graving skjer i den nordre delen i krysset.

Gående og syklende ferdes i den oprinnelige GS-veien.

Alternativ utførelse fase 2-3

Samtidig utførsel av fase 2-3, ved bruk av ett kjørefelt i ca. 200 m i lengde i deler av eller hele anleggsperioden.

Alternativet erstatter både fase 2 og fase 3 som er angitt over.

Krav

Fartsgrense 30km/t legges til grunn.

Kjørebane skal ikke være bredere enn 3,5m hvor det er ett kjørefelt, og min. 6,0m hvor det er to kjørefelt.

Rekkverk med styrkeklasse T1 skal benyttes.

ProTec 100 eller tilsvarende rekkverk med arbeidsbredde ≤0,4m skal benyttes.

Merknad

Gangfelt er kun vist som illustrasjon.

En oppmerkingsplan i tråd med gjeldende regler skal inkluderes i arbeidsvarslingsplanen.

Entreprenøren må sørge for å minimere tiden krysset mellom Bærumsveien og Ringstabekkveien blir påvirket av anleggsarbeidet og ikke kan opprettholde normal funksjon.

Se "Notat faseplan"

1 Alternativ GS-vei tilpasses og sideforskyves i tråd med byggegropen.

2 Kjørefeltet tilpasses og sideforskyves i tråd med byggegropen.


Tegnforklaring

Eksisterende

- Eiendomsgrense
- Mur
- Gjerde
- Hekk

Prosjektert

- Vei
- GS-vei
- Blandet trafikk
- Rekkverksrom
- Aktiv anleggsgrense/-belte
- Grøfteutslag fra utgraving
- Midlertidig rekkverk
- Midlertidig rekkverk, nedføring
- Gjerde

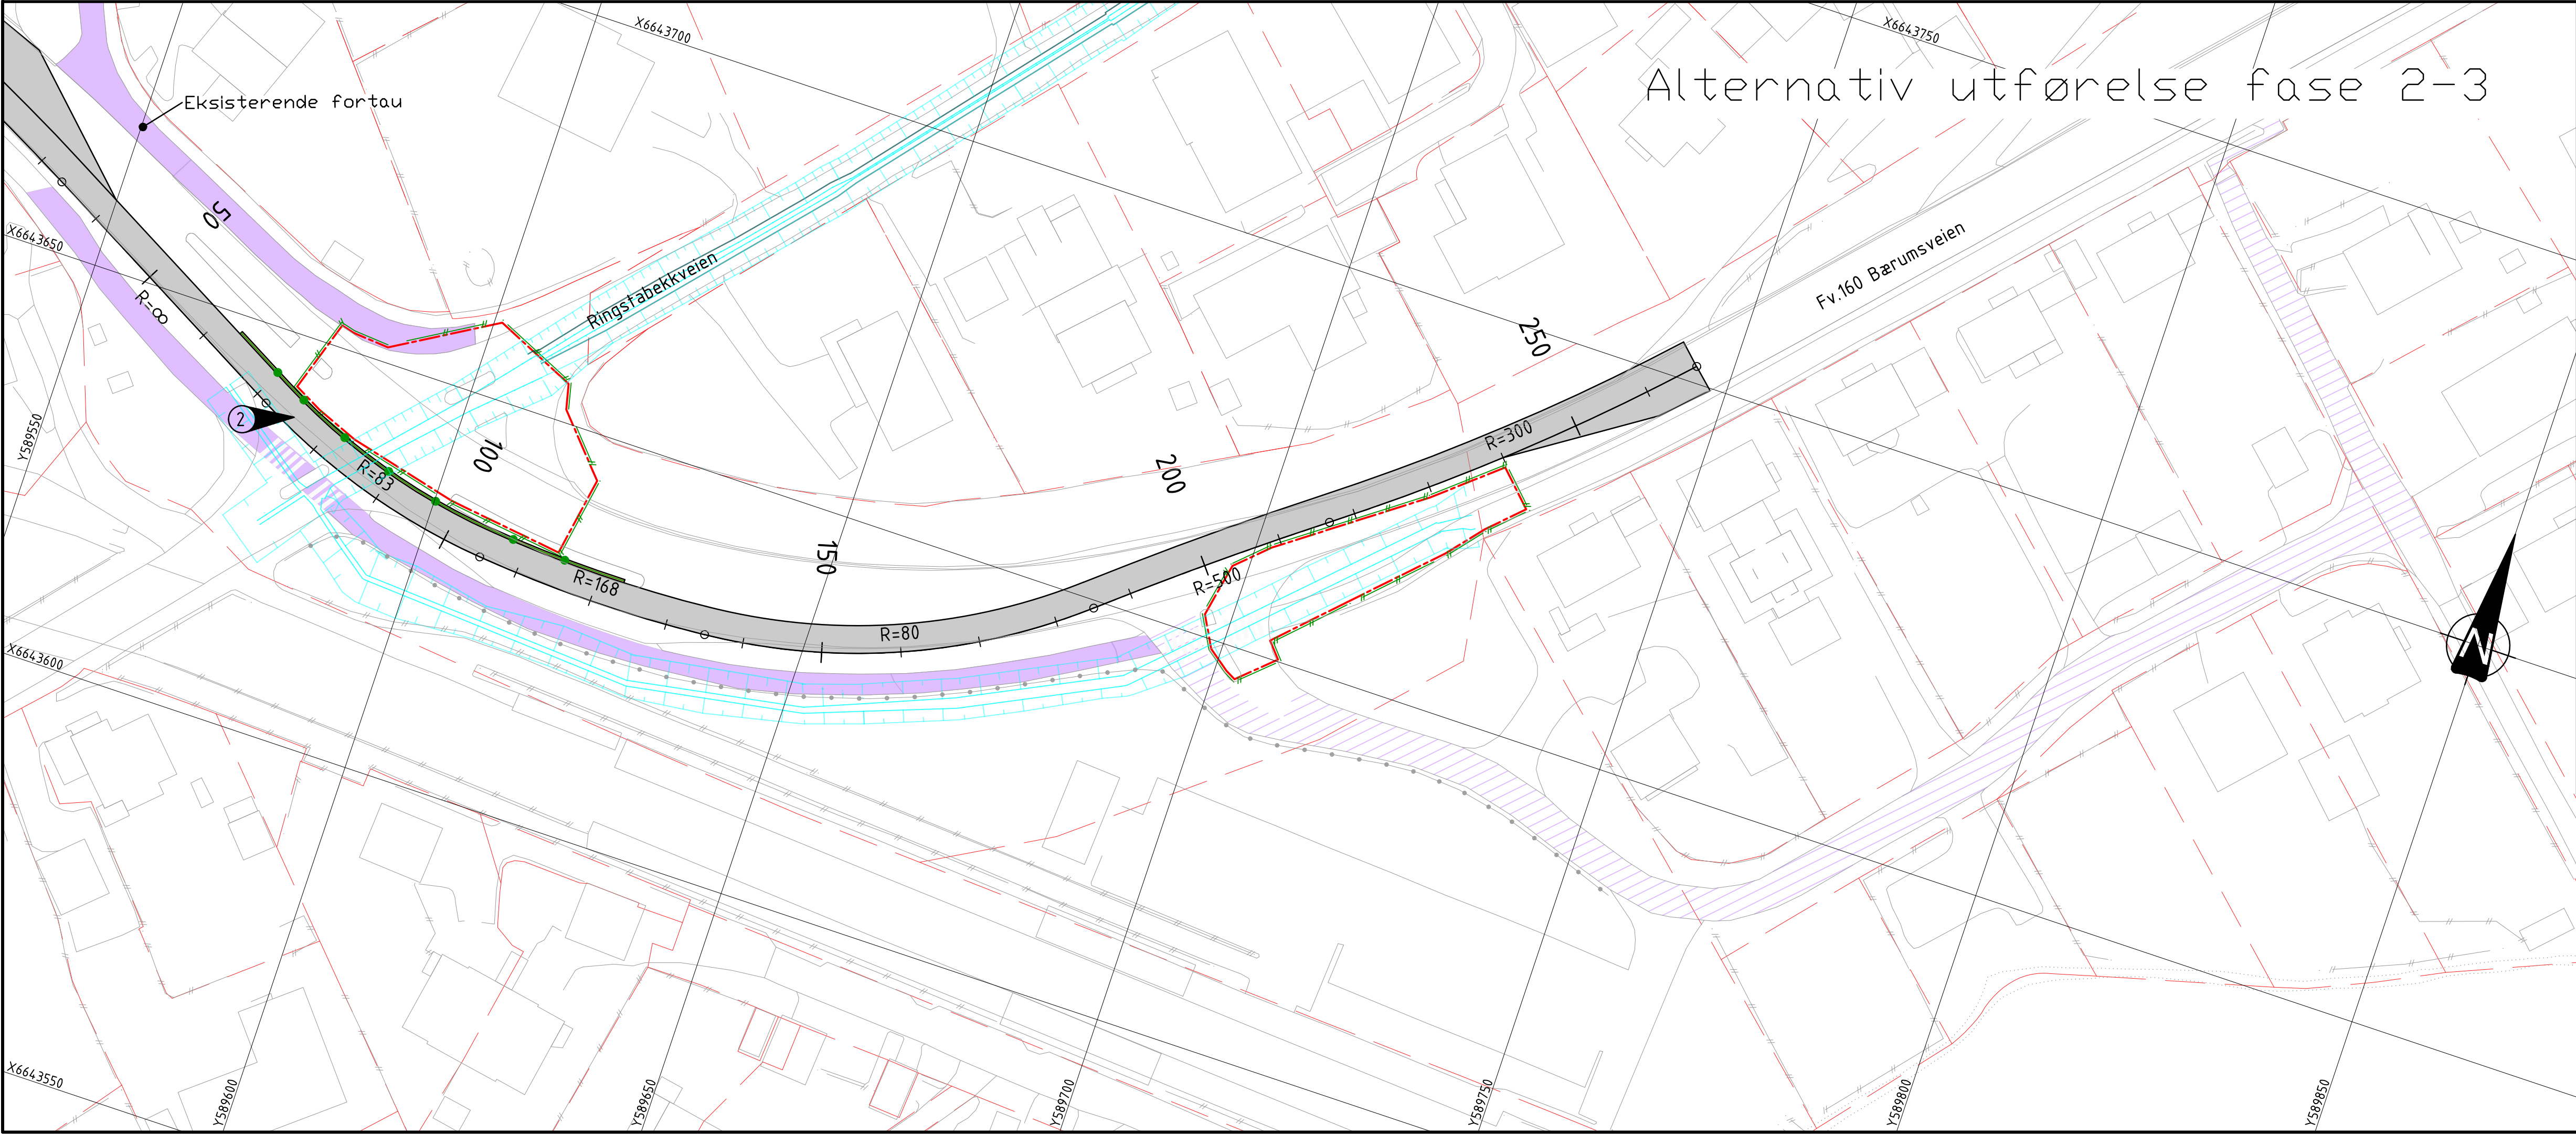

00	Tilbudstegning	NOANIM	NOKRMO	09.02.2024
Rev	Endring	Urf	Kont	Dato
Oppdragsgiver	BÆRUM KOMMUNE PROSJEKTENHETEN 1304 SANDVKA	Utført av NOJIXI	Kontrollert av NOHEDV	
Dato	12.06.2023	Ansvarlig	NOJACL	
Format	1:500			
Fv.160 Bærumsveien	A1			
Bærumsveien x Ringstabekkveien	10224198			
Faseplan - fase 3 og alternativ fase 2-3	Andreas Køste			
Tegningsstatus	Tilbudstegning			
SWECO				
Fagdisiplin	Tegningsnummer (bygg-et-fag-syst-type-løpenr)	Status	Rev.	
Y	Y102	B	00	
