


12.01.2018

rev.: 01

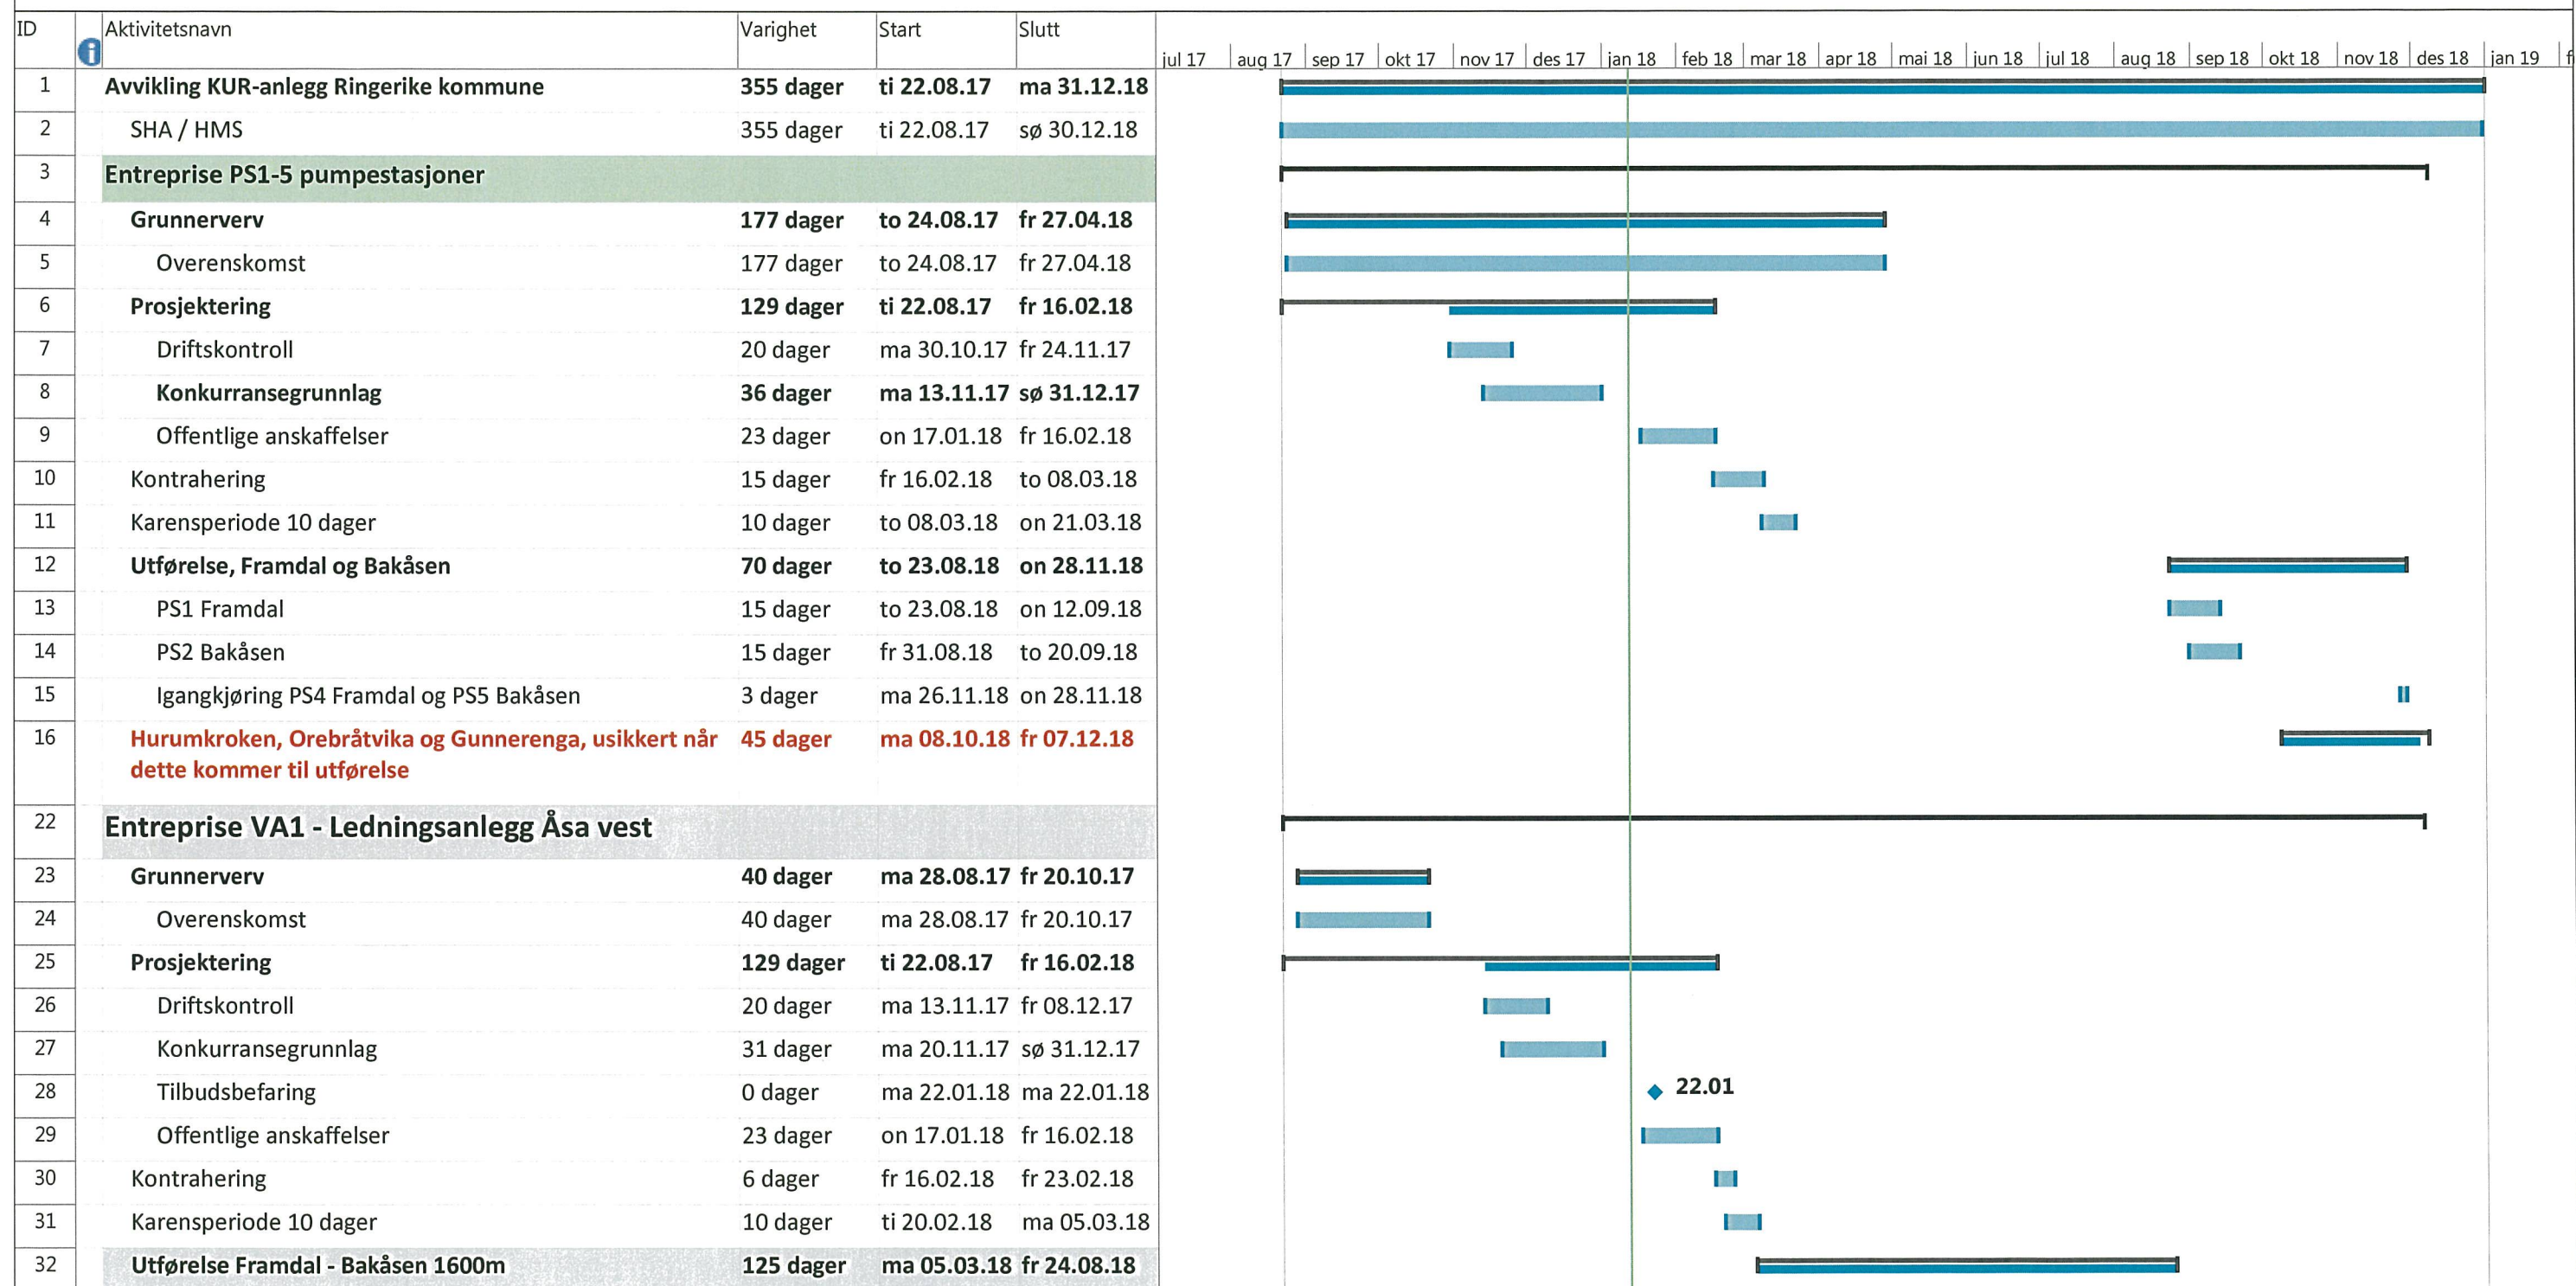

Prosjekt: 2017 08 31 Hoved frem
Dato: fr 12.01.18

Aktivitet
Deling
Milepæl
Sammendrag
Prosjektsammendrag

Inaktiv aktivitet
Inaktiv milepæl
Inaktivt sammendrag
Manuell aktivitet
Bare varighet

Manuell sammendragsfremheving
Manuelt sammendrag
Bare start
Bare slutt
Eksterne aktiviteter

Ekstern milepæl
Tidsfrist
Fremdrift
Manuell fremdrift

↓

12.01.2018

rev.: 01

ID	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	jul 17	aug 17	sep 17	okt 17	nov 17	des 17	jan 18	feb 18	mar 18	apr 18	mai 18	jun 18	jul 18	aug 18	sep 18	okt 18	nov 18	des 18	jan 19	f
33	Utførelse	64 dager	ma 05.03.18 to 31.05.18																					
34	Riving av KUR-anlegg Framdal	5 dager	ma 20.08.18 fr 24.08.18																					
35	Grunnarbeider PS1 pumpestasjon Framdal	2 dager	to 23.08.18 fr 24.08.18																					
36	Ferdigbefaring	5 dager	ma 21.05.18 fr 25.05.18																					
37	Utførelse Bakåsen - Vaker 1000m	66 dager	ma 04.06.18 ma 03.09.18																					
38	Gjennom boring Kalkverket	15 dager	ma 04.06.18 fr 22.06.18																					
39	Utførelse	25 dager	ma 04.06.18 fr 06.07.18																					
40	Riving av KUR-anlegg Bakåsen (Opsjon)	4 dager	ma 27.08.18 to 30.08.18																					
41	Grunnarbeider PS2 pumpestasjon Bakåsen	2 dager	fr 31.08.18 ma 03.09.18																					
42	Sommer ferie	15 dager	ma 09.07.18 fr 27.07.18																					
43	Utførelse	15 dager	ma 30.07.18 fr 17.08.18																					
44	Ferdigbefaring	4 dager	ma 13.08.18 to 16.08.18																					
45	Vaker - Hesleberg 1250m	55 dager	ma 20.08.18 fr 02.11.18																					
46	Utførelse	47 dager	ma 20.08.18 ti 23.10.18																					
47	Ferdigbefaring	5 dager	on 17.10.18 ti 23.10.18																					
48	Mangelutbedring	5 dager	to 18.10.18 on 24.10.18																					
49	Hesleberg - Hønenkrysset 900m	38 dager	ma 15.10.18 to 06.12.18																					
50	Utførelse	36 dager	ma 15.10.18 ma 03.12.18																					
51	Sluttbefaring	5 dager	on 28.11.18 ti 04.12.18																					
52	Desinfisering og trykkprøving	5 dager	on 28.11.18 ti 04.12.18																					
53	Mangelutbedring	5 dager	to 29.11.18 on 05.12.18																					
54	Overtakelsesforretning	0 dager	on 05.12.18 on 05.12.18																					
55	Kartforretning og tinglysning av rettigheter	0 dager	to 06.12.18 to 06.12.18																					

Prosjekt: 2017 08 31 Hoved frem
Dato: fr 12.01.18

Aktivitet		Inaktiv aktivitet
Deling		Inaktiv milepæl
Milepæl		Inaktivt sammendrag
Sammendrag		Manuell aktivitet
Prosjektsammendrag		Bare varighet

	Manuell sammendragsfremheving
	Manuelt sammendrag
	Bare start
	Bare slutt
	Eksterne aktiviteter

	Ekstern milepæl
	Tidsfrist
	Fremdrift
	Manuell fremdrift
