



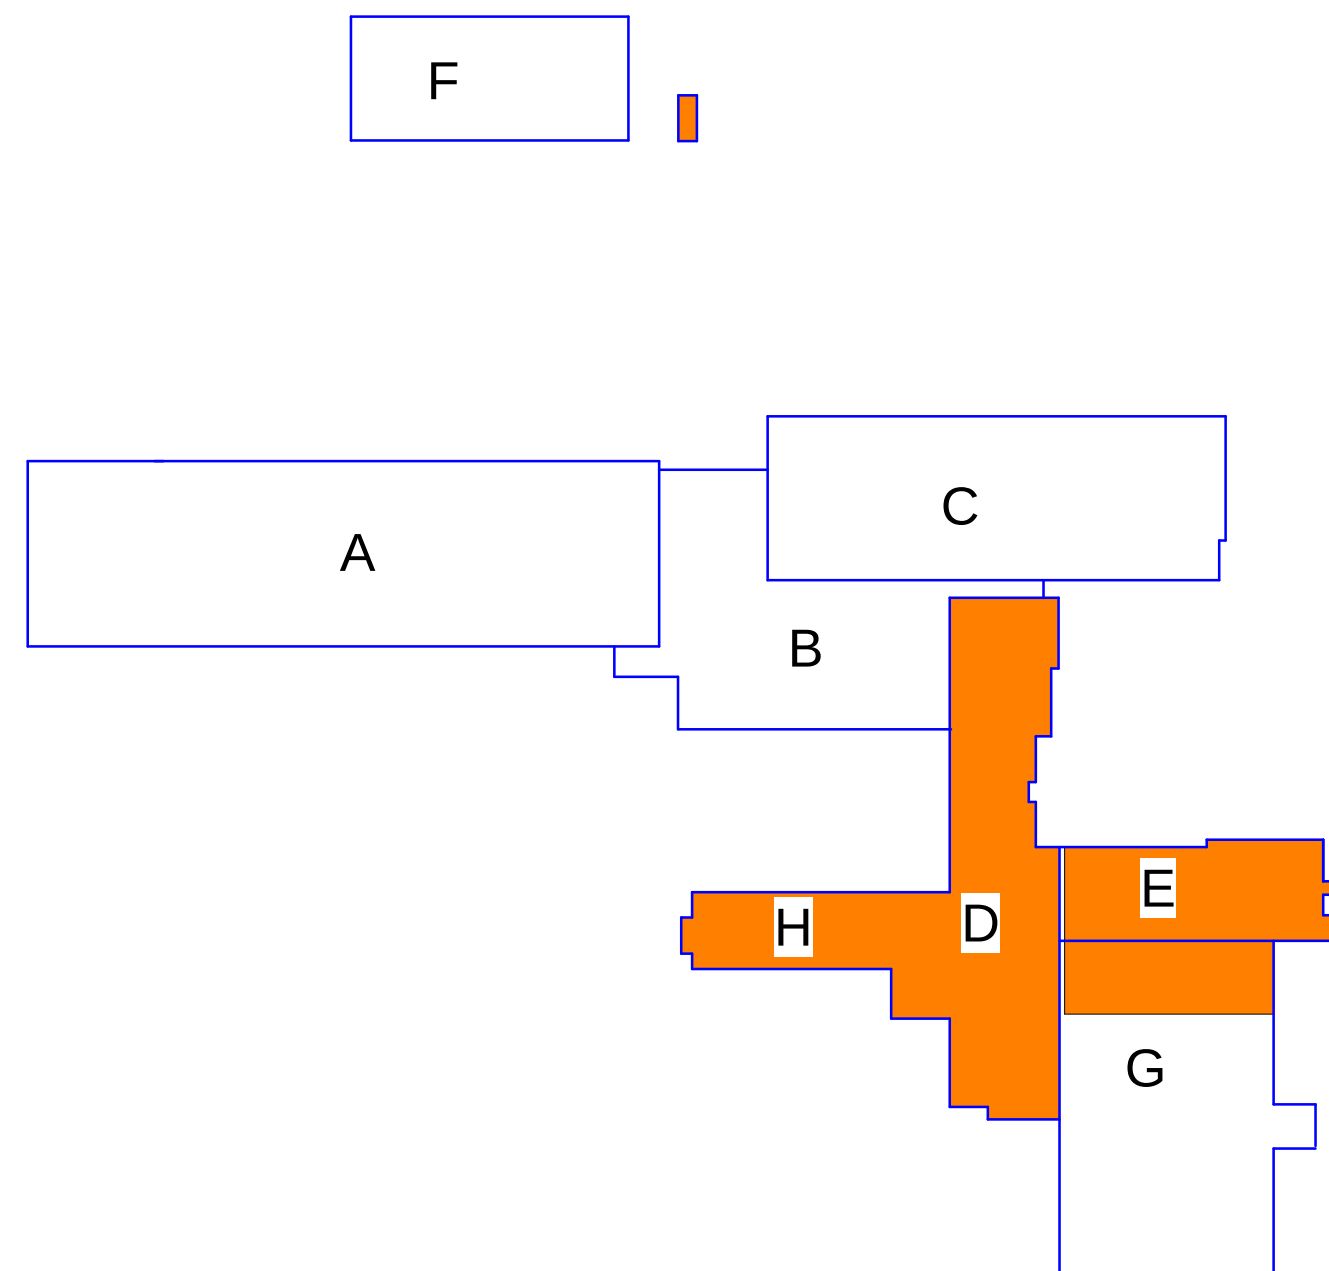


Fase 1: 01.01.19 – 31.08.19

- Nybygg, ombygging av administrasjon og ombygging av HO avdeling. Teknisk rom og kulvert på tak etableres Ambulanserommet, «biblioteket» og HO avdeling må fraflyttes. Det må avklares med skolen hvor de skal/ kan være i byggeperioden.
- Lærerarbeidsplasser og admin. i plan 02 bygges om og rehabiliteres
- Ny energiforsyning etableres.

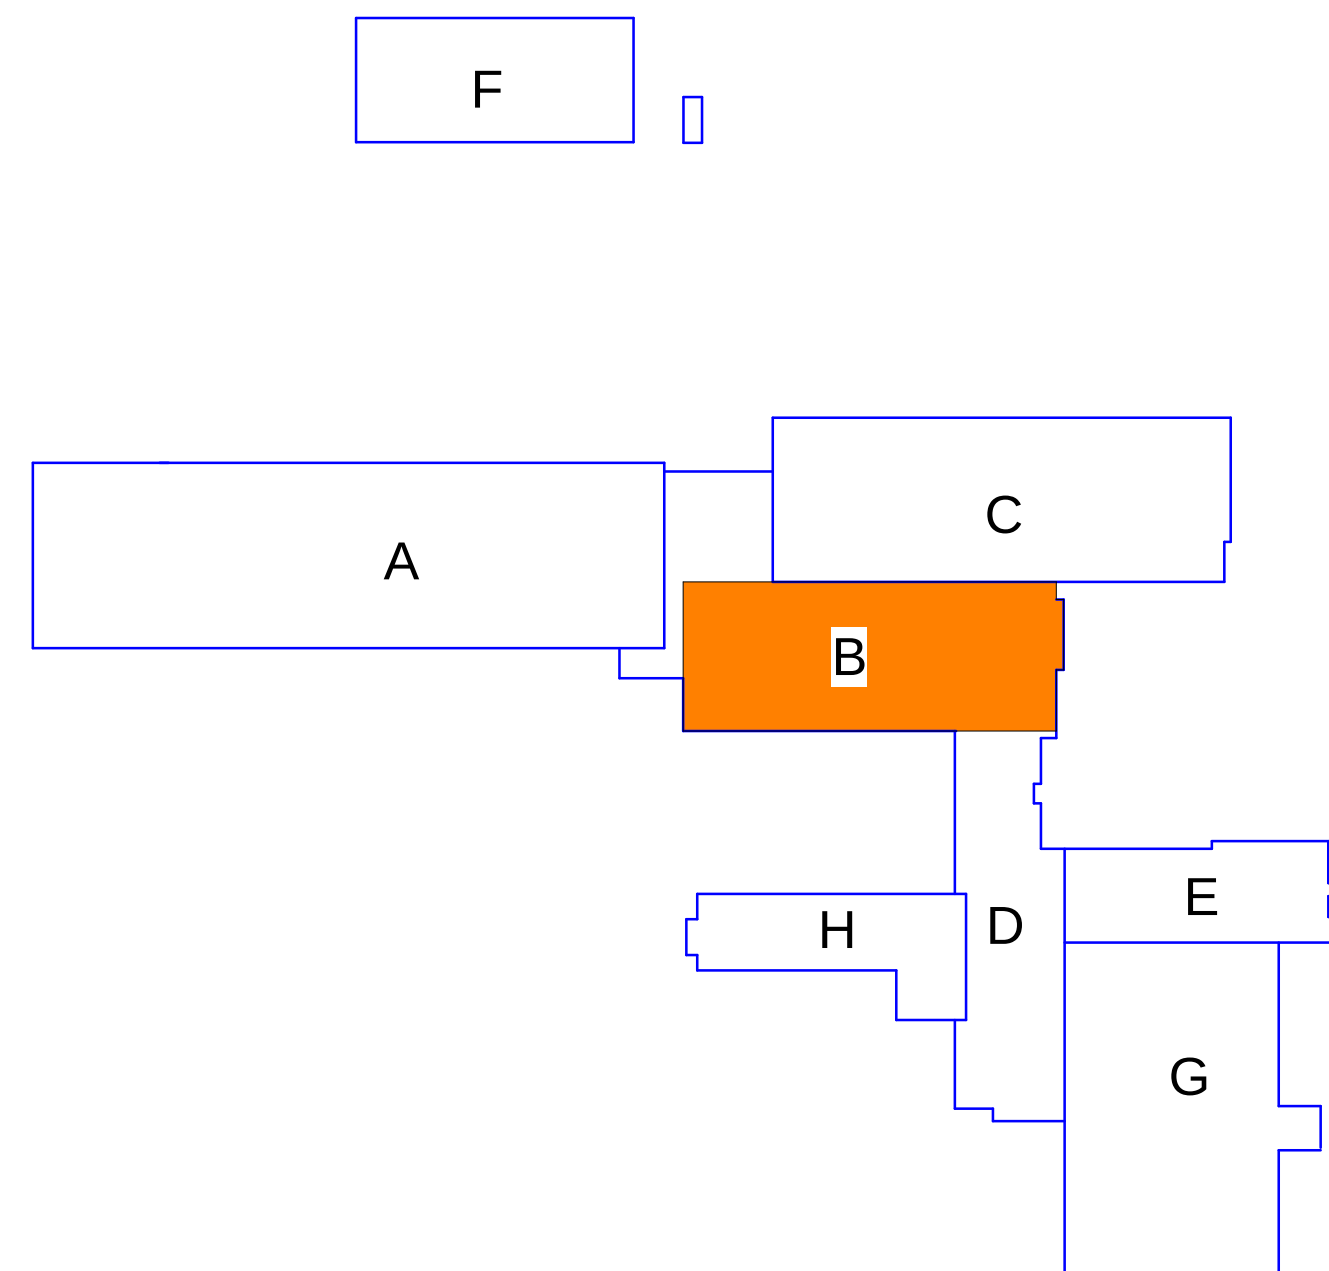


Fase 4: 01.09.19 - 015.12.19

- Ny ventilasjon i klasserom plan 1 etableres.
- Elevene benytter nybygget / evt flyttes ut.

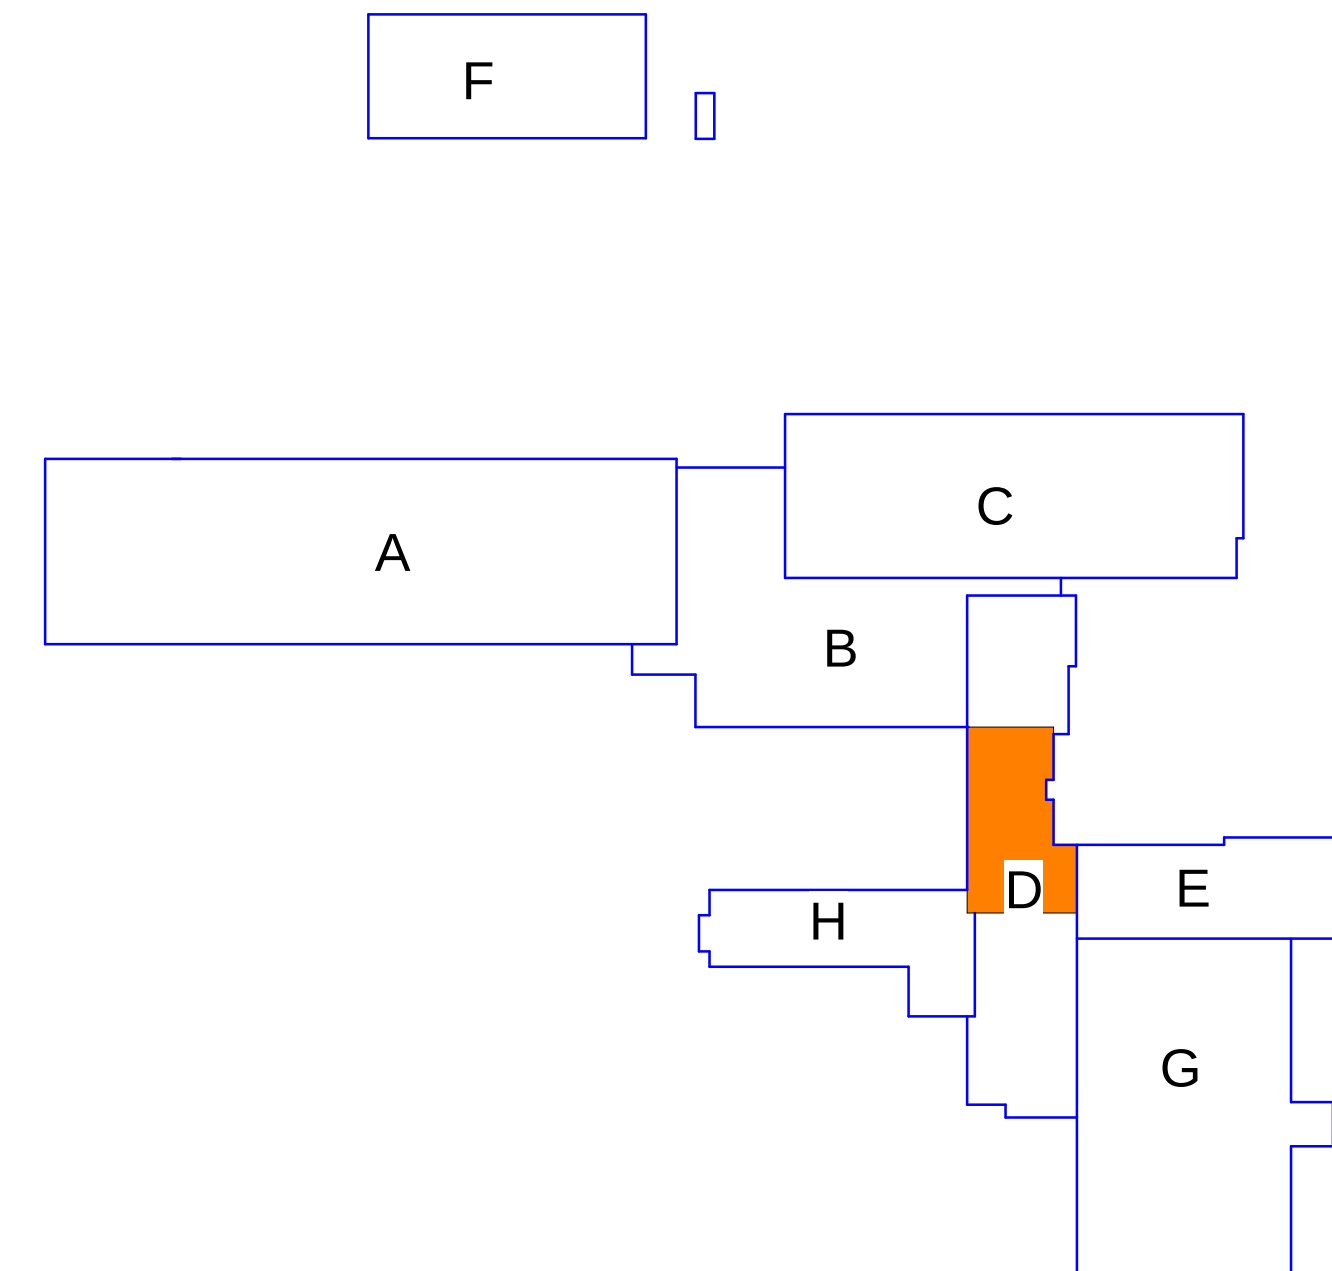

Fase 2: 17.06.19-15.08.19

- Plan 01, ventilasjonsanlegg kantineområde oppgraderes.

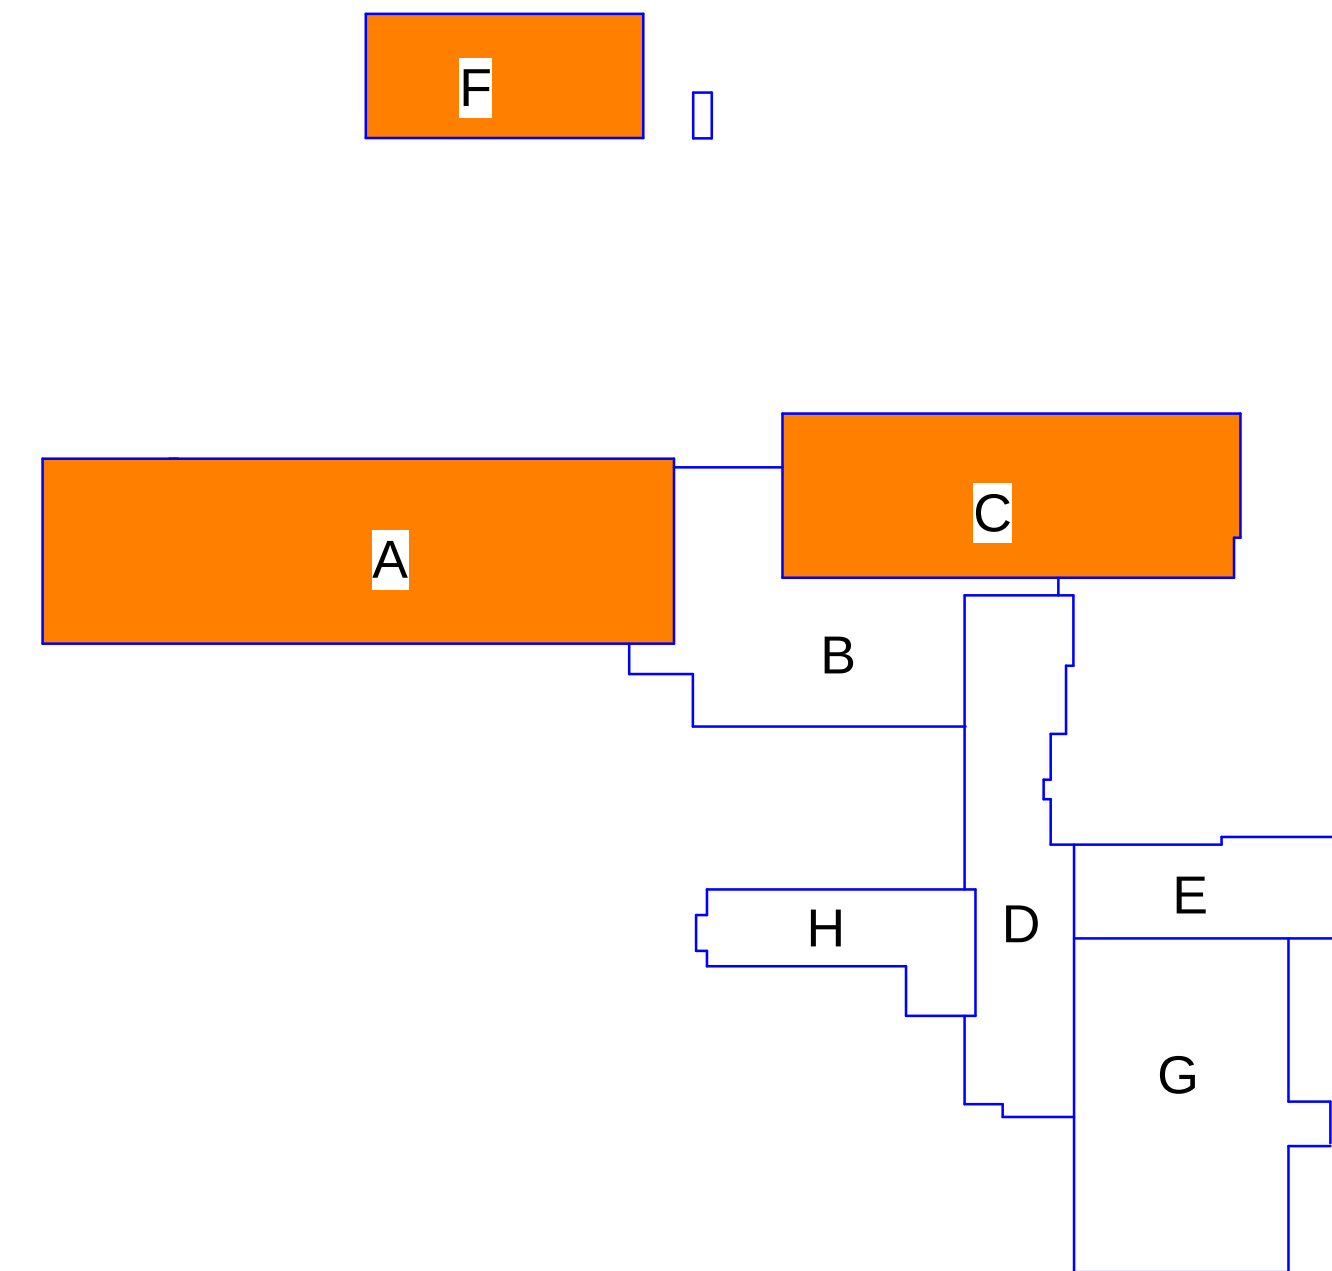


Fase 5

- Ny ventilasjon i verkstedarealene etableres parallelt med fase 1 – 4.

NB! Dette er en orienterende tegning mht. eksisterende forhold.
Det tas forbehold om målriktighet.

Før utførelse og bestilling må alle mål kontrolleres på stedet. Alle mål på eksisterende bygg som er avgjørende for rett bestilling av nye komponenter, skal kontrollmåles av entreprenør før endelige bestillinger.

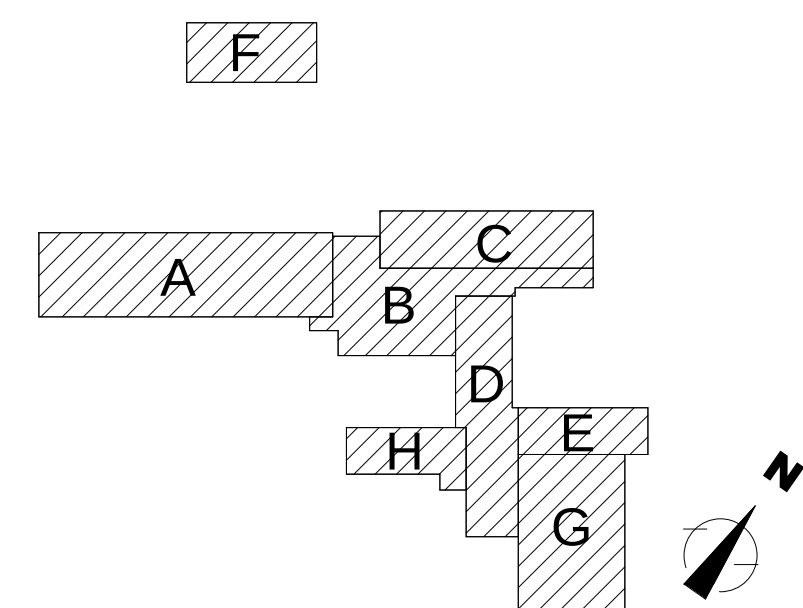

Byggherre:
Hedmark fylkeskommune
Parkgata 64
2325 Hamar
Mari-Mette.Solheim@hedmark.org



RiX Arkitektur
Ryensvingen 5, 8.etg
0680 Oslo
Tlf.: 91 91 61 11 E-post: firmapost@rikarkitektur.no

[illegible]
