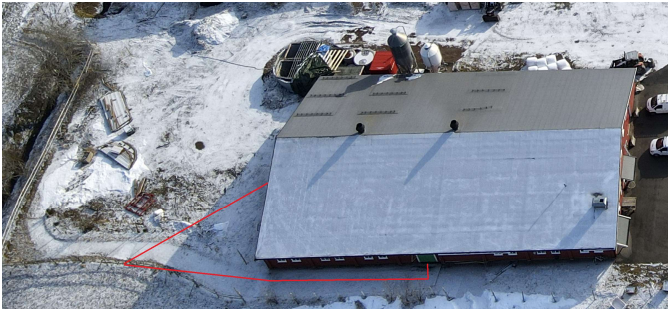


Prosjekt: Kleiva VGS – Yttertak til storfe fjøset  
Byggherre: Nordland fylkeskommune  
Møtedato: 19.04.2024 Kl: 09:00  
Referent: Gøran Andre Skogvoll

Sted: Kleiva VGS  
Dato: 23.04.2024

## Referat tilbudsbefering

| Navn                                 | Funksjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fork. | Firma                  | Til stede                           | Ref.                     |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>Gøran Skogvoll</b>                | Byggherreombud                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BHO   | Asplan Viak AS         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Lodve Riise</b>                   | Fagleder drift                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FL    | Nordland Fylkeskommune | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Odd Erik Gabrielsen</b>           | Soneleder byggdrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SL    | Nordland Fylkeskommune | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                      | Entreprenører                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ENT   |                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Referatet publiseres kun på Merzell. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                        |                                     |                          |
| Sak nr.                              | Tekst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                        |                                     |                          |
| 1                                    | Befaringen startet på møterom i verkstedbygget med introduksjon av tegninger og hovedtrekkene for prosjektet.                                                                                                                                                                                                              |       |                        |                                     |                          |
| 2                                    | Befaring rundt og inni fjøsbygning, samt riggområde.                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                        |                                     |                          |
| 3                                    | Spørsmål: Er det spesielle krav til skruer som er eksponert innenfra fjøset?<br><br>Svar: Det er beskrevet en konstruksjonsskrue type Essve WAF NY eller tilsvarende. Det skal ikke brukes elforsinkede skruer, minimum varmforsinket.                                                                                     |       |                        |                                     |                          |
| 4                                    | Spørsmål: Hvordan håndteres det dersom deler av isolasjonen som skal gjenbrukes er skadet, ref. aktuelle poster i mengdebeskrivelsen?<br><br>Svar: Entreprenøren vil bli godtgjort for å erstatte eventuell skadet isolasjon som måtte avdekkes, dette må avklares med byggeleder når arbeidene pågår for omforent mengde. |       |                        |                                     |                          |
| 5                                    | Omtrentlig riggområde avsatt til brakker, containere m.m skissert innenfor rød firkant. Det må være plass for å kjøre med traktor/trailer mellom riggområde og fjøs/stillas.                                                                                                                                               |       |                        |                                     |                          |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 6 | <p>For arbeid inne i fjøsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alt av klær (inkl skotøy) trenger ikke å være nytt, men det må være rent.</li> <li>- Klær som benyttes på Kleiva skal ikke være andre steder utenfor landbruksskolen. Klær en bruker utendørs kan brukes innendørs.</li> <li>- For å sikre dyrenes helse med tanke på smitte skal klær tas av/på på byggeplass ved arbeidsdagens start, slutt og eventuelt ved andre ærender dersom man må forlate landbruksskolen i løpet av arbeidsdagen.</li> <li>- Utstyr som f.eks lift eller stillas vil avspyles på skolen før det skal innendørs.</li> <li>- Det er strenge krav innendørs, som utendørs, til at skruer, spiker eller andre skarpe gjenstander ikke skal etterlates på noen måte slik at dyrene kan komme i skade for å spise dette. Arealene skal kontrolleres for slikt og «friskmeldes».</li> </ul> |  |
| 7 | <p>Det ble registrert fast gipshimling i rom 107. Det må åpnes opp for å få tilgang til underside TRP for innfesting av kubbing, deretter reetableres og malerbehandles. Se vedlagt mengdebeskrivelse for tilleggsposter.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 8 | <p>Skolens stålgrinder, drivgangen som leder kyrne til/fra fjøsen og beite, kan benyttes som alternativ sikring, i stedet for jerseysteiner e.l., mellom stillaser og kyr. Disse vil skolen etablere ifm beitingen. Likevel må entreprenøren sikre stålgrindene ytterligere fast med tynge lodd/steiner slik at faren for at kyrne kan velte stålgrinder/stillas elimineres. Rødstreker viser omtrentlig hvilke strekninger som dette gjelder, og vil tilpasses fremdriften i prosjektet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

Referent  
Gøran Andre Skogvoll  
goran.skogvoll@asplanviak.no - 95855337  
Asplan Viak AS
