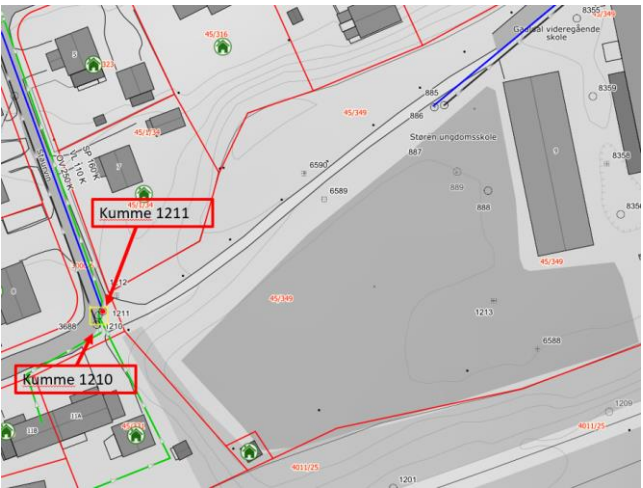


PAVILJONG GSK

SPØRSMÅL OG SVAR TIL ANBUDSGRUNNLAGET

Dato	Hva er revidert
17.03.23	Dokumentet er etablert. Spørsmål og svar nr 1 er lagt til.
17.03.23	Spørsmål og svar 2 er lagt til
29.03.23	Spørsmål og svar 3 er lagt til
01.04.23	Spørsmål og svar 4 er lagt til.

NR	Spørsmål fra tilbydere i Merrell	Svar fra Byggherre
1	Ser at det er langt bort til påkobling for spillvann, er det meningen at vi skal koble til kum 6990?	Spillvann kan kobles til kumme 1210. Det må samtidig opprettes et spylepunkt ca midt mellom «Paviljong GSK» og påkoblingspunkt. Vann kan påkobles i samme retning til kumme 1211. 
2	Viser til romskjema. Beskrevne overflater vil ikke tilfredsstille akustikk-krav for undervisningsrom. Er det mulig å komme med alternative overflater, eller har byggherre tenkt å montere absorberer i etterkant?	Å tilfredsstille akustikk-krav er totalentreprenør's ansvar, og skal ivaretas av totalentreprenør. Det er fullt mulig å komme med alternative overflater. Byggherre har ikke tenkt å montere absorberer i etterkant.
3	Er bygningen definert som en «yrkesbygning» og av dette følger at klimagassregnskap skal utarbeides iht TEK §17-1?	Dette kravet kom 01.07.23. Det er en overgangsperiode på et år. Dvs at om totalentreprenør sender inn byggesøknad innen 01.07.23, følger vi bestemmelsene som gjaldt før forskriftsendringen. Se for øvrig punkt 1.1 i Veileder for utarbeidelse av klimagassregnskap
4	Er det mulig å levere et bygg med innvendig takhøyde 270 cm(moduler) i hele bygget, og montere pult tak over.	Ja, så lenge alt i anbudsgrunnlaget er ivaretatt.
