

Nye Førde sjukehus

Vedlegg til intensjonskunngjering, skildring av planlagde endringar mellom forprosjekt/føresurnad og prosjektet slik det no ligg med nybygg i åtte etasjar.

Nøkkeltal areal

Areal på nybygget er auka frå 5 070 m² til 13 350 m² BTA. For det eksisterande arealet som skal byggast om er ombyggingsgraden redusert, men arealet i eksisterande sentralblokk er totalt det same på knappe 40 000 m².

Nøkkelopstilling funksjon

Prinsipp/kapasitet	2018	2020	Kommentar
Opprusting av sengeetasjar i høgblokk	Ja, einerom	Nei	Nye sengerom i Livabygget
Dim. Sengekapasitet (2030/2040)	177	186	Totalkapasitet; Normalsenger, observasjonsmottak og pasienthotell
Normalsenger	133	137	Inklusiv nokre rom i eksisterande bygg
Andel einerom	90 %	90 %	Prosent av tal normalsenger
Pasienthotell	36	32	Pasienthotell + god start eining
Observasjonspost mottak	8	6	Tal plassar er vurdert på nytt
Poliklinikk i plan 1 og plan 3 eks. bygg	Ja	Ja	Ulik løysing for tilleggsbehov. I 2020 er litt av plan 3 omdisponert til kontor.
Tal poliklinikkrom	130	158	Generelle undersøkelserom og spesialrom
Ombygging Angabygget	Ja	Rives	
Nytt areal for operasjon/int	Ja	Ja	
Tal operasjonsstover	8+1	8+1	Uinnreia areal for 2 nye stover i Livabygget
Identifisert behov kontorplassar	320	390	HVIKT sin 38 plassar er inkludert i 2020
Manglande kontorplassar	70	0	For 2020 har vi dekning for kontorbehovet utan å nytte Angabygget
Tung overvaking	6	6	
Intensiv	6	6	
Pre- og postoperative plassar	22	22	
Anestesi plassar	0	5	
Dialyse	14	14	


Kort omtale av kompleksitet og omfang

Det ligg framleis inne i prosjektet ombygging av teknisk kompliserte installasjonar i eksisterande bygg og tekniske anlegg som er utdaterte må rustast opp.

Vi har med nybygget fått meir areal, og dette gjer at vi ikkje treng å endre inndeling av rom i eksisterande, men i større grad kan bruke inndeling slik den er i eksisterande bygg.

Det var planlagt i forprosjektet at eksisterande høgblokk skulle byggast om til einerom. Dette innreiingsarbeidet med tekniske installasjonar er i nybygget prinsipielt svært likt den innreiing av sengerom er no er planlagt i nybygget.

Prinsipielt oppriss som viser fysisk endring av nybygget:

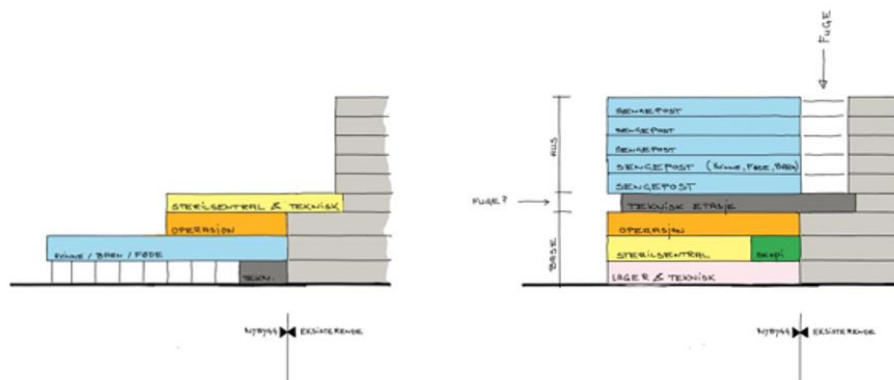

Forprosjekt

8-etasjer nybygg

Vedsamanlikning oppstillinga så nyttar vi omgrepet tre etasjar for forprosjektløysinga og åtte etasjar slik prosjektet no er utvikla, då dette er det klinisk operative pluss teknikk som må plasserast i dei aktuelle etasjane. For begge løysingane er det ein underetasje og tidvis har det vore tekniske installasjonar på tak utan at dette er med i tal etasjar

Nybygget i åtte etasjar er gjort litt kortare enn i forprosjektet. Tal sengeetasjar i nybygget har auka frå ein (1) til fem (5) etasjar. Nybygget inneheld i begge løysingane sterilsentral, operasjon og grøn garderobe. Teknisk areal er auka for å kunne betene det auka arealet i nybygget. Nybygget i åtte etasjar har fått plass til spesiellrom for poliklinikk og lagerfunksjonen.

I det etterfølgjande presenterer vi prinsippsskisser som viser endring/skilnad mellom forprosjekt og alternativ med nybygg i åtte etasjer:

Nye Førde sjukehus
Plan 00 – funksjon



Forprosjekt

Angabygg rives
UPS/nødstrøm flyttes fra plan 03 til plan 00




8-etasjer

Nye Førde sjukehus
Plan 00 – kalkyle – endringer ift forprosjekt

Angabygg kan rives


Plan 00/01 nybygg reduseres

UPS/nødstrøm flyttes fra plan 03 til plan 00



8-etasjer

Nye Førde sjukehus
Plan 01 – funksjon



Forprosjekt

Angabygg rives
Apotek produksjon flyttes til høyblokk plan 04
Skopi/kirurgi samles og flyttes til nybygg plan 01
KK/barn og tilhørende poliklinikk flyttes til plan 05
Sterilsentral flyttes fra plan 03 til plan 01



8-etasjer


Nye Førde sjukehus
Plan 01 – kalkyle – endringer ift forprosjekt

Angabygg kan rives

Produksjon apotek flyttes til høyblokk plan 04


Plan 00/01 nybygg reduseres

Poliklinikk ingen ombygging – dagens planløsning beholdes



8-etasjer

Nye Førde sjukehus
Plan 02 – funksjon



Forprosjekt

Arbeids- og pasientflyt op- og intensivavd. forbedret
OP avdeling tilrettelegges for senere utbygging



8-etasjer


Nye Førde sjukehus
Plan 02 – kalkyle – endringer ift forprosjekt

OP-avdeling utvides og tilrettelegges for senere utbygging
Dagens planløsning beholdes, teknisk oppgradering




8-etasjer

Nye Førde sjukehus
Plan 03 – funksjon



Forprosjekt

Sterilsentral flyttes til plan 01
Kreftavdeling/infosjonspol. flyttes til et 04, erstattes med kontor Helse vest IKT/ vanlig kontor




8-etasjer

Nye Førde sjukehus
Plan 03 – kalkyle – endringer ift forprosjekt

Teknisk areal utvides


Tekniske påbygg utgår



8-etasjer


Nye Førde sjukehus

Plan 04 – funksjon



Forprosjekt

Ny sengepost
Nevro Pol flytter til et 06
Kreft Pol og infusjonsklinikk flyttes opp fra et 03
Apotek produksjon flyttes opp fra et 01




8-etasjer

Nye Førde sjukehus

Plan 04 – kalkyle – endringer ift forprosjekt


Ny sengepostetasje



8-etasjer


Nye Førde sjukehus

Plan 05 – funksjon



Forprosjekt

Ny etasje nybygg – KK/barn og poliklinikk flyttes fra plan 01




8-etasjer

Nye Førde sjukehus

Plan 05 – kalkyle – endringer ift forprosjekt

Ny sengepostetasje


Ingen ombygging, lett teknisk oppgradering



8-etasjer


Nye Førde sjukehus

Plan 06



Forprosjekt


Sengeposter flyttes til nybygg
Kontorer/Nevro Pol flyttes til etasje 06



8-etasjer


Nye Førde sjukehus

Plan 07



Forprosjekt


Sengeposter flyttes til nybygg
Kontor flyttes til etasje 07



8-etasjer


Nye Førde sjukehus

Plan 08



Forprosjekt

Sengeposter flyttes til nybygg
Kontor/pasienthotell flyttes til etasje 08
Luftsmitte inkl sengepostkorridor beholdes




8-etasjer

Nye Førde sjukehus

Plan 06/07/08 – kalkyle – endringer ift forprosjekt

Ny sengepostetasje

Ingen ombygging, lett teknisk oppgradering



8-etasjer
