

Helse Stavanger HF

**SUS2023**

## Del II - Kontraktsgrunnlaget



|           |                   |                  |            |            |            |
|-----------|-------------------|------------------|------------|------------|------------|
|           |                   |                  |            |            |            |
|           |                   |                  |            |            |            |
|           |                   |                  |            |            |            |
|           |                   |                  |            |            |            |
| <b>01</b> | <b>20.03.2020</b> | <b>FOR ANBUD</b> | <b>JNB</b> | <b>LEB</b> | <b>TSØ</b> |
| Rev.      | Dato              | Tekst            | Saksb.     | Kontr.     | Godkj.     |
|           |                   |                  |            |            |            |

|                                                    |                                   |                                              |                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Oppdrag/Prosjekt:<br><b>SUS2023</b>                |                                   | Oppdragsgiver:<br><b>Helse Stavanger HF</b>  |                   |
| Kontrakt.:<br><b>K1018 - Transport anlegg etc.</b> |                                   | Ansvarlig utgiver:<br><b>Therese Øvernes</b> |                   |
| Dokument nr.:                                      | <b>SUS2023-K1018-KONT-SP-0002</b> | Revisjon:                                    | <b>01</b>         |
| Dokument Tittel:                                   | <b>Del II Kontraktsgrunnlaget</b> | Dato:                                        | <b>20.03.2020</b> |

Dokumentnr.: SUS2023-K1018-KONT-SP-0002

Revisjon: 01

Dato:

xxxxxx

Tittel: Del II Kontraktsgrunnlaget

Kontrakt: K1018 - Transport anlegg etc.

Side:

2 av 21

## Innholdsfortegnelse

|          |                                                                    |          |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>A</b> | <b>Oppdraget.....</b>                                              | <b>4</b> |
| A.1      | Innledning .....                                                   | 4        |
| A.2      | Kort om kontraktens innhold .....                                  | 4        |
| A.3      | Organisasjon .....                                                 | 4        |
| A.4      | Entreprisemodell.....                                              | 5        |
| A.5      | Dokumentliste .....                                                | 5        |
| <b>B</b> | <b>Kontraktbestemmelser .....</b>                                  | <b>5</b> |
| B.1      | Alminnelige kontraktbestemmelser .....                             | 5        |
| B.2      | Spesielle kontraktbestemmelser .....                               | 5        |
| B.2.1    | Generelle bestemmelser .....                                       | 5        |
| B.2.2    | Definisjoner (NS 8405 pkt. 2) .....                                | 6        |
| B.2.3    | Kontraktdokumenter (NS 8405 pkt. 3) .....                          | 7        |
| B.2.4    | Partenes representanter (NS 8405 pkt. 6) .....                     | 7        |
| B.2.5    | Spesielle møter (NS 8405 pkt. 7.2).....                            | 7        |
| B.2.6    | Varsler og krav (NS 8405 pkt. 8) .....                             | 8        |
| B.2.7    | Sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt. 9) .....                         | 8        |
| B.2.8    | Krav til utførelse (NS 8405 pkt. 11).....                          | 8        |
| B.2.9    | Forhold på byggeplassen (NS 8405 pkt. 12) .....                    | 9        |
| B.2.10   | Entreprenørens prosjektering (NS 8405 pkt. 13.1) .....             | 12       |
| B.2.11   | Byggherrens rett til å føre kontroll (NS 8405 pkt. 14.1) .....     | 12       |
| B.2.12   | Bruk av underentreprenør (NS 8405 pkt. 15).....                    | 13       |
| B.2.13   | Tiltransport (NS 8405 pkt. 16) .....                               | 15       |
| B.2.14   | Fremdrift og samordning (NS 8405 pkt. 18 og pkt. 19.7) .....       | 15       |
| B.2.15   | Prosjektering (NS 8405 pkt. 19.2).....                             | 15       |
| B.2.16   | Endringer (NS 8405 pkt. 22).....                                   | 16       |
| B.2.17   | Regulering av rigg og drift (NS 8405 pkt. 25.3 andre ledd a) ..... | 16       |
| B.2.18   | Indeksregulering (NS 8405 pkt. 27.1) .....                         | 17       |
| B.2.19   | Mengdekontroll (NS 8405 pkt. 27.2) .....                           | 17       |
| B.2.20   | Avregning av kontraktsum og innestående (NS 8405 pkt. 28.1) .....  | 17       |
| B.2.21   | Overtakelse (NS 8405 pkt. 32) .....                                | 17       |
| B.2.22   | Sluttoppstilling med slutfaktura (NS 8405 pkt. 33.1) .....         | 18       |
| B.2.23   | Dagmulkt ved forsinkelse (NS 8405 pkt. 34).....                    | 18       |
| B.2.24   | Avbestilling og oppsigelse (NS 8405 pkt. 34.4).....                | 18       |
| B.2.25   | Heving på grunn av mislighold (NS 8405 pkt. 39).....               | 18       |
| B.2.26   | Bruk av dokumenter (NS 8405 pkt. 41) .....                         | 18       |

Dokumentnr.: SUS2023-K1018-KONT-SP-0002

Revisjon: 01

Dato:

xxxxxx

Tittel: Del II Kontraktsgrunnlaget

Kontrakt: K1018 - Transport anlegg etc.

Side:

3 av 21

---

|          |                                                        |           |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| B.2.27   | Foreløpig oppmannsavgjørelse (NS 8405 pkt. 43.2) ..... | 19        |
| B.2.28   | Twisteløsning (NS 8405 pkt. 43.3/43.4).....            | 19        |
| B.2.29   | Øvrige spesielle bestemmelser .....                    | 19        |
| <b>C</b> | <b>Tekniske krav .....</b>                             | <b>20</b> |
| <b>D</b> | <b>Krav til byggeprosessen .....</b>                   | <b>21</b> |
| <b>E</b> | <b>Frister og dagmulkt .....</b>                       | <b>21</b> |
| <b>F</b> | <b>Vederlag.....</b>                                   | <b>21</b> |

Dokumentnr.: SUS2023-K1018-KONT-SP-0002

Revisjon: 01

Dato:

xxxxxx

Tittel: Del II Kontraktsgrunnlaget

Kontrakt: K1018 - Transport anlegg etc.

Side:

4 av 21

## A Oppdraget

### A.1 Innledning

Helse Stavanger HF er prosjekteier og Byggherre for nytt universitetssjukehus i Stavanger.

Det er etablert en prosjektorganisasjon hos Byggherren som skal planlegge og gjennomføre byggetrinn 1 av nytt Universitetssjukehus, kalt SUS2023. I første byggetrinn skal det bygges ca. 105.000 m<sup>2</sup> sykehus og ca. 25.000 m<sup>2</sup> samlet parkering (både for ansatte og for besøkende/pårørende) på ny tomt på universitetsområdet på Ullandhaug. Mer informasjon om prosjektet finnes på [hjemmesiden til SUS2023](#).

### A.2 Kort om kontraktens innhold


Anskaffelsen gjelder leveranse av transportanlegg. Se for øvrig *Del I Konkurransbeskrivelse* for mer informasjon.

### A.3 Organisasjon

SUS2023 er etablert med en egen prosjektorganisasjon for å planlegge og gjennomføre byggetrinn 1 i forbindelse med det nye Universitetssjukehuset på Ullandhaug.

Prosjektorganisasjonen ivaretar Byggherrens ansvar og oppgaver knyttet til gjennomføringen av prosjektet, og rapporterer til Byggherren, som er administrerende direktør i Helse Stavanger HF.

Sykehusbygg HF stiller med sentrale ressurser i prosjektledelsen i SUS2023, herunder prosjektdirektør, prosjektleder prosjektering, prosjektstyringsleder og prosjektkoordinator, se figur under.

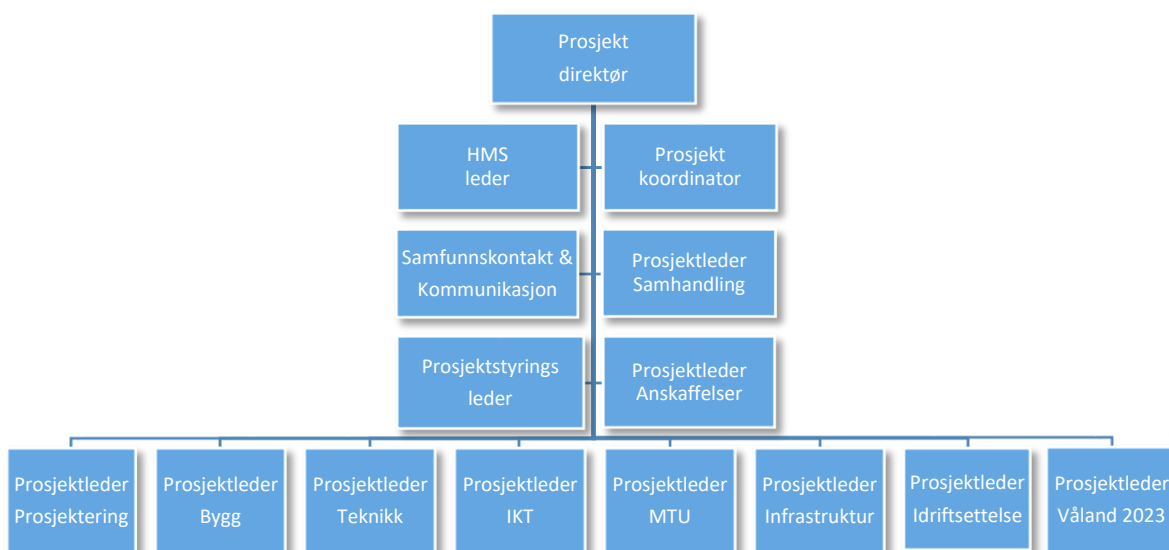

Nordic-COWI er rådgivergruppe (med arkitekter og ingeniører), og vil være en integrert del av byggherreorganisasjonen gjennom hele prosjektet. Prosjektorganisasjonen har arbeidssted på Ullandhaug frem til innflytting i 2023.

Dokumentnr.: SUS2023-K1018-KONT-SP-0002

Revisjon: 01

Dato:

xxxxxx

Tittel: Del II Kontraktsgrunnlaget

Kontrakt: K1018 - Transport anlegg etc.

Side:

5 av 21

## A.4 Entreprensemøll

Prosjektet vil bli gjennomfrt som byggherrestyrte delte entrepriser.

## A.5 Dokumentliste

Dokumentliste fremkommer som Vedlegg 2.3 - A.5 Dokumentliste.

# B Kontraktsbestemmelser

## B.1 Alminnelige kontraktbestemmelser

Som alminnelige kontraktbestemmelser gjelder NS 8405, med de endringer, presiseringer og tillegg som fremgr i B.2 Spesielle kontraktbestemmelser.

## B.2 Spesielle kontraktbestemmelser

### B.2.1 Generelle bestemmelser

#### B.2.1.1 Rent Trt Bygg

Entreprenren skal overholde krav og bestemmelser relatert til Rent Trt Bygg (RTB) i boken 6606 – S Rent Trt Bygg (RIF, 2007) og konkurransegrunnlaget C.1.2 Rent Trt Bygg.

#### B.2.1.2 Digital samhandling

Det gjelder ingen spesielle kontraktsbestemmelser for dette punktet. Aktuell bestemmelse i NS 8405 gjelder.

#### B.2.1.3 Systematisk ferdigstillelse

Det gjelder ingen spesielle kontraktsbestemmelser for dette punktet. Aktuell bestemmelse i NS 8405 gjelder.

#### B.2.1.4 Fremdriftsplanlegging

Det gjelder ingen spesielle kontraktsbestemmelser for dette punktet. Aktuell bestemmelse i NS 8405 gjelder.

#### B.2.1.5 BIM

Prosjektet skal baseres p BIM, se nrmere i konkurransegrunnlaget C.1.3 Digital samhandling og C.4.1 BIM-manual. Nr begrepet «tegning» brukes i kontrakten skal dette normalt forsts som «BIM-modellen».

Entreprenren m selv dekke kostnader ved eventuell utskrift og kopiering av tegninger og beskrivelser.

Hvis det foreligger bde fysisk tegning og BIM-modell, skal BIM-modellen gjelde foran den fysiske tegningen.

#### B.2.1.6 Optimaliseringsprosess/-fase

Dokumentnr.: SUS2023-K1018-KONT-SP-0002

Revisjon: 01

Dato:

XXXXXX

Tittel: Del II Kontraktsgrunnlaget

Kontrakt: K1018 - Transport anlegg etc.

Side:

6 av 21

Det gjelder ingen spesielle kontraktsbestemmelser for dette punktet. Aktuell bestemmelse i NS 8405 gjelder.

#### **B.2.1.7 Frist**

Hvis en frist ender på en lørdag, helligdag eller offentlig høytidsdag, forlenges fristen til nærmest følgende virkedag.

#### **B.2.1.8 Særskilt fullmakt for innhenting av opplysninger fra skattemyndighetene**

Byggherren har etablert et samarbeid med norske skattemyndigheter om forsterket innsats mot arbeidsmarkeds kriminalitet innen bygg og anlegg, samt renhold. Som ledd i dette samarbeidet er byggherren overfor norske skattemyndigheter forpliktet til å utføre kontroll av at entreprenør og kontraktsmedhjelpere overholder sine skatte- og rapporteringsforpliktelser i henhold til norsk rett. Dette skal skje ved at byggherren innhenter relevante taushetsbelagte opplysninger fra skattemyndighetene.

Entreprenøren skal i god tid før oppstart av utførelsesfasen signere og oversende særskilt fullmakt til byggherre som gir byggherren adgang til å innhente opplysninger fra skattemyndighetene. Fullmakt er vedlagt som vedlegg 1.4. For kontraktsmedhjelpere gjelder bestemmelsene i pkt. B.2.12.1.

### **B.2.2 Definisjoner (NS 8405 pkt. 2)**

#### **B.2.2.1 Byggherre (NS 8405 pkt. 2.2)**

NS 8405 pkt. 2.2 endres. Følgende skal gjelde:

Byggherre er Helse Stavanger HF. Byggherrens oppdragsgivere, leietakere og brukere regnes som tredjemenn i relasjon til denne kontrakten.

#### **B.2.2.2 Kontraktarbeid (NS 8405 pkt. 2.6)**

I NS 8405 pkt. 2.6 tilføyes følgende:

Som kontraktarbeid regnes også andre ytelser og produkter som entreprenøren etter kontrakten skal levere, herunder blant annet FDV-dokumentasjon og annen dokumentasjon.

#### **B.2.2.3 Kontraktsum (NS 8405 pkt. 2.8)**

I kontrakter hvor det ikke gjennomføres optimaliseringsprosess defineres «kontraktsum» som angitt i NS 8405 pkt. 2.8.

I kontrakter hvor det gjennomføres optimaliseringsprosess i henhold til konkurransegrunnlaget *vedlegg 2.4 Optimaliseringsdokument* defineres «kontraktsum» slik: Vederlaget for entreprenørens oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser som er avtalt ved avslutning av optimaliseringsprosessen, inkludert merverdiavgift. Til kontraktsummen hører også anslag som er avtalt ved avslutning av optimaliseringsprosessen over vederlag for ytelser som skal avregnes etter enhetspriser eller etter regning.

Unntak fra ovennevnte gjelder for sikkerhetsstillelse i henhold til NS 8405 pkt. 9.1 jf. 9.2, som skal baseres på entreprenørens vederlag ved kontraktinngåelse.

#### **B.2.2.4 Terminologi og forkortelser**

Definisjonene som fremgår av konkurransegrunnlaget *A.1 Terminologi og forkortelser* gjelder i tillegg til definisjonene i NS 8405 pkt. 2.

Dokumentnr.: SUS2023-K1018-KONT-SP-0002

Revisjon: 01

Dato:

xxxxxx

Tittel: Del II Kontraktsgrunnlaget

Kontrakt: K1018 - Transport anlegg etc.

Side:

7 av 21

### **B.2.3 Kontraktdokumenter (NS 8405 pkt. 3)**

#### **B.2.3.1 Kontraktdokumenter (NS 8405 pkt. 3.1)**

NS 8405 pkt. 3.1 endres. Følgende skal gjelde:

- a) avtaledokumentet
- b) referater eller skriftlig materiale fra oppklarende drøftelser eller forhandlinger avholdt etter at tilbudet ble inngitt, som er godkjent av begge parter
- c) referater eller skriftlig materiale fra avklaringer, befaringer og konferanser avholdt før tilbudet ble inngitt
- d) konkurransegrunnlaget inkludert alle vedlegg/bilag
- e) entreprenørens tilbud
- f) NS 8405

#### **B.2.3.2 Motstrid/uoverensstemmelser (NS 8405 pkt. 3.2)**

NS 8405 pkt. 3.2 første og andre ledd endres. Følgende skal gjelde:

Inneholder kontraktdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, skal de gjelde i den rekkefølgen som er angitt i B.2.3.1.

Er det motstrid mellom dokumentene som er nevnt i B.2.3.1 d) gjelder beskrivelsen foran tegningene/BIM-modellen. Utførelse som bare er angitt på tegning/BIM-modellen, men som også burde ha vært angitt i beskrivelsen eller mengdefortegnelsen, omfattes ikke av kontrakten.

### **B.2.4 Partenes representanter (NS 8405 pkt. 6)**

Prosjektleder bygg er byggherrens representant. Byggeledere har fullmakt til å avvise (men ikke akseptere) krav om vederlagsjustering eller fristforlengelse.

### **B.2.5 Spesielle møter (NS 8405 pkt. 7.2)**

Kontrakten stiller krav til gjennomføring av en rekke spesielle møter, blant annet som følge av krav til systematisk ferdigstilling og LEAN. Entreprenøren plikter å sette seg inn i prosjektets krav til møtevirkosomhet og stille med kompetente personer i spesielle møter.



Dokumentnr.: SUS2023-K1018-KONT-SP-0002

Revisjon: 01

Dato:

XXXXXX

Tittel: Del II Kontraktsgrunnlaget

Kontrakt: K1018 - Transport anlegg etc.

Side:

8 av 21

### **B.2.6 Varsler og krav (NS 8405 pkt. 8)**

NS 8405 pkt. 8 første og andre ledd endres. Følgende skal gjelde:

Alle varsler og krav og svar på disse som skal meddeles etter bestemmelsene i kontrakten, skal fremsettes ved bruk av modul for kontraktsadministrasjon, menyvalg for kontraktelementer i byggherrens prosjektstyringsverktøy, Pims365. Varsler og krav som fremsettes på annen måte skal betraktes som ikke mottatt/ikke varslet.

### **B.2.7 Sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt. 9)**

#### **B.2.7.1 Entreprenørens sikkerhetsstillelse (NS8405 pkt. 9.2)**

Ved eventuell forskuddsbetaling skal entreprenøren på forhånd stille en separat sikkerhet for forskuddsbetalingen, som beløpsmessig skal være tilstrekkelig til å sikre det til enhver tid utbetalte forskuddsbeløp. Byggherren plikter ikke å betale ut forskudd før han har mottatt entreprenørens sikkerhetsstillelse for forskuddsbetaling.

#### **B.2.7.2 Byggherrens sikkerhetsstillelse (NS8405 pkt. 9.3 mv.)**

NS 8405 pkt. 9.3, og andre punkt i NS 8405 om byggherrens sikkerhetsstillelse endres. Følgende skal gjelde:

Byggherren stiller ikke sikkerhet. Dette gjelder generelt for alle punkt i NS 8405 hvor det fremgår at byggherren skal stille sikkerhet eller at entreprenøren kan kreve at byggherren stiller sikkerhet.

### **B.2.8 Krav til utførelse (NS 8405 pkt. 11)**

I tillegg til reglene i NS 8405 gjelder følgende:

#### **B.2.8.1 Kvalitetssikring**

Entreprenøren skal ha og følge et styringssystem som oppfyller kravene i følgende kapitler i NS-EN-ISO 9001:2015, kapitlene

4.4. Ledelsessystemet for kvalitet og systemets prosesser

5.1. Lederskap og forpliktelse

7 Støtte

9.1. Overvåking, måling, analyse, evaluering

9.2. Interne revisjoner.

Styringssystemet skal også oppfylle kravene i NS-EN-ISO 14001:2015 kapittel 4 Krav til miljøstyringssystem, eller tilsvarende krav i andre relevante miljøstandarder.

Prosjektilpasset kvalitetsplan skal oversendes byggherre innen 30 dager fra kontraktinngåelse, ref. konkurransegrunnlaget C.1.4 Systematisk ferdigstilling og kvalitet, pkt. 3.



Dokumentnr.: SUS2023-K1018-KONT-SP-0002

Revisjon: 01

Dato:

XXXXXX

Tittel: Del II Kontraktsgrunnlaget

Kontrakt: K1018 - Transport anlegg etc.

Side:

9 av 21

## **B.2.9 Forhold på byggeplassen (NS 8405 pkt. 12)**

I tillegg til reglene i NS 8405 gjelder følgende:

### **B.2.9.1 Ansvarsrett**

Det gjelder ingen spesielle kontraktsbestemmelser for dette punktet. Aktuell bestemmelse i NS 8405 gjelder.

### **B.2.9.2 Rusfri byggeplass**

Byggeplassen skal være rusfri. Røyking tillates kun på særskilt oppmerkede områder utendørs.

### **B.2.9.3 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)**

Entreprenøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter, samt byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger.

Entreprenøren plikter å ha et internkontrollsystem i henhold til forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (interkontrollforskriften).

Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i entreprenørens HMS-plan og følges opp gjennom entreprenørens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at bestemmelser i byggherrens SHA-planen kan identifiseres i entreprenørens HMS-plan.

Med mindre annet er avtalt skal all kommunikasjon mellom ledende personell, inklusive baser og vogneiere som er ansvarlige for et taktområde, foregå på norsk. Entreprenøren skal sørge for at arbeidstakere som han og eventuelle underleverandører benytter kan kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko.

For å unngå at det skjer ulykker på grunn av manglende forståelse av informasjonen som blir gitt, gjelder følgende:

- Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i tillegg forstå og gjøre seg forstått på et språk som alle de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på.
- Alle på byggeplassen skal gjennomgå og forstå SHA-/HMS-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy og arbeidsutstyr, varselskilter mv. Materialet skal foreligge på det språk vedkommende arbeidstaker bruker som morsmål, såfremt arbeidstakeren ikke forstår informasjonen fullt ut på norsk. Oversettelsen bekostes av entreprenøren.

Ved overtredelse av SHA/HMS-regelverket, herunder ovennevnte plikter, har byggherren rett til å stanse arbeidene i den utstrekning byggherren anser det nødvendig. Eventuelle kostnader ved slik stans skal dekkes av entreprenøren.

Alvorlige eller gjentatte overtredelser av plikter etter SHA/HMS-regelverket anses som vesentlig kontraktmislighold som gir grunnlag for heving. Hvis entreprenørens mislighold består i stadige brudd på pliktene, kan byggherren heve kontrakten selv om entreprenøren retter forholdene.

Byggherren kan kreve at entreprenøren skifter ut underentreprenører/-leverandører som ikke overholder plikter etter SHA/HMS-regelverket, herunder ovennevnte plikter. Slik utskifting skal skje uten omkostninger for byggherre.

Dokumentnr.: SUS2023-K1018-KONT-SP-0002

Revisjon: 01

Dato:

XXXXXX

Tittel: Del II Kontraktsgrunnlaget

Kontrakt: K1018 - Transport anlegg etc.

Side:

10 av 21

Entreprenøren har ansvar for at hans kontraktmedhjelpere (underentreprenører-/leverandører mv.) overholder plikter etter SHA/HMS-regelverket.

Avtaler mellom entreprenør og kontraktmedhjelpere for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser som fremgår av dette punktet.

#### *B.2.9.4 HMS-kort*

Alle arbeidstakere skal bære gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Kortet skal være lett synlig. Ordrebekreftelse, søknadsskjema mv. aksepteres ikke som HMS-kort.

Arbeidstakere som ikke har HMS-kort vil bli bortvist fra byggeplassen. Kostnader relatert til en slik situasjon dekkes av entreprenøren.

Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser som fremgår av dette punktet.

#### *B.2.9.5 Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker*

Kontrakt gitt til utenlandsk Entreprenør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik kontrakt, skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til skatteforvaltningsloven § 7-6.

Entreprenøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. Entreprenøren skal på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn.

Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av at entreprenøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er Entreprenørens ansvar og skal betales av ham.

Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser som fremgår av dette punktet.

#### *B.2.9.6 Krav om lærlinger*

Det gjelder ingen spesielle kontraktsbestemmelser for dette punktet. Aktuell bestemmelse i NS 8405 gjelder.

#### *B.2.9.7 Krav om faglærte håndverkere*

Det gjelder ingen spesielle kontraktsbestemmelser for dette punktet. Aktuell bestemmelse i NS 8405 gjelder.

#### *B.2.9.8 Krav til lønns- og arbeidsvilkår*

Entreprenøren er ansvarlig for at egne ansatte og ansatte hos underleverandører (herunder innleide) har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til:

- Forskrift om allmenngjort tariffavtale.
- Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.

Entreprenøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne arbeidstakere og arbeidstakere hos eventuelle underleverandører (herunder innleide).

Dokumentnr.: SUS2023-K1018-KONT-SP-0002

Revisjon: 01

Dato:

XXXXXX

Tittel: Del II Kontraktsgrunnlaget

Kontrakt: K1018 - Transport anlegg etc.

Side:

11 av 21

Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønsslipp, timelister og arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder.

Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal entreprenøren rette forholdet.

Ved mistanke om brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår har byggherren rett til å holde tilbake entreprenørens vederlag inntil forholdet er avklart. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er dokumentert.

Alvorlige eller gjentatte overtredelser av krav til lønns- og arbeidsvilkår anses som vesentlig kontraktsmislighold som gir grunnlag for heving. Byggherren kan i slike tilfeller heve kontrakten selv om entreprenøren retter forholdene.

Byggherren kan kreve at entreprenøren skifter ut underentreprenører/-leverandører (herunder bemanningsselskaper) som ikke overholder krav til lønns- og arbeidsvilkår. Slik utskifting skal skje uten omkostninger for byggherre.

Entreprenøren har ansvar for at hans kontraktmedhjelpere (underentreprenører-/leverandører mv.) overholder krav til lønns- og arbeidsvilkår.

Avtaler mellom entreprenør og kontraktmedhjelpere for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser som fremgår av dette punktet.

#### *B.2.9.9 Krav om betaling til bank*

Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal utbetales til konto i bank. Alle avtaler Entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

#### *B.2.9.10 Tropisk tømmer og fredet skog*

Det gjelder ingen spesielle kontraktsbestemmelser for dette punktet. Aktuell bestemmelse i NS 8405 gjelder.

#### *B.2.9.11 Ytre miljø – mangelfull avfallshåndtering*

Byggherren kan kreve bot av entreprenøren dersom prosjektets og myndighetenes krav til avfallshåndtering ikke nås. Boten kan være inntil kr 150 000, som fordeles på entreprenørene i prosjektet etter byggherrens skjønn.

Hvis byggherren ilegges tvangsmulkt etter avfallsforskriften § 19-6, fordeles tvangsmulkten på entreprenørene i prosjektet etter byggherrens skjønn. Dette kommer i tillegg til fordelingen av de kr 150 000 som er nevnt i første ledd.

Krav etter dette punktet skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt, bot eller erstatning for andre forhold.

Dokumentnr.: SUS2023-K1018-KONT-SP-0002

Revisjon: 01

Dato:

XXXXXX

Tittel: Del II Kontraktsgrunnlaget

Kontrakt: K1018 - Transport anlegg etc.

Side:

12 av 21

**B.2.9.12 Bytte av nøkkelpersonell (NS 8405 pkt. 12.2)**

NS 8405 pkt. 12.2 endres. Følgende skal gjelde:

A Entreprenøren skal lede prosjektet ved bruk av personer som har tilstrekkelig erfaring og fagkyndighet. Nøkkelpersonell som er angitt i kontrakten skal benyttes.

Entreprenøren har ikke anledning til å skifte eller fjerne nøkkelpersonell fra prosjektet uten skriftlig samtykke fra byggherren. Samtykke kan gis dersom det foreligger saklig grunn, for eksempel ved sykdom eller fratredelse av stilling, men bare hvis den nye personens erfaring og fagkyndighet er like god eller bedre enn erfaringen og fagkyndigheten til personen som skiftes ut.

Ved godkjent endring av nøkkelpersonell kan byggherren kreve kostnadsfri overlapping og ekstrainsats fra entreprenørens side for å avhjelpe ulempene byttet medfører for prosjektet og byggherren.

Byggherren kan kreve utskifting i entreprenørens organisasjon hvis det etter byggherrens skjønn er nødvendig eller hensiktsmessig for prosjektet. Rettigheten er ikke begrenset til å gjelde nøkkelpersonell. Utskifting skal skje innen en rimelig frist fastsatt av byggherren.

Dersom nøkkelpersonell skiftes uten skriftlig samtykke, eller byggherrens krav om utskifting ikke gjennomføres innen fristen som er satt av byggherre, betales en dagmulkt på kr 10 000 per dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes innen en rimelig frist fastsatt av byggherren. Samlet dagmulftsansvar etter denne bestemmelsen er begrenset til 10 % av kontraktssummen, men likevel maksimalt kr 500 000. Krav etter dette punktet skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt, bot eller erstatning for andre forhold.

**B.2.9.13 Opprydding (NS 8405 pkt. 12.5)**

Det gjelder ingen spesielle kontraktsbestemmelser for dette punktet. Aktuell bestemmelse i NS 8405 gjelder.

**B.2.9.14 Arbeidstid (NS 8405 pkt. 12.7)**

NS 8405 pkt. 12.7 spesifiseres. Følgende skal gjelde:

Støyende arbeid skal foregå mellom kl 07:00- og kl 19:00, og kun på ukedager. Støyende arbeid på kveld/natt, lørdag, søndag, helligdag og offentlig høytidsdag kan ikke utføres uten skriftlig godkjenning fra byggherre. Særlig støyende aktiviteter, som eksempelvis rensk ved pigging, skal begrenses til tidsrammer som avtales med byggherre.

**B.2.10 Entreprenørens prosjektering (NS 8405 pkt. 13.1)**

Det gjelder ingen spesielle kontraktsbestemmelser for dette punktet. Aktuell bestemmelse i NS 8405 gjelder.

**B.2.11 Byggherrens rett til å føre kontroll (NS 8405 pkt. 14.1)**

I NS 8405 pkt. 14.1 tilføyes følgende:

**B.2.11.1 Innsynsrett**

Byggherren, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i entreprenørens regnskap, kvalitets-, internkontroll- (HMS) og miljøstyringssystem, utførelse

Dokumentnr.: SUS2023-K1018-KONT-SP-0002

Revisjon: 01

Dato:

xxxxxx

Tittel: Del II Kontraktsgrunnlaget

Kontrakt: K1018 - Transport anlegg etc.

Side:

13 av 21

av kontraktarbeidet, produksjonsprosessen, og de deler av entreprenørens styringssystem for øvrig som kan ha betydning for entreprenørens oppfyllelse av kontrakten.

Innsynsretten omfatter revisjon ved intervjuer, inspeksjon, kontroll og dokumentgjennomgåelse. Entreprenøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsretten er begrenset til tre år etter at siste betaling har funnet sted.

Entreprenøren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos entreprenørens direkte og indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet betydning for entreprenørens evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor byggherren.

#### *B.2.11.2 Pliktig medlemskap i StartBANK eller tilsvarende leverandørregister*

Entreprenøren skal ved kontraktsinngåelse oppgi StartBANK ID eller fremlegge kopi av registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende leverandørregister som inneholder oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon.

Entreprenøren skal gi leverandørregisteret fullmakt til å innhente SKAV-info (skatte- og avgifts informasjon) i hele kontraktsperioden.

Avtaler mellom entreprenør og kontraktmedhjelpere for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser som fremgår av dette punktet.

### **B.2.12 Bruk av underentreprenør (NS 8405 pkt. 15)**

#### *B.2.12.1 Dokumentasjon*

Ved inngåelse av kontrakter med underliggende entreprise- og tjenesteforhold eller innleie av personell (kontraktmedhjelpere) skal Entreprenøren innhente:

- attest for skatt
- attest for merverdiavgift fra underleverandører
- Signert vedlegg 1.4 Fullmakt for innhenting av opplysninger fra skattemyndighetene

Entreprenøren skal også kreve HMS-erklæring i underliggende leverandørforhold ved inngåelse av kontrakt i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på NOK 500 000 eks mva.

Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser, herunder at underentreprenører/kontraktsmedhjelpere har oppfylt sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenører/ den prosjekterende og dennes personell.

Overnevnte skatteattester og HMS-erklæringer, skal til enhver tid finnes på byggeplassen.

Brudd på ovennevnte plikter gir byggherren rett til å kreve at forholdet rettes opp, om nødvendig ved skifte av underentreprenør, innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Det samme gjelder dersom opplysningene i skatteattesten viser at underentreprenøren ikke har oppfylt sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. Omkostningene som følge av heving av underentreprenørens avtale, skal bæres av entreprenøren.

Ved mislighold av ovennevnte plikter eller NS 8405 pkt. 15, kan byggherren nekte den aktuelle underentreprenøren og dennes ansatte tilgang til byggeplassen.

Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving.

Dokumentnr.: SUS2023-K1018-KONT-SP-0002

Revisjon: 01

Dato:

XXXXXX

Tittel: Del II Kontraktsgrunnlaget

Kontrakt: K1018 - Transport anlegg etc.

Side:

14 av 21

Avtaler mellom entreprenør og kontraktmedhjelpere for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser som fremgår av dette punktet.

#### *B.2.12.2 Antall ledd i leverandørkjeden*

Entreprenøren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke, ha flere enn to ledd kontraktsmedhjelpere i kjede under seg.

Begrensningen i antallet ledd gjelder kun for arbeider som knytter seg til utførelsen av bygge- og anleggsarbeider og ikke det som knytter seg til planleggingen, herunder planlegging/prosjektering, rådgivning og andre tilknyttede tjenester. Bestemmelsen knytter seg heller ikke til leverandører av materiell. Innleid personell som inngår i underleverandørs arbeidsstokk anses som et eget ledd i leverandørkjeden.

Entreprenøren skal oppgi kontaktopplysninger til kontraktsmedhjelpere som har kontrakt direkte med entreprenøren, samt opplysninger om hvem som har signaturrett for disse. Entreprenøren har plikt til å informere om endringer i slike opplysninger i kontraktsperioden, inkludert opplysninger om nye underleverandører.

Byggherren kan holde tilbake et beløp tilsvarende 5 promille av kontraktsummen dersom kravene til begrenset antall ledd i leverandørkjeden ikke overholdes eller det det er grunn til å tro at kravene ikke vil bli overholdt. Hvis entreprenøren retter forholdet innen en rimelig frist fastsatt av byggherren opphører tilbakeholdet.

Hvis kravet til begrenset antall ledd i leverandørkjeden ikke rettes innen fristen som er fastsatt av byggherren, kan byggherren ilegge entreprenøren en bot tilsvarende 5 promille av kontraktsummen. Boten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt, bot eller erstatning for andre forhold. Byggherren kan også påberope forholdet som grunnlag for heving.

#### *B.2.12.3 Bruk av innleie*

Entreprenøren skal i størst mulig grad benytte egen bemanning. Bruk av bemanningsselskap skal i et hvert tilfelle varsles byggherren, og er underlagt arbeidsmiljøloven, herunder kravet om likebehandling i § 14-12a. Byggherren kan bare nekte bruk der han har saklig grunn.

Bruk av enkeltpersonforetak skal i hvert tilfelle varsles. Byggherren kan bare nekte bruk der han har saklig grunn.

#### *B.2.12.4 Krav om kvalifisert utførelse*

Dersom entreprenøren støttet seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kvalifikasjonskravene til kompetanse og relevant faglig erfaring, skal disse virksomhetene utføre tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene som krever slike kvalifikasjoner.

Byggherren har rett til å heve kontrakten hvis entreprenøren ikke retter overtredelser av dette punkt innen en rimelig frist fastsatt av byggherren.

#### *B.2.12.5 Krav om solidaransvar*

Dersom entreprenøren støttet seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til økonomisk og finansiell kapasitet, skal disse være solidarisk ansvarlige for utførelsen av kontrakten.



Dokumentnr.: SUS2023-K1018-KONT-SP-0002

Revisjon: 01

Dato:

XXXXXX

Tittel: Del II Kontraktsgrunnlaget

Kontrakt: K1018 - Transport anlegg etc.

Side:

15 av 21

**B.2.13 Tiltransport (NS 8405 pkt. 16)****B.2.13.1 Tiltransport til underentreprise (NS 8405 pkt. 16.1)**

Det gjelder ingen spesielle kontraktsbestemmelser for dette punktet. Aktuell bestemmelse i NS 8405 gjelder.

**B.2.13.2 Påslag (NS 8405 pkt 16.4)**

Det gjelder ingen spesielle kontraktsbestemmelser for dette punktet. Aktuell bestemmelse i NS 8405 gjelder.

**B.2.14 Fremdrift og samordning (NS 8405 pkt. 18 og pkt. 19.7)**

Bestemmelsene i NS 8405 pkt. 18, pkt. 19.7 og pkt. 20 endres som følge av at prosjektet skal gjennomføres etter LEAN-metodikk.

Følgende skal gjelde:

**B.2.14.1 Byggherrens koordinering (NS 8407 pkt. 19.7)**

Det gjelder ingen spesielle kontraktsbestemmelser for dette punktet. Aktuell bestemmelse i NS 8405 gjelder.

**B.2.14.2 Entreprenørens fremdriftsplan (NS 8405 pkt. 18.1)**

Det gjelder ingen spesielle kontraktsbestemmelser for dette punktet. Aktuell bestemmelse i NS 8405 gjelder.

**B.2.14.3 Samordningsplikt (NS 8405 pkt. 18.3)**

NS 8405 pkt. 18.3 endres. Følgende skal gjelde:

Entreprenøren har utstrakt plikt til samordning med alle aktører i prosjektet uten særskilt vederlag. Han skal gjennomføre utførelsen i tett samarbeid med byggherre og øvrige aktører.

Hvis entreprenøren blir forsinket av forhold som han selv har ansvaret eller risikoen for, skal entreprenøren umiddelbart, for egen regning, iverksette forseringstiltak for å innhente forsinkelsen. Hvis forsinkelsen ikke er innhentet innen oppstart av neste vogn, kan byggherren kreve erstatning. Byggherren kan for øvrig kreve erstattet kostnader ved at det må gjennomføres ny eller flere tilkomstbefaringer.

Hvis entreprenøren blir forsinket, eller det er risiko for at entreprenøren vil bli forsinket, av forhold som skyldes sideentreprenør, prosjekterende eller andre forhold som byggherren har ansvaret eller risikoen for, skal entreprenøren umiddelbart varsle byggherren.

Hvis entreprenøren vil kreve vederlagsjustering eller fristforlengelse skal kravet varsles og behandles etter bestemmelsene i NS 8405 kap. IV justert for eventuelle endringer av bestemmelsene i B.2 Spesielle kontraktbestemmelser.

**B.2.15 Prosjektering (NS 8405 pkt. 19.2)**

NS 8405 pkt. 19.2 spesifiseres. Byggherren leverer prosjektering i form av BIM-modell, se for øvrig B.2.1.5.



Dokumentnr.: SUS2023-K1018-KONT-SP-0002

Revisjon: 01

Dato:

XXXXXX

Tittel: Del II Kontraktsgrunnlaget

Kontrakt: K1018 - Transport anlegg etc.

Side:

16 av 21

**B.2.16 Endringer (NS 8405 pkt. 22)**

I NS 8405 pkt. 22 tilføyes følgende nytt punkt:

Byggherren kan kreve at entreprenøren, uten særskilt vederlag utarbeider spesifisert tilbud på endrings-/tilleggsarbeid som byggherren ønsker utredet. En slik forespørsel skal ikke anses som et pålegg.

Byggherrens prisforespørsel skal besvares uten ugrunnet opphold. Eventuelle merkostnader entreprenøren måtte få ved at fristen oversittes skal dekkes av entreprenøren.

Hvis byggherren ønsker endrings-/tilleggsarbeidet utført, skal det utstedes endringsordre.

**B.2.17 Regulering av rigg og drift (NS 8405 pkt. 25.3 andre ledd a)**

Følgende regler gjelder for vederlagsjustering for økte utgifter til kapitalkostnader, rigging, drift og nedrigging:

**B.2.17.1 Regulering i uendret byggetid**

Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer som følge av forhold beskrevet i NS 8405 pkt. 25.2 ikke overstiger 10 % av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.

Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 10% av kontraktssummen, gis det kompensasjon etter følgende formel:

$$\frac{0,5 * A * (B - 1,1 * C)}{C}$$

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel ekskl. mva.

B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist ekskl. mva.

C = opprinnelig kontraktbeløp (kontraktssum ekskl. mva.)

Ved utregningen av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist ekskl. mva. (B), skal det ikke tas hensyn til;

- regulering av kontraktssummen pga. lønns- eller prisstigning,
- utbetaling av påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av entreprise/leverandørkontrakter,
- avbestillingserstatning,
- endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg/drift, og
- kompensasjon for økt rigg og drift i endret byggetid.

Dokumentnr.: SUS2023-K1018-KONT-SP-0002

Revisjon: 01

Dato:

xxxxxx

Tittel: Del II Kontraktsgrunnlaget

Kontrakt: K1018 - Transport anlegg etc.

Side:

17 av 21

**B.2.17.2 Regulering i forlenget byggetid**

Har entreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8405 pkt. 24.1, jf. 24.5, skal vederlagsjustering for kapitallytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter følgende formel:

$$\frac{0,7 * A * Z}{Y}$$

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel ekskl. mva.

Y = opprinnelig byggetid (med byggetid menes tiden fra oppstart byggeplass (dersom dato for dette er angitt i konkurransegrunnlaget gjelder denne, hvis ikke gjelder dato for første tilrigging på byggeplass) til oppstart prøvedrift (overtakelse dersom ingen prøvedrift er avtalt)

Z = forlengelse utover opprinnelig byggetid

Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig.

**B.2.17.3 (NS 8405 pkt. 25.3 tredje og fjerde ledd)**

NS 8405 pkt. 25.3 tredje og fjerde ledd endres for krav som er omhandlet i B.2.16.1 og B.2.16.2. Følgende skal gjelde:

Kravene om særskilt varsel og løpende underretning i NS 8405 pkt. 25.3 tredje og fjerde ledd, gjelder ikke for vederlagsjustering for kapitallytelser, rigging drift og nedrigging.

**B.2.18 Indeksregulering (NS 8405 pkt. 27.1)**

NS 8405 pkt. 27.1 spesifiseres. Følgende skal gjelder:

Kontraktssummen skal indeksreguleres ved bruk av Statistisk Sentralbyrås indeks Boligblokk i alt.

**B.2.19 Mengdekontroll (NS 8405 pkt. 27.2)**

Det gjelder ingen spesielle kontraktsbestemmelser for dette punktet. Aktuell bestemmelse i NS 8405 gjelder.

**B.2.20 Avregning av kontraktsum og innestående (NS 8405 pkt. 28.1)**

Det gjelder ingen spesielle kontraktsbestemmelser for dette punktet. Aktuell bestemmelse i NS 8405 gjelder.

**B.2.21 Overtakelse (NS 8405 pkt. 32)**

Det gjelder ingen spesielle kontraktsbestemmelser for dette punktet. Aktuell bestemmelse i NS 8405 gjelder.

Dokumentnr.: SUS2023-K1018-KONT-SP-0002

Revisjon: 01

Dato:

xxxxxx

Tittel: Del II Kontraktsgrunnlaget

Kontrakt: K1018 - Transport anlegg etc.

Side:

18 av 21

**B.2.22 Sluttoppstilling med slutfaktura (NS 8405 pkt. 33.1)**

NS 8405 pkt. 33.1 første ledd andre setning endres. Følgende skal gjelde:

Innsendt slutfaktura og sluttoppstilling kan ikke korrigeres, med unntak av det som følger av pkt. 33.1 fjerde ledd andre setning.

**B.2.23 Dagmulkt ved forsinkelse (NS 8405 pkt. 34)****B.2.23.1 Dagmulktbelagte frister (NS 8405 pkt. 34.1)**

Dagmulktbelagte frister er angitt i konkurransegrunnlaget *E.1 Frister*.

**B.2.23.2 Dagmulktens størrelse (NS 8405 pkt. 34.3)**

NS 8405 pkt. 34.3 endres. Følgende skal gjelde:

Dagmulkten per hverdag skal utgjøre:

- 1 promille av kontraktssummen ved overskridelse av sluttfristen, men ikke mindre enn kr 10 000
- 1 promille av kontraktssummen for den delen av kontraktarbeidet som skal være ferdigstilt til en dagmulktbelagt frist, men ikke mindre enn kr 10 000

**B.2.23.3 Varslingsplikt (NS 8405 pkt. 34.4)**

I NS 8405 pkt. 34.4 tilføyes følgende:

Dette gjelder likevel ikke for forespørsler som første gang er fremsatt i, eller kort tid før sluttoppgjøret.

**B.2.24 Avbestilling og oppsigelse (NS 8405 pkt. 34.4)**

I NS 8405 pkt. 38.1 fjerde ledd tilføyes følgende:

Entreprenøren har likevel ikke krav på erstatning i tilfellene som fremgår av forskrift om offentlige anskaffelser § 28-3.

**B.2.25 Heving på grunn av mislighold (NS 8405 pkt. 39)**

I NS 8405 pkt. 39 tilføyes følgende nytt punkt:

Ved heving har byggherren alle rettigheter til materiale fra entreprenøren som skal innarbeides i BIM-modellen. Materialet, uavhengig av format, skal kunne disponeres av byggherren med sikte på fullføring av kontraktarbeidet og videre bruk i forbindelse med prosjektet.

**B.2.26 Bruk av dokumenter (NS 8405 pkt. 41)**

NS 8405 pkt. 41 endres. Følgende skal gjelde:

Dokumentnr.: SUS2023-K1018-KONT-SP-0002

Revisjon: 01

Dato:

xxxxxx

Tittel: Del II Kontraktsgrunnlaget

Kontrakt: K1018 - Transport anlegg etc.

Side:

19 av 21

Entreprenøren forplikter seg til ikke å offentliggjøre noen form for prosjekterelatert informasjon uten på forhånd å ha innhentet skriftlig godkjenning fra byggherren.

Dersom utarbeidelse av prosjektering, løsninger, dokumenter mv. inngår i entreprenørens kontrakt, har byggherren fri bruksrett til det som er utarbeidet for det aktuelle prosjektet, samt også for andre prosjekter.

### ***B.2.27 Foreløpig oppmannsavgjørelse (NS 8405 pkt. 43.2)***

NS 8405 pkt. 43.2 første ledd endres. Følgende skal gjelde:

Ved skriftlig samtykke fra den andre parten kan en tvist om kontraktsforholdet avgjøres av en oppmann.

### ***B.2.28 Tvisteløsning (NS 8405 pkt. 43.3/43.4)***

NS 8405 pkt. 43.3 og 43.4 endres. Følgende skal gjelde:

Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet skal avgjøres ved ordinær rettergang.

Tvisteforhold skal løses etter norsk rett. Avtalt verneeting er Stavanger tingrett.

### ***B.2.29 Øvrige spesielle bestemmelser***

#### ***B.2.29.1 Reklame***

Dersom entreprenøren eller kontraktsmedhjelpere for reklameformål eller på annen måte ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover å oppgi oppdraget som generell referanse, skal dette forelegges byggherren på forhånd.

Det er ikke tillatt til å drive reklame eller PR for eget firma på byggeplass eller på byggeplasskilt.

#### ***B.2.29.2 Kontakt med media***

All kontakt med media skal håndteres av byggherren. Entreprenøren skal varsle byggherren uten ugrunnet opphold hvis han blir kontaktet av media om forhold som er relevant for prosjektet.

#### ***B.2.29.3 Etiske krav***

Entreprenøren skal etterleve følgende grunnleggende krav:

- Forbud mot barnearbeid (FNs barnekonvensjon artikkel 32, ILO-konvensjoner nr. 138 og 182): Barn har rett til å bli beskyttet mot økonomisk utnyttning i arbeid, og mot å utføre arbeid som kan svekke utdannings- og utviklingsmuligheter. Minstealderen må ikke i noe tilfelle være under 15 år (14 eller 16 år i visse land). Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som setter helse eller sikkerhet i fare, inkludert nattarbeid. Dersom det foregår slikt barnearbeid, skal det arbeides for snarlig utfasing. Det skal samtidig legges til rette for at barna gis mulighet til livsopphold og utdanning inntil barnet ikke lenger er i skolepliktig alder.

Dokumentnr.: SUS2023-K1018-KONT-SP-0002

Revisjon: 01

Dato:

XXXXXX

Tittel: Del II Kontraktsgrunnlaget

Kontrakt: K1018 - Transport anlegg etc.

Side:

20 av 21

- Forbud mot tvangsarbeid/slavearbeid (ILO-konvensjoner nr. 29 og 105): Det skal ikke forekomme noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid. Arbeiderne må ikke levere depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver, og skal være fri til å avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid.
- Forbud mot diskriminering (ILO-konvensjoner nr. 100 og 111): Det skal ikke forekomme noen diskriminering i arbeidslivet basert på etnisk tilhørighet, religion, alder, uførhet, kjønn, ekteskapsstatus, seksuell orientering, fagforeningsmedlemskap eller politisk tilhørighet.
- Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger (ILO-konvensjoner nr. 87 og 98): Arbeiderne skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget valg, og å forhandle kollektivt. Dersom disse rettigheter er begrenset eller under utvikling, skal Entreprenøren medvirke til at de ansatte får møte ledelsen for å diskutere lønns- og arbeidsvilkår uten at dette får negative konsekvenser for arbeiderne.

Entreprenøren skal påse at ansattes rettigheter i denne bestemmelse etterleves i egen virksomhet og hos den eller de underleverandører/underentreprenører som medvirker til oppfyllelse av kontrakten. På oppfordring fra byggherren skal dette dokumenteres ved:

- Egenrapportering, og/eller
- Oppfølgingssamtaler, og/eller
- En uavhengig parts kontroll av arbeidsforholdene, og/eller
- Tredjepartssertifisering som SA8000 eller tilsvarende.

Entreprenøren har bevisbyrden for at de varer og materialer som leveres ikke innebærer brudd på denne bestemmelsen.

Ved mislighold av ovennevnte forpliktelser kan byggherren kreve at entreprenøren retter de påpekte manglene innen en rimelig frist fastsatt av byggherren. Rettelsene skal dokumenteres skriftlig og på den måten byggherren bestemmer. Dersom bruddet har skjedd hos underleverandør, kan byggherren kreve at entreprenøren skifter ut underleverandøren. Dette skal skje uten kostnad for byggherren.

Dersom entreprenøren blir klar over forhold i strid med kontrakten, skal entreprenøren rapportere dette til byggherren uten ugrunnet opphold.

Manglende utbedring er å anse som et vesentlig mislighold av ovennevnte plikter og kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving. Entreprenøren blir videre ansvarlig for det tap som byggherren lider som følge av overtredelsen.

#### *B.2.29.4 Konsekvenser for senere konkurranser*

Brudd på pliktene i denne kontrakten vil kunne bli nedtegnet og få betydning i senere konkurranser, enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen.

## **C Tekniske krav**

Se vedlegg 2.3 - A.5 Dokumentliste

Dokumentnr.: SUS2023-K1018-KONT-SP-0002

Revisjon: 01

Dato:

xxxxxx

Tittel: Del II Kontraktsgrunnlaget

Kontrakt: K1018 - Transport anlegg etc.

Side:

21 av 21

---

## **D      Krav til byggeprosessen**

Se vedlegg 2.3 - A.5 *Dokumentliste*

## **E      Frister og dagmulker**

Se vedlegg 2.3 - A.5 *Dokumentliste*

## **F      Vederlag**

Se vedlegg 2.3 - A.5 *Dokumentliste*
