

Oppgradering – Rødbrua i Tromsdalen
Konkurransegrunnlag totalentreprise
Dato: 23.07.20

Innhold

1 – Tilbudsinnsbydelse	4
1.1 – Innsbydelse	4
1.2 – Orientering om prosjektet og kontrakten.....	4
1.3 – Oppdragsgivers kontaktperson	5
1.4 – Forbehold.....	5
2 – Regler for gjennomføring av konkurransen	5
2.1 – Anskaffelsesprosedyre.....	5
2.2 – Kunngjøring.....	5
2.3 – Viktige datoer	6
2.4 – Tilbudsåpning	6
3 – Grunnlag for tilbudet	6
3.1 – Konkurranses grunnlagets oppbygning.....	6
3.2 – Oppdatering av konkurranses grunnlaget og spørsmål	6
3.3 – Befaring og informasjonsmøte	6
4 – Krav til tilbudet	7
4.1 – Organisering av tilbuds dokumentene	7
4.2 – Språk.....	7
4.3 – Tilbudets innhold.....	7
4.3.1 – Avvik og forbehold.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
4.3.2 – Alternative tilbud.....	7
4.3.3 – Deltilbud.....	7
4.4 – Offentlighetsloven	7
4.5 – Levering av tilbud	7
5 – Kvalifikasjonskrav.....	9
6 – Tildelingskriterier	9
7 – Vedlegg	10
A – Generell del	I
A.1 – Innledning.....	I
A.2 – Kort om kontraktarbeidets omfang.....	I
A.3 – Organisasjon og entreprisemodell	II
B – Kontraktsbestemmelser.....	III
B.1 – Alminnelige kontraktsbestemmelser.....	III
B.2 – Spesielle kontraktsbestemmelser	III
B.2.1 – Personell for utføring av oppdraget	Feil! Bokmerke er ikke definert.
B.2.2 – Prosjektmateriale (NS 8401 pkt. 6).....	Feil! Bokmerke er ikke definert.

B.2.3 – Regulering av prisen (NS 8401 pkt. 15)	Feil! Bokmerke er ikke definert.
B.2.1 – Personell for utføring av oppdraget	Feil! Bokmerke er ikke definert.
B.2.2 – Prosjektmateriale (NS 8402 pkt. 5).....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
B.2.2 – Partenes representanter (NS 8405 pkt. 6)	Feil! Bokmerke er ikke definert.
B.2.3 – Sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt. 9)	Feil! Bokmerke er ikke definert.
B.2.4 – Forsikring (NS 8405 pkt. 10).....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
B.2.5 – Forhold på byggeplassen (NS 8405 pkt. 12).....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
B.2.6 – Bruk av underentreprenører (NS 8405 pkt. 15)	Feil! Bokmerke er ikke definert.
B.2.7 – Endringer (NS 8405 pkt. 22).....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
B.2.8 – Fristforlengelse (NS 8405 pkt. 24).....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
B.2.9 – Fastsettelse av vederlag (NS 8405 pkt. 27).....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
B.2.10 – Generelle betalingsbestemmelser (NS 8405 pkt. 29)....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
B.2.11 – Regningsarbeider (NS 8405 pkt. 31)	Feil! Bokmerke er ikke definert.
B.2.12 – Overtakelse (NS 8405 pkt. 32)	Feil! Bokmerke er ikke definert.
B.2.13 – Tillegg	Feil! Bokmerke er ikke definert.
B.2.2 – Partenes representanter (NS 8406 pkt. 5)	Feil! Bokmerke er ikke definert.
B.2.3 – Sikkerhetsstillelse (NS 8406 pkt. 8)	Feil! Bokmerke er ikke definert.
B.2.4 – Forsikring (NS 8406 pkt. 9).....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
B.2.6 – Bruk av underentreprenører (NS 8406 pkt. 12)	Feil! Bokmerke er ikke definert.
B.2.6 – Forhold på byggeplassen (NS 8406 pkt.13).....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
B.2.7 – Endringer. Forsinkelser og svikt ved byggherrens medvirkning (NS 8406 pkt. 19)	Feil! Bokmerke er ikke definert.
B.2.9 – Fastsettelse av vederlag (NS 8406 pkt. 23).....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
B.2.10 – Tillegg	Feil! Bokmerke er ikke definert.
C – Tekniske krav.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
C.1 – Tekniske rammebetingelser	Feil! Bokmerke er ikke definert.
C.2 – Teknisk beskrivelse	Feil! Bokmerke er ikke definert.
C.3 – Tegninger og modeller.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
D – Krav til byggeprosessen	Feil! Bokmerke er ikke definert.
D.1 – Administrative rutiner	Feil! Bokmerke er ikke definert.
D.1.1 – Byggemøter	Feil! Bokmerke er ikke definert.
D.1.2 – Korrespondanse	Feil! Bokmerke er ikke definert.
D.1.3 – Revisjon av tegninger	Feil! Bokmerke er ikke definert.
D.1.4 – Tilleggs- og endringsarbeider	Feil! Bokmerke er ikke definert.
D.1.5 – Prosjekthotell	Feil! Bokmerke er ikke definert.
D.1.6 – Regulerbare mengder.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
D.1.7 – Fakturering	Feil! Bokmerke er ikke definert.
D.1.8 – Betalingsfrister	Feil! Bokmerke er ikke definert.

Del I

D.2 – Kvalitetssikring.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
D.3 – Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA).....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
E – Frister og dagmulker.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
E.1 – Frister	Feil! Bokmerke er ikke definert.
E.2 – Døgnmulker	Feil! Bokmerke er ikke definert.
E.3 – Fremdriftsplanlegging.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
F – Vederlaget	Feil! Bokmerke er ikke definert.
F.1 – Prissammenstilling	Feil! Bokmerke er ikke definert.
F.2 – Regningsarbeider.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
F.3 – Opsjoner	Feil! Bokmerke er ikke definert.
G – Oppdragsgivers ytelser	Feil! Bokmerke er ikke definert.

Del I

1 – Tilbudsinnbydelse

1.1 – Innbydelse

Tromsø kommune Byutvikling v/enhet Veg innbyr med dette til en åpen tilbudskonkurranse for prosjektet oppgradering av Rødbrua i Tromsdalen gnr 15 bnr 3.


1.2 – Orientering om prosjektet og kontrakten

Prosjektet innbefatter oppgraderinga av eksisterende fagverksbru i Tromsdalen. Det skal fjernes asfalt for å ta ned vekten (ned til 6 cm), overgang og utjevning/tilpasning til eksisterende veg i begge ender av brua. Betongskader på landkar skal utbedres og hele konstruksjonen skal rengjøres. Etter rengjøring skal brua overflatebehandles og males opp. Inspeksjonsrapport fra 2019 viser overflatisk korrosjon som ikke har satt seg i stålet. Autovernet på brua og landsidene skal erstattes med stående brurekkverk beregnet for gang og sykkelveg jf håndbok N101. Rekkverkene males rød/lik brua. Se prosjektbeskrivelse for ytterligere detaljer.

Det ligger høyspents kabler, fiberkabler og gamle TV kabler i kabelboks plassert på østside av bruene. Kabelboksen beholdes men overflatebehandles, vaskes og males opp lik resten av konstruksjonen. Tilbyder skal avklare med kabeleiere hvilken påkjenning kabelboks er dimensjonert for, eksempelvis om denne tåler høytrykksspyling, og bærer ansvar ved eventuelle skader på tredjeparts anlegg.

Fiberkablene krysser Evjenvegen på sørsiden av brua og synes å følge eksisterende autovern på nordsiden av brua. Tilbyder må påregne kabelpåvisning og ta hensyn til denne ved utjevning/tilpasning av vegen til nytt brudekke og utskifting av autovern til brurekkverk på landsidene.

Tilbydere påtar seg ansvaret å utføre prosjektet som en totalentreprise iht. NS8407. Prosjektet er finansiert av staten gjennom «Corona-tiltak» som skal stimulere bygg- og anleggsbransjen. En av forutsetningene er at utførelsen av prosjektet skal påbegynnes i løpet av 2020. Oppdragsgiver ønsker følgende fremdriftsplan : oppstart snarest, og senest uke 38. Ferdigstilling av prosjekt: senest uke 50. Fremdriftsplanen er fleksibel etter avtale, under forutsetning av at prosjektet ferdigstilles i 2020.

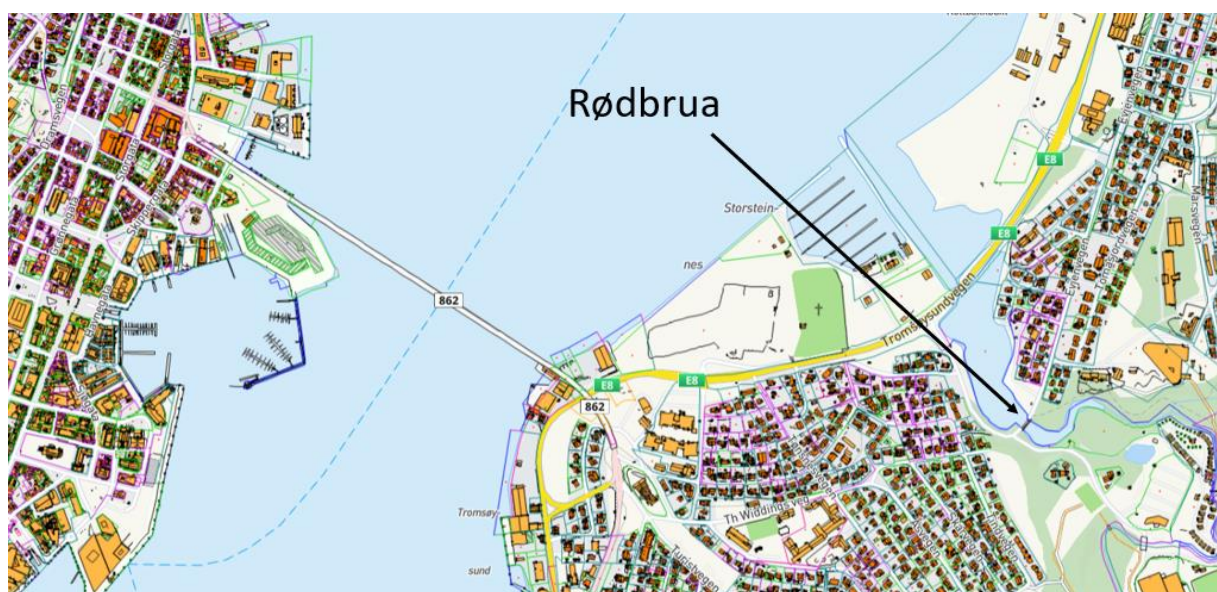

1.3 – Oppdragsgivers kontaktperson

Enhet:	Byutvikling, Veg
Prosjektleder:	Kristina Jakobsen, stedfortreder Stig Tore Moe
Tlf.:	94783985, 40033252
E-post:	Kristina.Jakobsen@Tromso.kommune.no Stig-Tore.Moe@Tromso.kommune.no
Bestillernr. (til bruk ved fakturering):	42000033

All kommunikasjon i forbindelse med konkurransen skal rettes skriftlig til ovennevnte kontaktpersoner i Tromsø kommune via konkurransegjennomføringsverktøyet. Det skal ikke være kontakt med andre personer i organisasjonen enn nevnte kontaktpersoner.

1.4 – Forbehold

Oppdragsgiver tar forbehold om at tilbud holdes innenfor rammene av prosjektets finansiering. Dersom tilbud overstiger budsjett forbeholder oppdragsgiver seg retten til å minke oppdraget, slik at rammene oppfylles – eller avlyse konkurransen som helhet

2 – Regler for gjennomføring av konkurransen

2.1 – Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til Lov om offentlige anskaffelser LOV-2016-06-17 nr. 73 (LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser FOR-2016-08-12 nr.974 (FOA) del I og del II.

Konkurransen gjennomføres som en åpen tilbudskonkurranse, hvilket innebærer at alle interesserte leverandører kan gi tilbud og oppdragsgiver kan ha dialog med en eller flere leverandører, jf. FOA §9-2 (1) og (3). Dialogen kan gjelde alle sider av tilbudet og kan blant annet omfatte avklaringer og forhandlinger. Utvelgelsen vil bli gjort etter en vurdering av tildelingskriteriene. Det presiseres at ingen leverandører kan forvente dialog om sitt tilbud, og at det oppfordres til å levere sitt beste tilbud.

Forhandlinger blir ikke gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er mottatt, vurderer at forhandlinger ikke er hensiktsmessig. Dialogen i form av rettinger/avklaringer gjennomføres etter behov.

Leverandøren oppfordres på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter gjennom Mercell til kontaktperson.

2.2 – Kunngjøring

Konkurransen er kunngjort i konkurransegjennomføringsverktøyet Mercell

2.3 – Viktige datoer

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for anskaffelsen:

Aktivitet	Tidspunkt
Frist for å levere tilbud	24.08.2020 kl: 12:00
Tilbudsåpning	24.08.2020 kl: 12:00
Meddelelse om valg av leverandør	1-2 dager
Karensperiode	5 dager etter meddelelse

Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter åpning av tilbudene er veiledende.

2.4 – Tilbudsåpning

Tilbudsåpning finner sted iht. punkt 2.3. Det vil ikke bli sendt ut åpningsprotokoll. Det vil ikke være anledning for å være tilstede ved åpning.

3 – Grunnlag for tilbudet

3.1 – Konkurransesgrunnlagets oppbygning

- Del I - Dette dokumentet med bestemmelser og konkurransegjennomføring med kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier
- Del II – Kontraktsbestemmelser, beskrivelse av oppdrag
- Prosjektbeskrivelse

3.2 – Oppdatering av konkurransegrunnlaget og spørsmål

Tilbydere oppfordres til å ta kontakt med oppdragsgiver i god tid før tilbudsfristens utløp dersom de finner at konkurransegrunnlaget inneholder uklarheter, mangelfull informasjon eller forhold som tilbyderen ikke kan akseptere, slik at oppdragsgiver får mulighet til å vurdere om konkurransegrunnlaget bør presiseres, utdypes eller endres. Spørsmål og ønske om avklaringer fremsettes skriftlig til oppdragsgivers kontaktperson. Oppdragsgiver vil publisere spørsmål og svar som tilleggsinformasjon i Mercell. Det vil ikke bli angitt hvem som har stilt spørsmålet. Meddelelsen er en del av konkurransegrunnlaget. Frist for spørsmål er syv dager før tilbudsfristen utløp. Siste frist for oppdatering av konkurransegrunnlaget er tre, 3, dager før tilbudsfristens utløp.

3.3 – Befaring og informasjonsmøte

Oppdragsgiver har ikke planlagt gjennomføre befaring i forbindelse med tilbudskonkurransen.

4 – Krav til tilbudet

4.1 – Organisering av tilbudsdokumentene

1. Signert tilbudsbrief med pris.
2. Dokumentasjon iht. kvalifikasjonskravene, se kapittel 5 i del I, konkurransebeskrivelsen.

4.2 – Språk

Tilbudet skal fremsettes på norsk

4.3 – Tilbudets innhold, avvik og forbehold

Det skal leveres et eget datert og underskrevet tilbudsbrief. Tilbudsbrevet skal redegjøre entydig og presist for ethvert forbehold mot kontraktsvilkårene, eller avvik fra kravspesifikasjonene, slik at oppdragsgiver kan vurdere disse uten kontakt med tilbyder. Vesentlige forbehold/avvik kan føre til avvisning. Det gjøres oppmerksom på at også ikke-vesentlige forbehold eller avvik kan føre til at oppdragsgiver avviser tilbudet jf. FOA kap.9.

Arbeidet skal leveres for en fast pris. Entreprenøren overtar risikoen for eventuell økning i priser og lønninger, men ikke for forandringer i arbeidets omfang. Byggherre på sin side får ingen kompensasjon for eventuell reduksjon i priser og lønninger.

4.3.2 – Alternative tilbud

Alternative tilbud aksepteres ikke.

4.3.3 – Deltilbud

Deltilbud aksepteres ikke.

4.4 – Offentlighetsloven

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder offentleglova. Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. FOA §§ 7-3 og 7-4 og, jf. forvaltningsloven § 13.

4.5 – Levering av tilbud

Tilbud, med alle vedlegg (herunder vedlegg for å vurdere kvalifikasjonskrav), skal leveres elektronisk via Merccell-portalen, www.merccell.no, innen tilbudsfristen. Systemet tillater ikke levering av tilbud etter fristen. Det er tilbyders ansvar å levere rettidig. Det skal innleveres komplett tilbud på samtlige leveranser og arbeider. Ufullstendige tilbud kan bli avvist. Totalentreprenøren plikter å gjøre seg kjent med offentlige lover og forskrifter, samt Tromsø kommunes retningslinjer med hensyn til alle deler av arbeidet.

Vedståelsesfrist

Tilbudet skal være gyldig i 90 kalenderdager fra tilbudsfristens utløp.

Tilbudskostnader

Alle kostnader ved å utarbeide og levere tilbud må bæres av tilbyder.

5 – Kvalifikasjonskrav

For å kunne få sitt tilbud evaluert må leverandøren levere vedlagt egenerklæring for kvalifikasjonskrav, Vedlegg 3. Følgende kvalifikasjonskrav stilles:

1. Firmaattest
2. Fullmakt skatt
3. Årsregnskap
4. Leverandør må være kvalifisert til å kunne kreve ansvarsrett i nødvendig tiltaksklasse ihht. Byggesaksforskriften

6 – Tildelingskriterier

Tildeling av kontrakt skjer på grunnlag av hvilket tilbud som har lavest pris. Informasjon i tilbudsbrevet og vedleggene utfyller hverandre. Dersom tilbudsbrev og vedlegg skulle inneholde opplysninger som motstrider hverandre, gjelder opplysninger i tilbudsbrevet foran opplysninger gitt i vedleggene til tilbudet. Når det gjelder pris går likevel opplysninger i tilbudsskjema foran opplysninger i tilbudsbrevet, dersom det skulle være motstrid. Tilbudet skal bestå av tilbudsbrev og de vedlegg som angitt i tabell nedenfor.

Tildelingskriterium:	Dokumentasjonskrav:	Merking av dokumentasjon;
Pris (100 %) Totalpris Tilbudssum	Tilbudsbrev med opplysninger om evt. forbehold og avvik.	Vedlegg A.1 – Tilbudsbrev

Oppdragsgiver henstiller tilbyder til å følge merking av dokumentasjon

6.1 – Vurdering av tildelingskriterier

6.1.1 – Pris

Evaluering av pris: Det benyttes en skala fra 0-10 hvor laveste pris gis 10 poeng. Leverandører med høyere pris får relativt lavere poengscore. Det gis ikke lavere poengscore enn 0.

6.2 – Tilbudets forbehold

For å være gyldige, må forbehold av enhver art være spesifisert og tatt med i tilbudsbrevet.

Bemerkninger til oppdragsbeskrivelse kan likevel anføres på det aktuelle sted, men må i så fall angis i tilbudsbrevet med henvisning til sidetall og punktnummer. Tilbyderen må være forberedt på at forbehold som ikke kan godtas av byggherren kan bli kostnadsberegnet ved avgjørelsen, og senere avløst med et kronebeløp.

Betydelige forbehold eller forbehold som etter vurdering ikke lar seg kostnadsberegne, kan føre til at tilbudet vurderes som ufullstendig og må avvises.

7 – Vedlegg

Vedlegg nr.	Beskrivelse
1	Prosjektområde kart
2	Egenerklæring - kvalifikasjonskrav
3	SHA plan, oppgradering av Rødbrua i Tromsdalen (pdf)
4	Egenerklæring lønns- og arbeidsvilkår, oppgradering av Rødbrua i Tromsdalen
5	Prosjektbeskrivelse (pdf)

Del II

A – Generell del

A.1 – Innledning

Prosjektet innbefatter oppgraderinga av eksisterende fagverksbru i Tromsdalen. Det skal fjernes asfalt ned til 6 cm, overgang og utjevning/tilpasning til eksisterende veg i begge ender av brua.

Betongskader på landkar (begge sider) skal utbedres og hele konstruksjonen skal rengjøres. Etter rengjøring skal brua overflatebehandles og males opp. Autovernet på brua og landsidene skal erstattes med stående brurekkverk beregnet for gang og sykkelveg, ca 95m. Rekkverket skal tilfredsstillende kravene for gang og sykkelrekkverk på bru i håndbok N101. Rekkverkene males rød/lik brua. Se prosjektbeskrivelse for ytterligere detaljer.

Det ligger høyspents kabler, fiberkabler og gamle TV kabler i kabelboks plassert på østside av bruen. Kabelboksen beholdes men overflatebehandles, vaskes og males opp lik resten av konstruksjonen. Fiberkablene krysser Evjenvegen på sørsiden av brua. Tilbyder må påregne kabelpåvisning og ta hensyn til denne ved utjevning/tilpasning av vegen til nytt brudekke. Tilbyder må også påregne dialog med kabelaktører i forhold til vask og overflatebehandling av kabelboks. Et av forholdene som må avklares er hvorvidt kabelboks tåler høytrykksspyling eller må vaskes for hånd. Tilbyder bærer ansvar for eventuelle skader påført tredjeparts anlegg som følge av vasking.

Tilbydere påtar seg ansvaret å utføre prosjektet som en totalentreprise iht. NS8407. Prosjektet er finansiert av staten gjennom «Corona-tiltak» som skal stimulere bygg- og anleggsbransjen. En av forutsetningene er at utførelsen av prosjektet skal påbegynnes i løpet av 2020. Oppdragsgiver ønsker en fremdriftsplan med oppstart snarest, og senest uke 38. Ferdigstilling av prosjekt: senest uke 50. Fremdriftsplanen er fleksibel etter avtale, under forutsetning av at prosjektet ferdigstilles i 2020.

- Ønsket oppstart: snarest, og senest uke 38
- Ønsket sluttfrist: uke 50.

A.2 – Kort om kontraktarbeidets omfang

Tilbyder skal oppgradere Rødbrua som beskrevet i punkt A.1. Arbeidet skal utføres som en totalentreprise. Totalentreprisen skal inkludere alt arbeide med rehabiliteringen. Alt arbeid skal foregå i tråd med gjeldende normer, håndbøker og forskrifter. For dette prosjektet er følgende relevante:

- Tromsø kommunes kommunaltekniske norm
- Retningslinjer for graving og annet arbeide på kommunal grunn i Tromsø Kommune
- Statens Vegvesens håndbøker

Der det er motstrid mellom Tromsø kommune og Statens Vegvesens håndbøker skal totalentreprenør så tidlig som mulig avklare hva som er gjeldende. Tromsø kommune skal kunne avgjøre hvilken løsning man lander på.

Tilbyder er i tillegg ansvarlig for å få alle offentlige tillatelser på plass, så vel som koordinere eget arbeid mot berørte parter. Dette gjelder blant annet arbeidsvarsling, gravemelding, kabelpåvisning, blålysetater, kollektivtrafikk og ved behov kabeletater. Det er prekært at tilbydere skal samordne sin framdrift i tråd med Fylkestrafikks framføring av lokaltrafikk og særlig skolebuss i området. Med unntak fra byggesak skal tilbyder innhente nødvendig dokumentasjon og forestå søknad om tillatelser fra offentlig myndighet til å utføre og ta i bruk kontraktsgjenstanden.

Arbeide som er utenfor kontraktens omfang:

- Byggesøknad skal ikke gjennomføres av Totalentreprenør.

A.3 – Organisasjon og entreprisemodell

Tromsø kommune, Byutvikling er byggherre for prosjektet. Kristina Jakobsen vil være prosjektleder på vegne av kommunen. Med bakgrunn i korte frister som følge av Coronamidler og ferieavvikling vil Stig Tore Moe fungere som stedfortreder ved ferieavvikling.

Byggherre:	Tromsø kommune, Byutvikling enhet Veg
Adresse:	Rådhuset, 9299 Tromsø
Tlf sentralbord:	777 90 000
Prosjektleder:	Kristina Jakobsen, stedfortreder Stig Tore Moe
E-post:	Kristina.Jakobsen@Tromso.kommune.no Stig-Tore.Moe@Tromso.kommune.no
Tlf:	947 83 985, 400 33 252
Bestiller nummer;	42 00 00 33

Det er ikke tatt stilling til om det skal engasjeres byggeleder. Prosjektet vil bli utført som en totalentreprise.

B – Kontraktsbestemmelser

B.1 – Alminnelige kontraktsbestemmelser

Generelle kontraktsbestemmelser styres av NS 8407:2011 Norsk bygge- og anleggskontrakt, med de endringer og presiseringer som angitt i kap. B.2.

Avtaledokument:

Byggblankett 8407 A:2011 – Formular for kontrakt om totalentreprise

B.2 – Spesielle kontraktsbestemmelser

Tilføyelser er satt i kursiv. Bestemmelser som skal utgå er overstrøket. Nye punkter og ledd er angitt med «Nytt punkt» eller «Nytt ledd», og er satt i kursiv.

B.2.1 – Møter (NS 8407 pkt. 4)

4.3 Møter med kontraktsmedhjelpere

Nytt ledd: *Byggherren skal innkalles til prosjekterings- og kontraktsmedhjelpermøter (herunder byggemøter, fremdriftsmøter, m.v.), og skal ha anledning til å delta på disse møtene.*

Totalentreprenøren skal føre referat fra møtene, og byggherrens representant skal ha kopi av møtereferatene. Prosjekteringsmøter skal avholdes hver 14. dag eller ved behov.

Nytt ledd: *I byggeperioden skal det avholdes kontraktsmedhjelpermøter hver 14. dag. I tillegg skal det avholdes regelmessige framdrifts-/koordineringsmøter, samt nødvendige særmøter.*

B.2.2 – Sikkerhetsstillelse (NS 8407 pkt. 7)

7.1 Generelle bestemmelser

Nytt ledd: *Konserngaranti godtas ikke som sikkerhetsstillelse.*

7.2 Totalentreprenørens sikkerhetsstillelse

Nytt ledd: *Totalentreprenørens sikkerhetsstillelse skal dokumenteres ved utfylling av formular, "Blankett NS 8407 B.2011 – Formular for totalentreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden".*

B.2.3 – Forsikring (NS 8407 pkt. 8)

8.1 Totalentreprenørens plikt til å holde kontraktarbeidet forsikret

Nytt ledd: *Totalentreprenørens forsikringer i henhold til NS 8407 pkt. 8 skal innen 14 dager etter kontraktinngåelse dokumenteres. Byggherren plikter ikke å betale avdrag før han har mottatt nevnte attester.*

8.2 Ansvarsforsikring

Nytt ledd: *Konsernforsikring godkjennes ikke som gyldig forsikring.*

B.2.4 – Kontraktsgjensstander (NS 8407 pkt. 14)

14.1 Avtalte krav

Nytt ledd: *Referanseprosjekt skal følges jf. NS8407 pkt. 14.1. Referanseprosjekt er Trafikksikker Skoleveg del2 kryss 4-22 Slettelse skole, Krysningspunkt Skippergata x Soppsvingen.*

B.2.5 – Krav til prosessen (NS 8407 pkt. 15)

Nytt ledd: *Totalentreprenør skal følge Tromsø Kommunes Kommunaltekniske normer, Håndbøker til Statens Vegvesen, Plan – og bygningsloven, ved gjennomføring av kontrakten.*

B.2.6 – Framdrift og samordning (NS 8407 pkt. 21)

21.3 Framdriftsstatus og varsling

Nytt ledd: *Totalentreprenøren skal hver andre uke informere byggherren om framdriftsstatus basert på framdriftsplanen etter 21.2*

B.2.7 – Fastsettelse av vederlag (NS 8407 pkt. 26)

Følgende presisering: *Denne kontrakten indeksreguleres ikke.*

B.2.8 – Fakturering (NS 8407 pkt. 27)

27.2.1 Faktureringsplan

Følgende presisering: *Betalingsplan skal framlegges jf. NS8407 pkt. 27.2.1. Betalingsplanen skal samsvare med framdriftsplan og overleveres byggherre ved oppstartsmøte for kontrakten.*

B.2.9 – Generelle betalingsbestemmelser (NS 8407 pkt. 28)

28.1 Betalingsfrist

Byggherren plikter å betale innen 28 dager etter at han har mottatt faktura i byggherres fakturasystem (Agresso). Faktura som utsendes i perioden 15. juni til 15. juli skal ha 45 dagers forfall.

Ved uenighet om et kravs berettigelse og/eller ved helt eller delvis frafall av krav, skal totalentreprenør sende kreditnota for hele fakturabeløpet, samtidig som det utstedes to nye fakturaer for hhv. omtvistet og uomtvistet krav.

Faktureringsrutiner fremgår av jf. NS8407 pkt. 27

Dersom regler ikke overholdes skal det sendes kreditnota. Avtalt betalingsfrist gjelder først når byggherren har mottatt faktura i henhold til gjeldende faktureringsrutiner.

B.2.10 – Særlige regler om regningsarbeid (NS 8407 pkt. 30)

30.1 Vederlagsberegning

Nytt led: *Byggherren styrer utførelsen av regningsarbeid. Totalentreprenør skal estimere kostnader/antall timer på mannskap og maskiner, samt materialer for tilleggsarbeidet. Byggherre skal ta stilling til tilbudet innen rimelig tid. Byggherre skal skriftlig avtale arbeidet før dette utføres.*

Totalentreprenøren plikter å varsle byggherren når regningsarbeid starter og slutter. Uteblir varsel taper totalentreprenøren retten til å kreve vederlag for regningsarbeidet.

Totalentreprenør plikter å varsle byggherren uten ugrunnet opphold hvis det blir venting på mannskaper og maskiner, slik at byggherren har en reell mulighet til å omdisponere ressursene. Unnlater totalentreprenør å varsle uten ugrunnet opphold mister han retten til å kreve tillegg for venting.

2.11 – Endringer (NS 8407 pkt. 31)

31.1 Retten til å pålegge endringer

Nytt ledd: *I den utstrekning byggherren avbestiller deler av kontraktarbeidet, respektive reduserer omfanget gjennom pålegg om endringer, kan byggherren også kreve utførelsestiden forkortet. En slik forkortet utførelsestid forutsetter at redusert avbestilt aktivitet ligger på kritisk linje.*

B.2.12 – Fristforlengelse (NS 8407 pkt.33)

33.1 Beregning av fristforlengelse

Nytt ledd: *Ved beregning av fristforlengelse for endrings- og tilleggsarbeider skal det foretas full reduksjon for arbeider som ikke er kommet til utførelse (fradragsarbeider).*

B.2.13 – Vederlagsjustering (NS 8407 pkt.34)

34.1.3 Særskilt varsel om økte utgifter til rigg og drift mv.

Nytt ledd: *Ved regulering av rigg og drift der byggetiden er forlenget (pga. byggherres forhold) skal totalentreprenøren dokumentere faktiske merkostnader til rigg, drift og nedrigging i den forlengede arbeidstiden. Reglene om totalentreprenørens tapsberegningsplikt gjelder likelydende iht. NS 8407 pkt. 34.4.*

B.2.14 – Forberedelse til overtakelse (NS 8407 pkt. 36)

36.2 Levering av FDV-dokumentasjon

Nytt ledd: *Dokumentasjon skal leveres iht. tromsø Kommunes kommunaltekniske normer.*

B.2.15 – Overtakelse (NS 8407 pkt. 37).

37.3 Byggherrens rett til å nekte overtakelse

Nytt ledd: *Byggherren kan i tillegg til det som fremgår av NS 8407 pkt. 37.3 nekte å overta kontraktarbeidet hvis:*

- *Totalentreprenøren ikke har levert avtalt FDV-dokumentasjon*
- *Totalentreprenør ikke har utført komplett opprydding.*

Hvis klimatiske forhold hindrer totalentreprenøren å ferdigstille overflater og liknende kan byggherren velge å overta kontraktarbeidet til drift og vedlikehold. Ved slik overtakelse vil ikke sikkerhet for ansvar i byggetiden bli nedtrappet jf. NS 8407 37.4, før hele kontraktarbeidet er avsluttet påfølgende vår/sommer.

B.2.16 – Brukstillatelse og prøvedrift (NS 8407 pkt.38)

38.1 Brukstillatelse

Følgende presisering: *For veg-, vann- og avløpsanlegg kan byggherren ta anleggene fortløpende i bruk. Totalentreprenør kan i slike tilfeller ikke kreve godtgjørelse for eventuelle merkostnader. Ved dette overtas eller godkjennes ikke denne del av entreprisen med mindre annet er sagt i innbydelsen.*

B.2.17 – Sluttoppgjør (NS 8407 pkt.39)

39.1 Sluttoppstilling med slutfaktura

Nytt ledd: *Ved uenighet om kravets berettigelse og/eller ved helt eller delvis frafall av krav, skal totalentreprenøren sende kreditnota for hele fakturabeløpet, samtidig som det utstedes to nye fakturaer for hhv. omtvistet og uomtvistet krav.*

Nytt ledd: *Fakturaene betegnes ikke som slutfaktura, men som delfaktura merket «omtvistet sluttoppgjør» og «uomtvistet sluttoppgjør». Uomtvistet krav betales av byggherren innen forfall oppført på ny faktura iht. gjeldende faktureringsrutiner.*

Utstedelse av nye fakturaer, slik beskrevet ovenfor, endrer ikke ved avtalte virkninger knyttet til slutfaktura.

B.2.18 – Tillegg

55 Internkontroll, SHA og ytre miljø

Entreprenøren plikter å ha eller opprette et internkontrollsystem, samt ivareta sine plikter mht. helse, miljø og sikkerhet på bygge- og anleggsplassen iht. de til enhver tid gjeldende lover og regler, samt byggherrens plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø for det aktuelle prosjektet.

Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og følger opp gjennom, entreprenørens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan identifiseres.

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på norsk. Entreprenør skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underentreprenører benytter kan kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. For å unngå at det skjer ulykker fordi ikke alle forstår informasjonen som blir gitt, gjelder følgende:

- Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i tillegg forstå og gjøre seg forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på.

- Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisninger, varselskilter mv. Materialet skal foreligge på det språk vedkommende arbeidstaker bruker som morsmål, såfremt arbeidstakeren ikke forstår informasjonen fullt ut på norsk eller engelsk.

Ved brudd på ovennevnte plikter, har byggherren rett til å stanse arbeidene dersom han anser det nødvendig.

Byggherren kan også kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke blir rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille av kontraktsummen, men ikke mindre enn 1 500 NOK. Mulkten skal betales i tillegg til en eventuell dagmulkt for forsinkelse.

Unnlatelse av å rette feilen innen fristens utløp anses som vesentlig mislighold, som kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp. For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, påløper en bot på 10 000 NOK per mislighold.

Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving. Der slikt mislighold består i stadige brudd på pliktene, kan byggherren heve selv om entreprenøren

retter forholdene. Byggherren kan på samme måte kreve at entreprenøren skifter ut underentreprenører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.

Alle avtaler entreprenøren inngår for utførelse av arbeid etter denne kontrakt skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

56 Personvern og GDPR

Alle parter forplikter seg til å følge lover og forskrifter om personvern og GDPR.

57 HMS-kort

Alle arbeidstakere skal ved utførelse av arbeid etter denne avtalen, lett synlig, bære gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, søknadsskjema og liknende aksepteres ikke som HMSkort.

Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort, skal bortvises fra anleggsplassen.

58 Innsending av mannskapslister og innsyn i oversiktslister

Før oppstart av arbeidet skal entreprenøren oversende oppdragsgiver en liste over hvilke personer som vil utføre arbeid på bygge- eller anleggsplassen med fødsels- eller D-nummer (11 siffer). Ved endringer i arbeidsstokken skal entreprenøren sende oppdragsgiver oppdatert mannskapsliste uten ugrunnet opphold.

Oppdragsgiver skal til enhver tid ha rett til innsyn i oversiktsliste(r) over alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres og kontrolleres daglig i henhold til Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser.

59 Egenrapportering om seriøsitet

Entreprenøren og hans underleverandører, herunder bemanningsforetak, plikter å fylle ut byggherrens skjema Vedlegg 5 – Egenrapportering lønns- og arbeidsvilkår før arbeidstaker starter opp på byggeplassen. Utfylt skjema skal oversendes oppdragsgiver innen én måned etter kontraktsperioden har startet, med mindre annet er avtalt, og kan kreves flere ganger i løpet av avtaletiden.

Brudd på denne plikten medfører at arbeidstakere fra entreprenør eller underleverandør eller bemanningsforetak som ikke har utfylt skjema kan nektes adgang eller bli bortvist fra byggeplassen.

60 Krav til lønns- og arbeidsvilkår (sosial dumping)

Totalentreprenøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos kontraktsmedhjelpere og innleid arbeidskraft har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til:

- Forskrift om allmenngjort tariffavtale
- Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8.februar 2008 der denne kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskriften skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransjen. Med lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn (herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg), utgifter til reise og kost og losji i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.

Totalentreprenøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle kontraktsmedhjelpere og innleid arbeidskraft. Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder.

Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos kontraktsmedhjelpere og innleide skal utbetales til konto i bank.

[1] Dersom totalentreprenøren og hans kontraktsmedhjelpere ønsker å gjennomsnittsberegne arbeidstiden i henhold til Arbeidsmiljøloven §10-5 for arbeidstakere som utfører kontraktarbeid, kan

entreprenøren skriftlig søke byggherren om dette. Samtykke vil kun bli gitt dersom arbeidsgiveren dekker reisekostnader til/fra arbeidstakers reelle hjemsted og sørger for kost og losji.

Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal entreprenøren rette forholdet innen skriftlig fastsatt frist fra byggherre. Der bruddet har skjedd hos en underentreprenør og/eller bemanningsselskaper, er rettingsplikten begrenset til krav som er fremm skriftlig innen tre måneder etter lønnens forfallsdato, både for krav som følger av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkår og begrensninger som følger av lov om allmenngjøring av tariffavtaler mm. Av 4.juni 1993 §13, skal gjelde i begge disse tilfellene.

[2] Dersom totalentreprenøren ikke dokumenterer lønns- og arbeidsvilkår for egne ansatte og/eller ansatte hos kontraktsmedhjelpere på tilfredsstillende måte innen avtalt frist, er det å anse som brudd på denne bestemmelsen.

[3] Ulovlig eller kontraktstridig praksis som ikke opphører umiddelbart etter at forholdet er påpekt, vil anses som vesentlig mislighold av denne bestemmelsen. Vesentlig mislighold av lønns- og arbeidsvilkår hos totalentreprenøren kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving, selv om totalentreprenøren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i kontraktsmedhjelperleddet, herunder også bemanningsselskaper, kan byggherren på samme måte kreve at totalentreprenøren skifter ut kontraktsmedhjelpere. Dette skal skje uten omkostninger eller risiko for byggherren. Ved brudd på plikter etter denne bestemmelsen som ikke er av ubetydelig karakter kan oppdragsgiver stanse arbeidene for totalentreprenørens regning og risiko, eller heve kontrakten. Selv om totalentreprenøren eller kontraktsmedhjelpere retter overfor arbeiderne, er ikke det til hinder for at oppdragsgiver kan på bakgrunn av entreprenørens forsinkelse, kreve eventuell dagmulkt etter kontraktens bestemmelser om forsinket levering. Dersom oppdragsgiver hever kontrakten med totalentreprenøren kan oppdragsgiver kreve å få tiltransportert til seg totalentreprenørens kontrakter med kontraktsmedhjelpere. Brudd på plikter etter denne bestemmelsen gir under enhver omstendighet oppdragsgiver rett på forholdsmessig prisavslag. Ved vurderingen av hva som er et forholdsmessig prisavslag, skal det særlig legges vekt på bruddet alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for oppdragsgiver, herunder betydningen for oppdragsgivers omdømme.

Brudd

Dersom totalentreprenøren ikke etterlever klausulen, har byggherren rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Byggherre kan holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger besparelsen for arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter [1] er dokumentert.

61 Yrkesskadeforsikring

Totalentreprenøren skal før kontraktsoppstart, og senere på forespørsel, dokumentere at alle arbeidere som utfører kontraktsarbeid for Tromsø kommune er dekket av yrkesskadeforsikring. Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Brudd

Brudd på yrkesskadebestemmelsen kan påberopes av både oppdragsgiver og den enkelte ansatte som grunnlag for erstatning overfor entreprenøren.

62 Krav om betaling med elektronisk betalingsmiddel/forbud mot kontantbetaling

All betaling i forbindelse med utførelsen av arbeid etter denne kontrakten skal betales med elektronisk betalingsmiddel. Alle avtaler entreprenør inngår for utføring arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelse.

Brudd

Mislighold av bestemmelsen over gir oppdragsgiver rett til prisavslag tilsvarende betalingen.

63 Innsyn

Byggherre, eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i:

- Entreprenørens kvalitetssystem
- Utførelsen av oppdraget
- Entreprenørens styringssystemer (eks. økonomi, miljø, HMS) som kan ha betydning for entreprenørens oppfyllelse av kontrakten.
- Arbeidstakernes ansettelseskontrakter, lønns slipper og timelister.

Innsynsretten omfatter blant annet revisjon, verifikasjon, intervjuer, inspeksjon, kontroll og dokumentgjennomgang. Entreprenøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt innsyn. Innsynsrettene er begrenset til tre år etter at siste betaling for prosjektet har funnet sted. Entreprenøren skal sørge for at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos eventuelle underentreprenører.

64 Informasjon og samordning

Entreprenør skal gå ut med løpende informasjon til beboere og næringsdrivende som berøres av arbeidene. Generelt skal all informasjon være skriftlig. For mindre områder bør informasjon gis direkte, og for større områder skal det annonseres i avisene. Entreprenør henstilles til å gi informasjon om stenginger av veger, adkomster, parkering og vareleveranser i god tid før arbeidene påbegynner. Entreprenøren skal fortløpende koordinere sine arbeider med næringsdrivende, beboere, huseiere, personell med særskilt behov for transport og nødetater. Entreprenøren skal også vurdere om det kan være forhold som kan skape problemer i forhold til slike interesser, og besørge en løsning på dette.

Graving i områder hvor det ikke er alternativ adkomst (eks. blindveger) kan være utfordrende. Entreprenør skal i god tid før arbeid her klargjøre løsninger som sikrer adkomstene og parkering. Opplegget må være klart og gjennomdrøftet med beboere etc. i så god tid at det kan sendes info til alle som berøres av arbeidene 1-3 uker før arbeidene. Opplegget skal også være slik at byggherren kan akseptere dette.
