

Prosjekt:

Nytt sykehus i Drammen

Tittel:

Bilag E5 - Prosjektnedbrytningsstruktur (PNS) og Kontrollområder

02	For implementering		02.06.20	JIH	FRL	ARH
01	For implementering		06.05.20	JIH	FRL	ARH
Rev.	Beskrivelse		Rev. Dato	Utarbeidet	Kontroll	Godkjent
Kontraktor/leverandørs logo:		Bygg nr:	Etasje nr.:	Systemgr.:	Antall sider:	
					Side 1 av 34	
Prosjekt:	Utgivernr:	Fag:	Dok.type:	Løpenr:	Rev.nr.:	Status:
NSD	0000	Z	PL	0030	02	G

Revisjonsendringer

Rev.:	Beskrivelse av endring
02	Kontrollområder for fasader, PNS nr for bygguavhengig forandret fra 000 til 100

Innholdsfortegnelse

1	Prosjektnedbrytningsstruktur (PNS)	3
2	Nivå 4 og 5 Bygg/Fløy	3
3	Nivå 6 Plan	4
4	Nivå 7 Kontrollområder	5
4.1	Fase 1 - Grunnarbeider og råbygg	5
4.2	Fase 2: Fasader.....	5
4.3	Fase 3: Innvendige arbeider og teknikk.....	5
4.4	ID for av kontrollområder i fase 3:.....	6
4.5	Prinsipper:.....	7
5	Vedlegg	7

1 Prosjektnedbrytningsstruktur (PNS)

Det er etablert følgende Prosjektnedbrytningsstruktur (PNS) for prosjektet:

Nivå 0: Prosjekt Nytt sykehus i Drammen

Nivå 1: Utbyggingsområder

Nivå 2: Del/Kontraktsområder

Nivå 3: Kontraktsnr/Entreprisenr

Nivå 4: Bygg/Område nr.

Nivå 5: Fløy

Nivå 6: Plan

Nivå 7: Kontrollområder

Alle planer og kostnader er brutt ned på nivå 0 til 3, og følges opp med sammenfallende oppdatering i forbindelse med budsjettrevisjoner og baselinerevisjoner.

Det er utarbeidet følgende oversikter over PNS, som ligger i Pims 365:

ID	Dokumentnr	Tittel	Emne	Delt med kontrakt(er)	Kontraktsnr	Dokumentplan	Dok. Gruppe	Fag	Rev	Sjek	Rev dat
21785	NSD-0000-Z-PL-0008	Prosjektnedbrytningsstruktur (PNS)	S1 Prosjektstøtte		0000		Tekn.dok - Teknisk dokum - Z - Generelt				
22079	NSD-0000-Z-PL-0021	PNS Nivå 0, 1 og 2 - Nytt Sykehus Drammen	S1 Prosjektstøtte		0000		Byggheres Dokum: Tekn.dok - Teknisk dokum - Z - Generelt				
22080	NSD-0000-Z-PL-0022	PNS U2 - Nivå 1, 2 og 3 - Nytt Sykehus Drammen	S1 Prosjektstøtte		0000		Byggheres Dokum: Tekn.dok - Teknisk dokum - Z - Generelt				
22081	NSD-0000-Z-PL-0023	PNS U3 - Nivå 1, 2 og 3 - Nytt Sykehus Drammen	S1 Prosjektstøtte		0000		Byggheres Dokum: Tekn.dok - Teknisk dokum - Z - Generelt				
22082	NSD-0000-Z-PL-0024	PNS U4 - Nivå 1, 2 og 3 - Nytt Sykehus Drammen	S1 Prosjektstøtte		0000		Byggheres Dokum: Tekn.dok - Teknisk dokum - Z - Generelt				
22083	NSD-0000-Z-PL-0025	PNS U5 - Nivå 1, 2 og 3 - Nytt Sykehus Drammen	S1 Prosjektstøtte		0000		Byggheres Dokum: Tekn.dok - Teknisk dokum - Z - Generelt				
22084	NSD-0000-Z-PL-0026	PNS U6 - Nivå 1, 2 og 3 - Nytt Sykehus Drammen	S1 Prosjektstøtte		0000		Byggheres Dokum: Tekn.dok - Teknisk dokum - Z - Generelt				
22085	NSD-0000-Z-PL-0027	PNS U7 - Nivå 1, 2 og 3 - Nytt Sykehus Drammen	S1 Prosjektstøtte		0000		Byggheres Dokum: Tekn.dok - Teknisk dokum - Z - Generelt				
22086	NSD-0000-Z-PL-0028	PNS Nivå 3, 4, 5 og 6 for alle enterpriser etter råbyggssenterprisene - Nytt Sykehus Dr	S1 Prosjektstøtte		0000		Byggheres Dokum: Tekn.dok - Teknisk dokum - Z - Generelt				
22087	NSD-0000-Z-PL-0029	PNS - Nivå 3, 4 og 5 for enterprise 2102 og 2201 - Nytt Sykehus Drammen	Midteldig 2201	2102,2201	0000		Byggheres Dokum: Tekn.dok - Teknisk dokum - Z - Generelt				

2 Nivå 4 og 5 Bygg/Fløy

Prosjektet er oppdelt etter følgende prinsip i bygg/fløyer:

Behandlingsbygg: (Byggnr 120)

Delt opp i 3 bygg/fløyer:

- Behandlingsbygg Øst byggnr 121, byggbokstav A
- Behandlingsbygg Vest byggnr 122, byggbokstav B
- Glassgaten, byggnr 123

Poliklinikkbygg: (Byggnr 150)

Delt opp i 2 bygg/fløyer:

- Poliklinikk 1, byggnr 151, byggbokstav E
- Poliklinikk 2, byggnr 152, byggbokstav D

Sengebygg: (Byggnr 160)

Delt opp i 2 bygg/fløyer:

- Sengebygg Øst, byggnr 161, byggbokstav A
- Sengebygg Vest, byggnr 162, byggbokstav B

Servicebygg:

Ikke oppdelt, Servicebygg, byggnr 140, byggbokstav C

Psykiatribygg: (Byggnr 130)

Delt opp i 3 bygg/fløyer:

- Psykiatribygg 1 byggnr 131, byggbokstav F
- Psykiatribygg 2 byggnr 132, byggbokstav G
- Psykiatribygg 3 byggnr 133, byggbokstav H

Adkomstbygg:

Ikke oppdelt, Adkomstbygg, byggnr 110, byggbokstav K

(Alle romnr i prosjektet er nummerert etter byggbokstaven for plasseringen)

3 Nivå 6 Plan

Sykehuset har følgende plan:

Behandlingsbygg: (Byggnr 120)

- Behandlingsbygg Øst (A): Plan fra U2 til plan 4, samt takplan.
- Behandlingsbygg Vest (B): Plan fra U2 til plan 4, samt takplan.
- Glassgaten, byggnr 123:

Poliklinikkbygg: (Byggnr 150)

- Poliklinikk 1 (E): Plan fra U2 til plan 4, samt takplan.
- Poliklinikk 2 (D): Plan fra U2 til plan 4, samt takplan.

Sengebygg: (Byggnr 160)

- Sengebygg Øst (A): Plan fra 5 til plan 9, samt takplan.
- Sengebygg Vest (B): Plan fra 5 til plan 10, samt takplan og helikopterdekk.

Servicebygg: (Byggnr 140)

- Servicebygg (C): Plan fra U2 til plan 3, samt takplan.

Psykiatribygg: (Byggnr 130)

- Psykiatribygg 1 (F): Plan fra 1 til plan 4, samt takplan.
- Psykiatribygg 2 (G): Plan fra U2 til plan 4, samt takplan.
- Psykiatribygg 3 (H): Plan fra 1 til plan 3, samt takplan.

Adkomstbygg: (Byggnr 110)

- Adkomstbygg (K): Plan fra U2 til plan 6, samt takplan.

4 Nivå 7 Kontrollområder

Det er definert kontrollområder for følgende faser:

Fase 1: Grunnarbeider og råbygg

Fase 2: Fasader

Fase 3: Innvendige arbeider og teknikk (benyttes også til utstyr og testplan)

4.1 Fase 1 - Grunnarbeider og råbygg

Grunnarbeider og råbygg har pr dd brukt egen PNS på kjeller (gjelder 2102 og 2201)

I fase 1 kjøres 2 og 2 kontrollområder på samme tid. (gjelder 2301 og 2302)

4.2 Fase 2: Fasader

Kontrollområdene i fase 2 er tilpasset 500m2 for at monteringen av elementene kan planlegges og monteres pr uker.

ID for av kontrollområder i fase 2:

- IDen er bygget opp av byggnr og aksenummereringen. For kontrollområder øst/vest gjelder følgende:
1.tegn er byggbokstav, 2. er langs akse og 3 og 4. er fra akse 5 og 6 er til akse.
For eksempel DA0105.
- For kontrollområder nord/sør gjelder følgende:
1.tegn er byggbokstav, 2. og 3.er langs akse, 4. er fra akse 5 er til akse.
For eksempel SOM26

4.3 Fase 3: Innvendige arbeider og teknikk

Det etterfølgende viser oppdeling i kontrollområder for Fase 3, Innvendige arbeider og teknikk:

Behandlingsbygg: (Byggnr 120)

- Behandlingsbygg Øst (A): 4 kontrollområder pr. etg., samt 4 vertikale områder (Sjakter/tekn.rom.)
U1 og U2 er inndelt i 3 kontrollområder pr. etg.

- Behandlingsbygg Vest (B): 4 kontrollområder pr. etg., samt 4 vertikale områder (Sjakter/tekn.rom.)
U1 og U2 er inndelt i 3 kontrollområder pr. etg.
- Glassgaten, byggnr 123:

Poliklinikkbygg: (Byggnr 150)

- Poliklinikk 1, (E): 3 kontrollområder pr. etg., samt 3 vertikale områder (Sjakter/tekn.rom.)
U1 og U2 inngår i (A)
- Poliklinikk 2, (D): 3 kontrollområder pr. etg., samt 3 vertikale områder (Sjakter/tekn.rom.)
U1 og U2 inngår i (B)

Sengebygg: (Byggnr 160)

- Sengebygg Øst (A): 3 kontrollområder pr. etg., samt 3 vertikale områder (Sjakter/tekn.rom.)
- Sengebygg Vest (B): 3 kontrollområder pr. etg., samt 3 vertikale områder (Sjakter/tekn.rom.)
- Servicebygg:(byggnr 140)
- Servicebygg (C): 2 kontrollområder pr. etg., samt 2 vertikale områder (Sjakter/tekn.rom.)
U1 og U2: 1 kontrollområde pr. etg.

Psykatribygg: (Byggnr 130)

- Psykiatribygg 1 (F): Utarbeides av totalentreprenør.
- Psykiatribygg 2 (G): Utarbeides av totalentreprenør.
U1 og U2: 1 kontrollområde pr. etg.
- Psykiatribygg 3 (H): Utarbeides av totalentreprenør.

Adkomstbygg: (Byggnr 110)

- Adkomstbygg, (K): Utarbeides av totalentreprenør.
U1 og U2: 1 kontrollområde pr. etg.

4.4 ID for av kontrollområder i fase 3:

- IDen er bygget opp av 5 tegn. For de «vanlige» togene gjelder følgende:
1.tegn er byggbokstav, 2. og 3. er etasjeplan og 4. og 5. er løpenr. For eksempel A0102.
- For de «vertikale» togene gjelder følgende:
1.tegn er byggbokstav, 2. og 3. er etasjeplan de går mellom, 4. for «Tekniske rom og sjakter» og 5. er løpenr. For eksempel A01T2
- Størrelse og inndeling av kontrollsonene er vurdert ut ifra 5 hovedparametere:
Arealstørrelse, funksjonsområder, sjaktplasseringer, dekningsområde for EI-tavler og dekningsområde for ventilasjon.

- Oppstarten for «togene» i kontrollområdene er avhengig av Tett hus, og metode for fasademontering kommer til å styre i hvilket plan vi starter. Det ideelle er å starte ovenfra og bygge seg nedover, slik at vi hele tiden rydder oss ut fra rød sone.
- Starter samtidig med ett vanlig tog, og ett vertikalt tog, slik at i neste plan er sjakter og tekniske rom klargjort når togene starter.

4.5 Prinsipper:

- Første kontrollområde tar med seg stender og innervegg mot eget kontrollområde, mens neste tar lukking av vegg.
- Trapper og heiser får egen fremdrift.
- Glassgaten blir utarbeidet senere.
- Det kjøres ett «grunntog» gjennom bygget først, og det utarbeides spesialvogner for renrom og rom med blyinnfatning o.l.
- Arbeidsgrunnlag følger 14-0 prinsippet med utgangspunkt i oppstart kontrollområde for alle fag i fase 3.

5 Vedlegg

Vedlegg 1: Prosjektnedbrytningsstruktur


Vedlegg 2: Kontrollområder

PNS nytt sykehus i Drammen (NSD) - Nivå 0,1 og 2

Nivå 0:
Prosjekt

Nivå 1:
Ansvarsområder

Nivå 2:
Delområder/
kontraktsområder

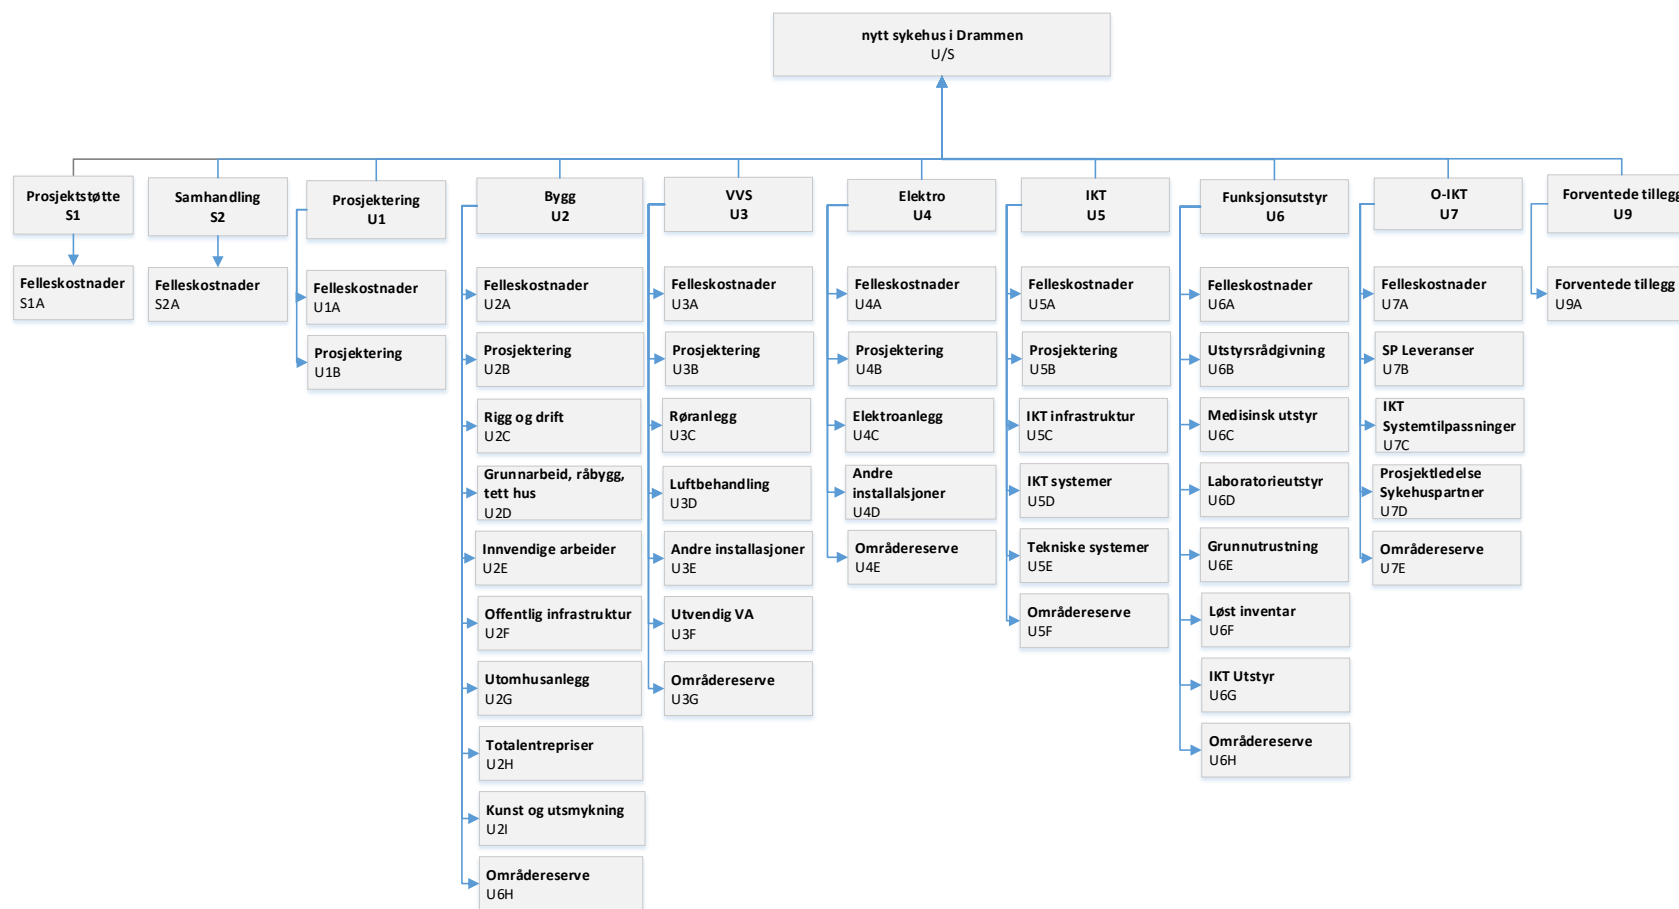

Nytt sykehus i Drammen

Dokumentnr.: NSD-0000-Z-PL-0030

Tittel: Bilag E5 - Prosjektnedbrytningsstruktur (PNS) og Kontrollområder

Revisjon: 02

Dato: 02.06.20

Side: 9 av 34

PNS nytt sykehus i Drammen (NSD) – U2 - Nivå 1, 2 og 3




NSD-0000-Z-PL-0022

Rev. 01 Dato: 04.05.20


PNS nytt sykehus i Drammen (NSD) – U3 - Nivå 1, 2 og 3



PNS nytt sykehus i Drammen (NSD) – U4 - Nivå 1, 2 og 3

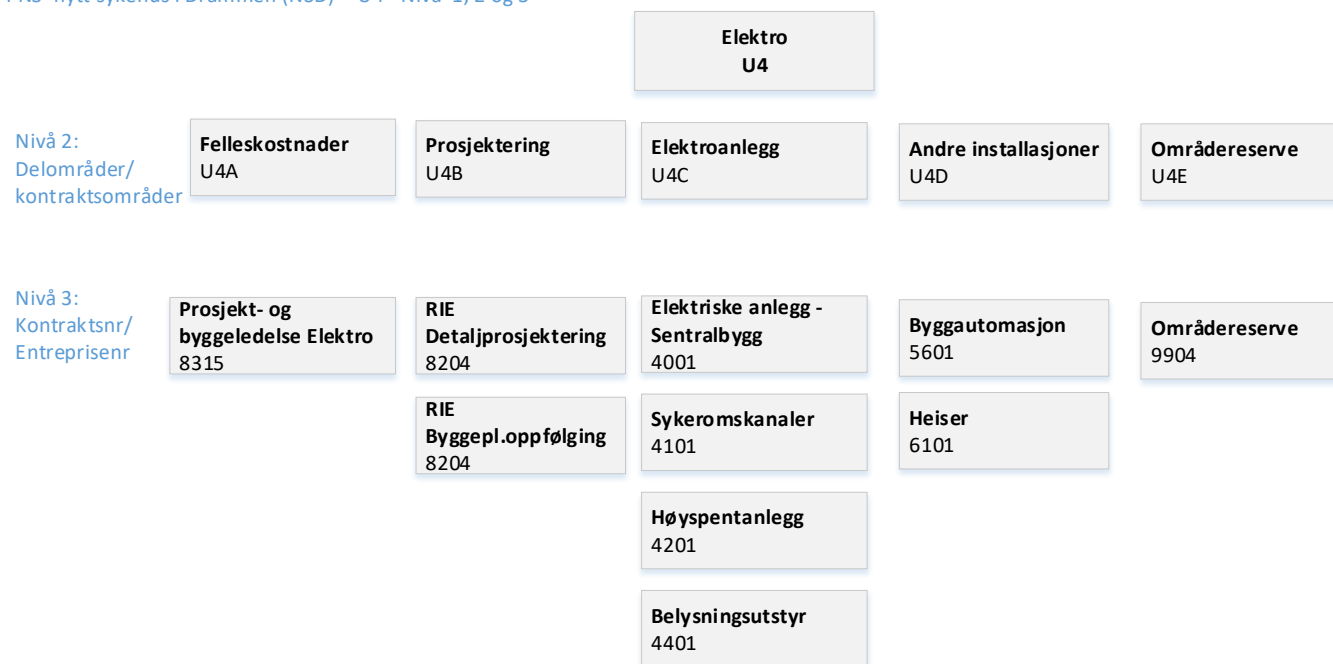

PNS nytt sykehus i Drammen (NSD) – U5 - Nivå 1, 2 og 3

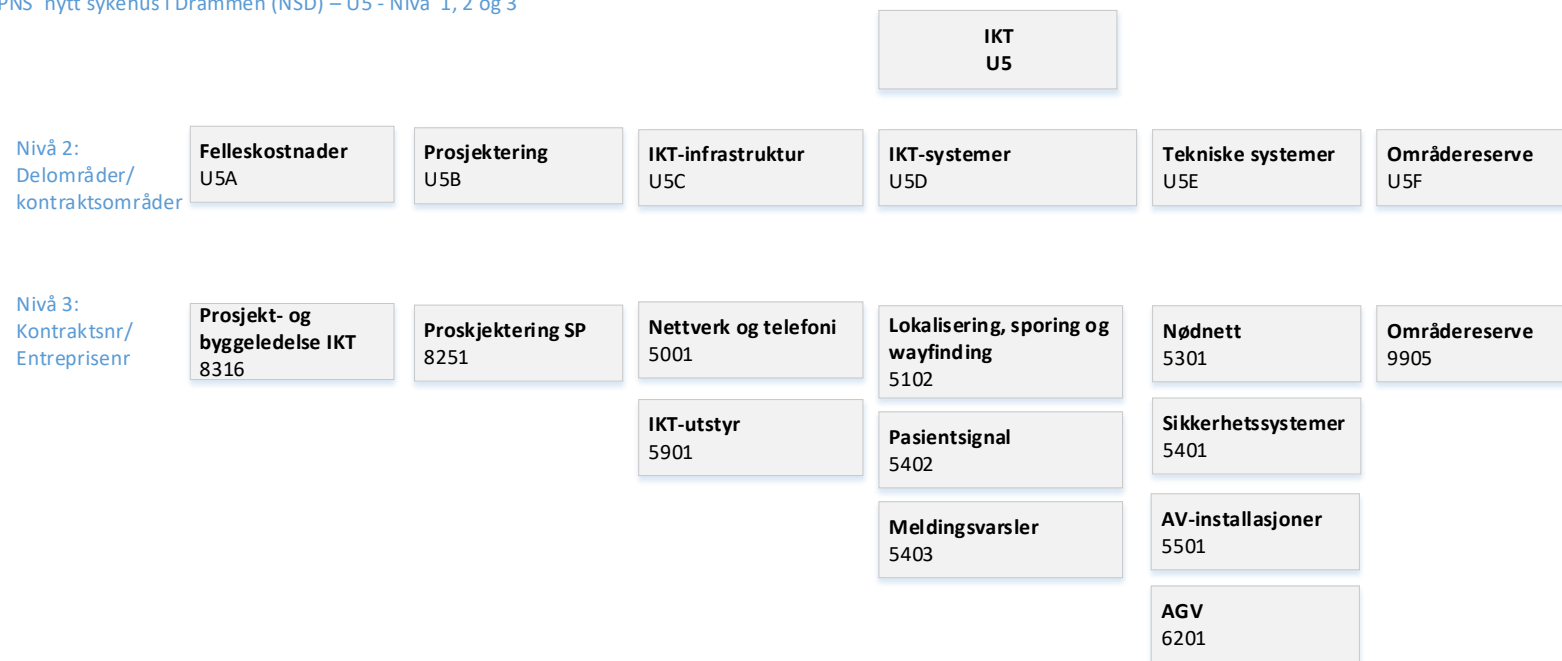

PNS nytt sykehus i Drammen (NSD) – U6 - Nivå 2, 3 og 4


Nivå 2:
Delområder/
kontraktsområder

FUNKSJONSUTSTYR U6									
Felleskostnader U6A	Prosjektering U6B	Bilddiagnostikk U6C	Laboratrieutstyr U6D	Samleutstyr labutstyr U6E	Terapi og diagnostikk U6F	Grunnutrustning U6G	Løst utstyr U6H	IKT-utstyr U6I	Områdereserve U6J

Nivå 3:
Kontraktsnr/
Entreprenør


Prosjekt- og byggeledelse Utstyr 8308	Utstyrådgiver 9001	MR 9100	Obduksjonsutstyr 9200	Fastmontert utstyr til operasjon og intensiv 9400	Spesialutstyr nevrologi / nevrofys. 9520	Elektroniske tøyskap 9600	Møbler 9800	IKT-utstyr 9890	Områdereserve 9906
		Stråleterapi 9110	Sikkeretskabinetter 9210	Bildestyring (MIT) 9410	Spesialutstyr urologi 9530	Vaske- og steriliseringsutstyr 9610	Medisinske møbler 9810		
		CT 9130	Analysehall 9220	Pasientovervåking og telemetri 9420	Spesialutstyr lunge 9540	Kjøkkenutstyr 9620			
		Dental-/kjeveøntgen 9140	Automasjon bakteriologi 9230	Diatermi og laser 9430	Spesialutstyr obstetikk 9550	Senge- og vognvask 9630			
		Angio/intervensjon 9150	Spesialutstyr biokjemi 9240	Anestesi / respirasjon 9440	Spesialutstyr ØNH / odontologi 9560	Pasientløftere 9650			
		Digital radiografi 9160	Kromatografi 9250	Neonatalutstyr 9450	Spesialutstyr øye 9570	Renholdsutstyr 9660			
		Samlepakke bilddiagn. utstyr 9190	Spesialutstyr blodbank 9260	Samlepakke operasjon / anestesi 9490	Defibrillatorer 9580	Transport- og logistikkutstyr 9670			
			Spesialutstyr mikrobiologi 9270		Samlepakke terapi og diagnostikk 9590	Kjøle- og fryseutstyr 9680			
			Spesialutstyr patologi 9280			Sykehussenger 9710			
			Spesialutstyr genteknologi 9310			Samlepakke grunnutrustning 9690			
			Varmeskap og inkubatorer 9320						
			Laboratorie- og prepareringsutstyr 9340						
			Samleutstyr labutstyr 9290						

PNS nytt sykehus i Drammen (NSD) – U7 - Nivå 2, 3 og 4

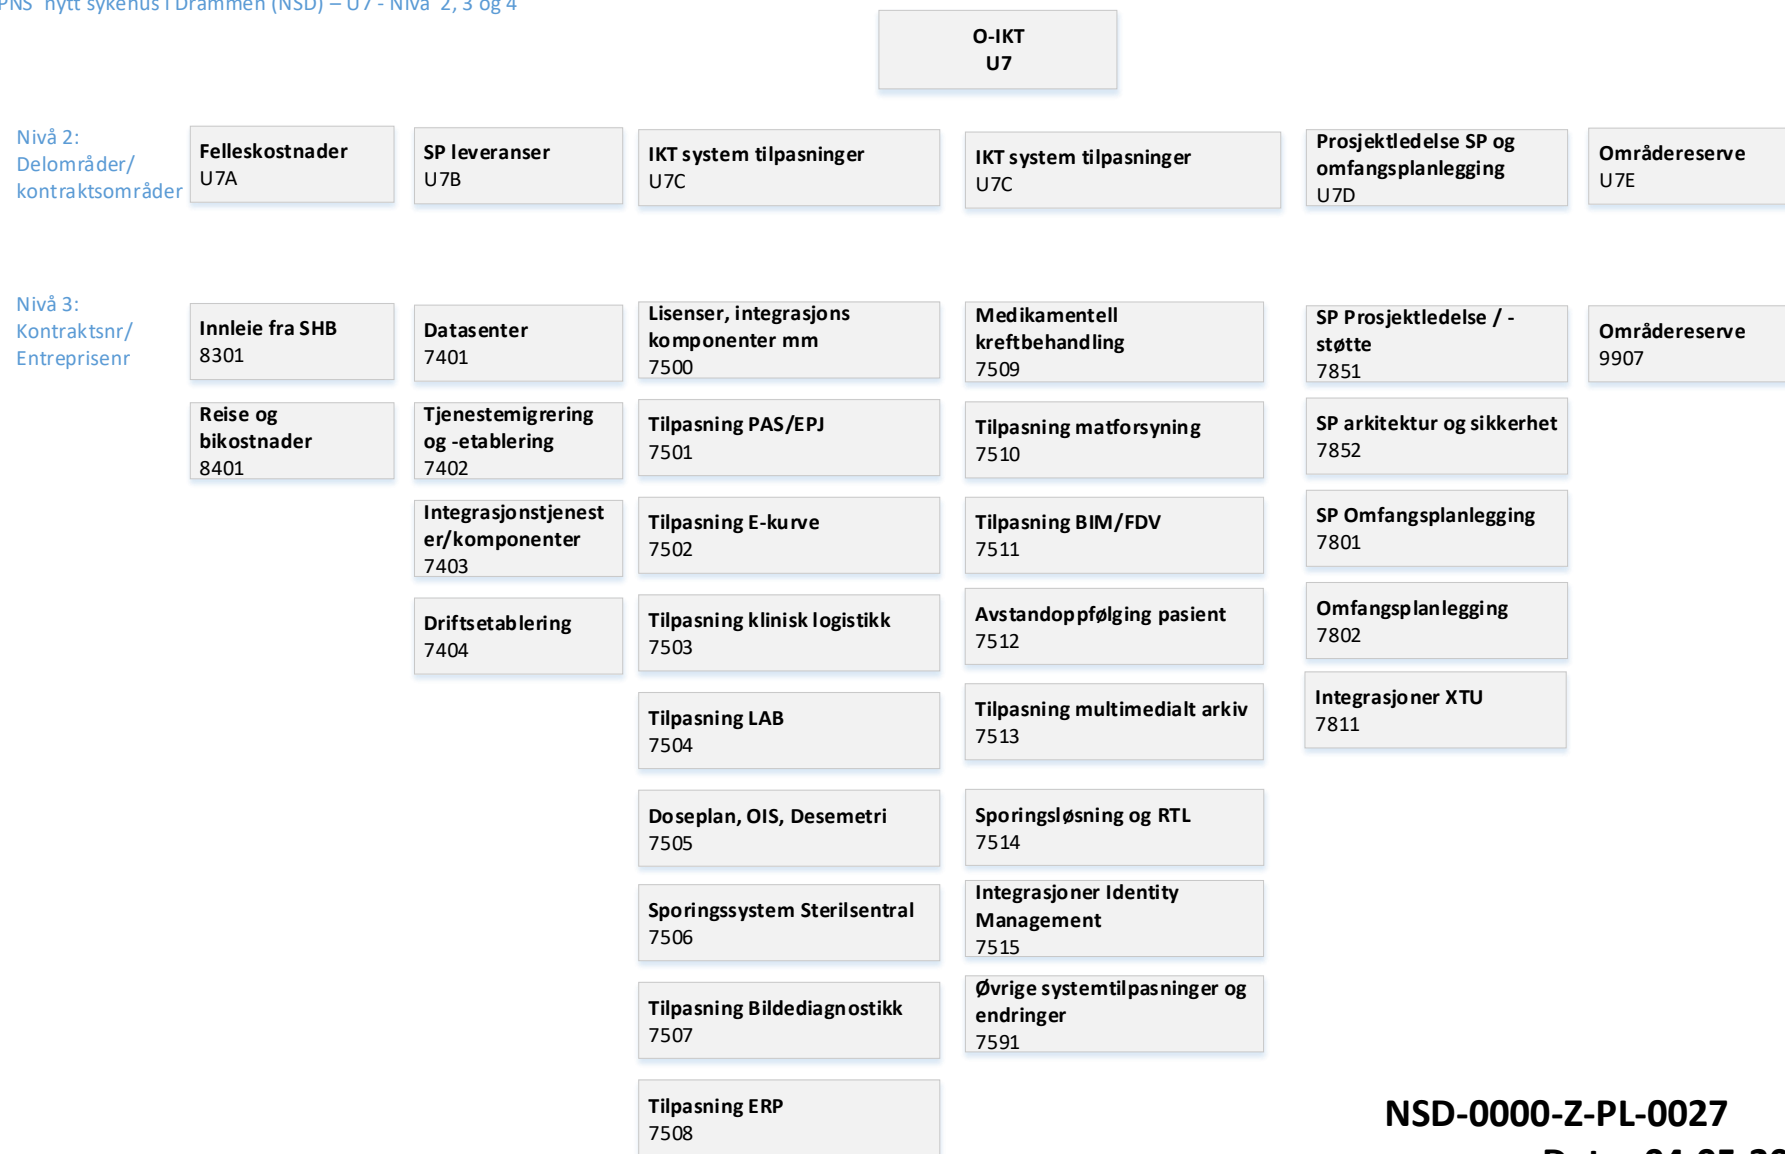

NSD-0000-Z-PL-0027

Rev. 01 Dato: 04.05.20

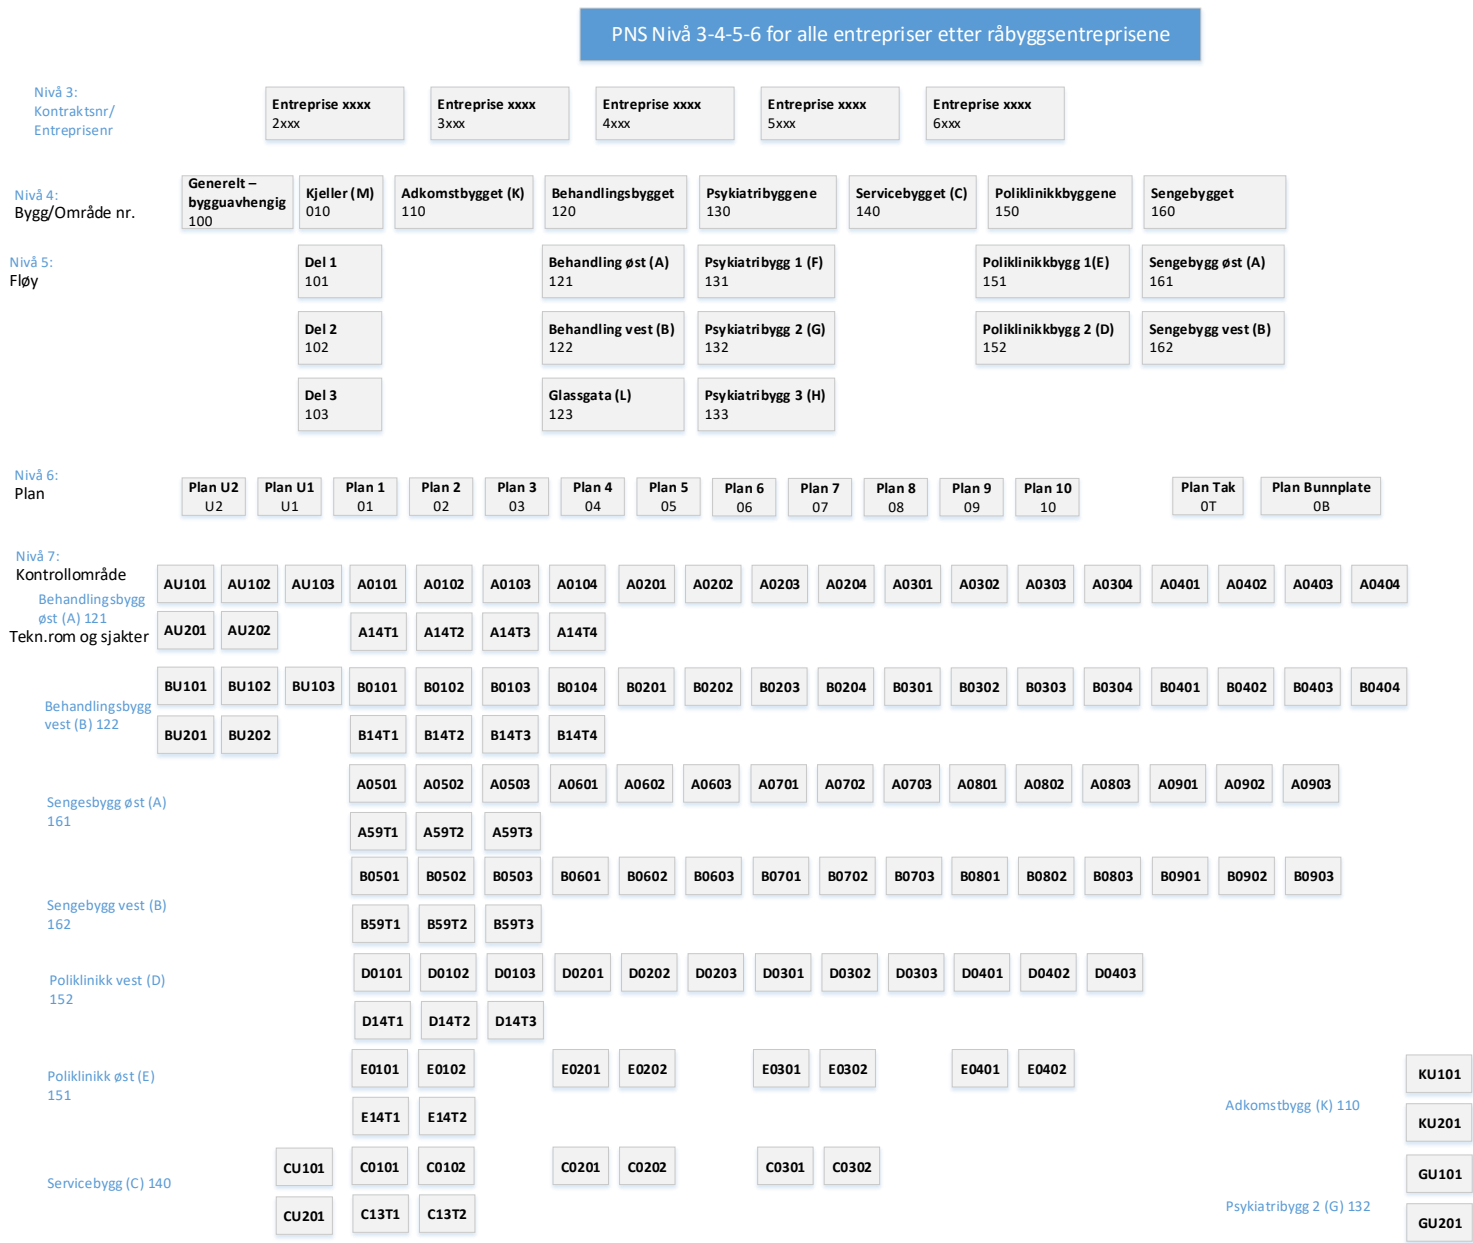

PNS Nivå 3-4-5 for entreprise 2102

Nivå 3:
Kontraktsnr/
Entreprisenr

**Generelt –
kontraktsuavhengig**
0000

**Sikringskonstruksjoner og
graving**
2102

**Betong og pelearbeider
for kjeller**
2201

Nivå 4:
Bygg/Område nr.

**Generelt –
byggavhengig**
100

Kjeller
010

Nivå 5:
Del

Del 1

Del 2

Del 3

Fasader – Kontrollområder fase 2.

Nummer	Bygg	nr		bokstav	etg	type
BX0104	Behandlingsbygg Vest	122	Nord	B	1-4	Tung base - Tegl
BX0407	Behandlingsbygg Vest	122	Nord	B	1-4	Tung base - Tegl
BY0709	Behandlingsbygg Vest	122	Nord	B	1-10	metallplater - kassetter
BX0913	Behandlingsbygg Vest	122	Nord	B	1-4	Tung base - Tegl
AX1318	Behandlingsbygg Øst	121	Nord	A	1-4	Tung base - Tegl
AY1820	Behandlingsbygg Øst	121	Nord	A	1-9	metallplater - kassetter
AX2023	Behandlingsbygg Øst	121	Nord	A	1-4	Tung base - Tegl
AX2328	Behandlingsbygg Øst	121	Nord	A	1-4	Tung base - Tegl
AXS28	Behandlingsbygg Øst	121	Øst	A	1-4	Tung base - Tegl
ASP28	Behandlingsbygg Øst	121	Øst	A	1-4	Tung base - Tegl
APM28	Behandlingsbygg Øst	121	Øst	A	1-4	Tung base - Tegl
BXS01	Behandlingsbygg Øst	122	Vest	A	1-4	Tung base - Tegl
BSP01	Behandlingsbygg Øst	122	Vest	A	1-4	Tung base - Tegl
BPM01	Behandlingsbygg Øst	122	Vest	A	1-4	Tung base - Tegl
ASO23	Behandlingsbygg Øst	121	Atrium1 Ø	A	1-4	Lyse Plater
AS2023	Behandlingsbygg Øst	121	Atrium1 N	A	1-4	Lyse Plater
AO2023	Behandlingsbygg Øst	121	Atrium1 S	A	1-4	Lyse Plater
ASO20	Behandlingsbygg Øst	121	Atrium1 V	A	1-4	Lyse Plater
ASP16	Behandlingsbygg Øst	121	Atrium2 Ø	A	1-4	Lyse Plater
AS1116	Behandlingsbygg Øst/Vest	121/22	Atrium2 N	A-B	1-4	Lyse Plater
AP1116	Behandlingsbygg Øst/Vest	121/22	Atrium2 S	A-B	1-4	Lyse Plater
BSP11	Behandlingsbygg Vest	122	Atrium2 V	B	1-4	Lyse Plater
BSO07	Behandlingsbygg Vest	122	Atrium3 Ø	B	1-4	Lyse Plater
BS0407	Behandlingsbygg Vest	122	Atrium3 N	B	1-4	Lyse Plater
BO0407	Behandlingsbygg Vest	122	Atrium3 S	B	1-4	Lyse Plater

Fasader – Kontrollområder fase 2.

Nummer	Bygg	nr		bokstav	etg	type
BSO04	Behandlingsbygg Vest	122	Atrium3 V	B	1-4	Lyse Plater
BM0109	Behandlingsbygg Vest	122	Sør	B		
AM0918	Behandlingsbygg Øst/Vest	121/22	Sør	A-B		
AM1828	Behandlingsbygg Øst	121	Sør	A		
EKG18	Poliklinikk 1	151	Vest	E	1-4	Tung base - Tegl
EGD18	Poliklinikk 1	151	Vest	E	1-3	Tung base - Tegl
EDA18	Poliklinikk 1	151	Vest	E	1-3	Tung base - Tegl
EKG28	Poliklinikk 1	151	Øst	E	1-4	Tung base - Tegl
EGD28	Poliklinikk 1	151	Øst	E	1-3	Tung base - Tegl
EDA28	Poliklinikk 1	151	Øst	E	1-3	Tung base - Tegl
EA1822	Poliklinikk 1	151	Sør	E	1-3	Tung base - Tegl
EA2226	Poliklinikk 1	151	Sør	E	1-3	Tung base - Tegl
EC2025	Poliklinikk 1	151	Atrium S	E	1-3	Lyse Plater
EI2025	Poliklinikk 1	151	Atrium N	E	1-4	Lyse Plater
EIF20	Poliklinikk 1	151	Atrium V	E	1-4	Lyse Plater
EFC20	Poliklinikk 1	151	Atrium V	E	1-3	Lyse Plater
EIF25	Poliklinikk 1	151	Atrium Ø	E	1-4	Lyse Plater
EFC25	Poliklinikk 1	151	Atrium Ø	E	1-4	Lyse Plater
EK1828	Poliklinikk 1	151	Nord			
	Poliklinikk 1	151	Tak	E	Tekn	Sandwichelementer 2 vegger
	Poliklinikk 1	151	Tak	E	Tekn	innramming tekniske føringer
DKG01	Poliklinikk 2	152	Vest	D	1-4	Tung base - Tegl
DGD01	Poliklinikk 2	152	Vest	D	1-3	Tung base - Tegl

Fasader – Kontrollområder fase 2.

Nummer	Bygg	nr		bokstav	etg	type
DDA01	Poliklinikk 2	152	Vest	D	1-3	Tung base - Tegl
DKG09	Poliklinikk 2	152	Øst	D	1-3	Tung base - Tegl
DGD09	Poliklinikk 2	152	Øst	D	1-3	Tung base - Tegl
DDA09	Poliklinikk 2	152	Øst	D	1-3	Tung base - Tegl
DA0105	Poliklinikk 2	152	Sør	D	1-3	Tung base - Tegl
DA0509	Poliklinikk 2	152	Sør	D	1-3	Tung base - Tegl
DC0407	Poliklinikk 2	152	Atrium S	D	1-3	Lyse Plater
DI0407	Poliklinikk 2	152	Atrium N	D	1-4	Lyse Plater
DIF04	Poliklinikk 2	152	Atrium V	D	1-4	Lyse Plater
DIF07	Poliklinikk 2	152	Atrium Ø	D	1-4	Lyse Plater
DFC04	Poliklinikk 2	152	Atrium V	D	1-4	Lyse Plater
DFC07	Poliklinikk 2	152	Atrium Ø	D	1-3	Lyse Plater
DK0109	Poliklinikk 2	152	Nord	D		
	Poliklinikk 2	152	Tak	D	Tekn	Sandwichelementer 2 vegger
	Poliklinikk 2	152	Tak	D	Tekn	innramming tekniske føringer
CA0105	Servicebygg	140	Sør	C	1-2	Tung base - Tegl
CA0710	Servicebygg	140	Sør	C	1-2	Tung base - Tegl
CD0105	Servicebygg	140	Nord	C	1-2	Tung base - Tegl
CD0710	Servicebygg	140	Nord	C	1-2	Tung base - Tegl
CAD01	Servicebygg	140	Vest	C	1-2	Tung base - Tegl
CAD10	Servicebygg	140	Øst	C	1-2	Tung base - Tegl
	Servicebygg	140	tak	C	Tekn	Sandwichelementer


Fasader – Kontrollområder fase 2.

Nummer	Bygg	nr		bokstav	etg	type
SOM02	Sengebygg	162	Øst	B	5-	metallplater - kassetter
SO0205	Sengebygg	162	Nord	B		metallplater - kassetter
SO0507	Sengebygg	162	Nord	B		metallplater - kassetter
SM0205	Sengebygg	162	Sør	B		metallplater - kassetter
SM0507	Sengebygg	162	Sør	B		metallplater - kassetter
SMI07	Sengebygg	162	Øst	B	5-	metallplater - kassetter
SIF07	Sengebygg	162	Øst	B		metallplater - kassetter
SF0709	Sengebygg	162	Sør	B		metallplater - kassetter
SMI09	Sengebygg	162	Vest	B		metallplater - kassetter
SIF09	Sengebygg	162	Vest	B		metallplater - kassetter
SYT07	Sengebygg	162	Øst	B	5-	metallplater - kassetter
STQ07	Sengebygg	162	Øst	B		metallplater - kassetter
SQO07	Sengebygg	162	Øst	B		metallplater - kassetter
SY0709	Sengebygg	162	Nord	B		metallplater - kassetter
SYT09	Sengebygg	162	Vest	B		metallplater - kassetter
STP09	Sengebygg	162	Vest	B		metallplater - kassetter
SP0913	Sengebygg	162	Nord	B		metallplater - kassetter
SM1013	Sengebygg	162	Sør	B		metallplater - kassetter
SP1318	Sengebygg	161	Nord	A		metallplater - kassetter
SM1317	Sengebygg	161	Sør	A		metallplater - kassetter
SOM26	Sengebygg	161	Øst	A	5-8	metallplater - kassetter


Fasader – Kontrollområder fase 2.

Nummer	Bygg	nr		bokstav	etg	type
SO2022	Sengebygg	161	Nord	A	5-8	metallplater - kassetter
SO2226	Sengebygg	161	Nord	A	5-8	metallplater - kassetter
SM2023	Sengebygg	161	Sør	A	4-8	metallplater - kassetter
SM2326	Sengebygg	161	Sør	A	4-8	metallplater - kassetter
SMI20	Sengebygg	161	Øst	A	5-	metallplater - kassetter
SIF20	Sengebygg	161	Øst	A		metallplater - kassetter
SF1820	Sengebygg	161	Sør	A		metallplater - kassetter
SMI18	Sengebygg	161	Vest	A		metallplater - kassetter
SIF18	Sengebygg	161	Vest	A		metallplater - kassetter
SYT18	Sengebygg	161	Øst	A	5-8	metallplater - kassetter
STP18	Sengebygg	161	Øst	A	5-8	metallplater - kassetter
SY1820	Sengebygg	161	Nord	A	1-8	metallplater - kassetter
SYT20	Sengebygg	161	Vest	A	5-8	metallplater - kassetter
STP20	Sengebygg	161	Vest	A	5-8	metallplater - kassetter


Plan U2 – kontrollområder Fase 3

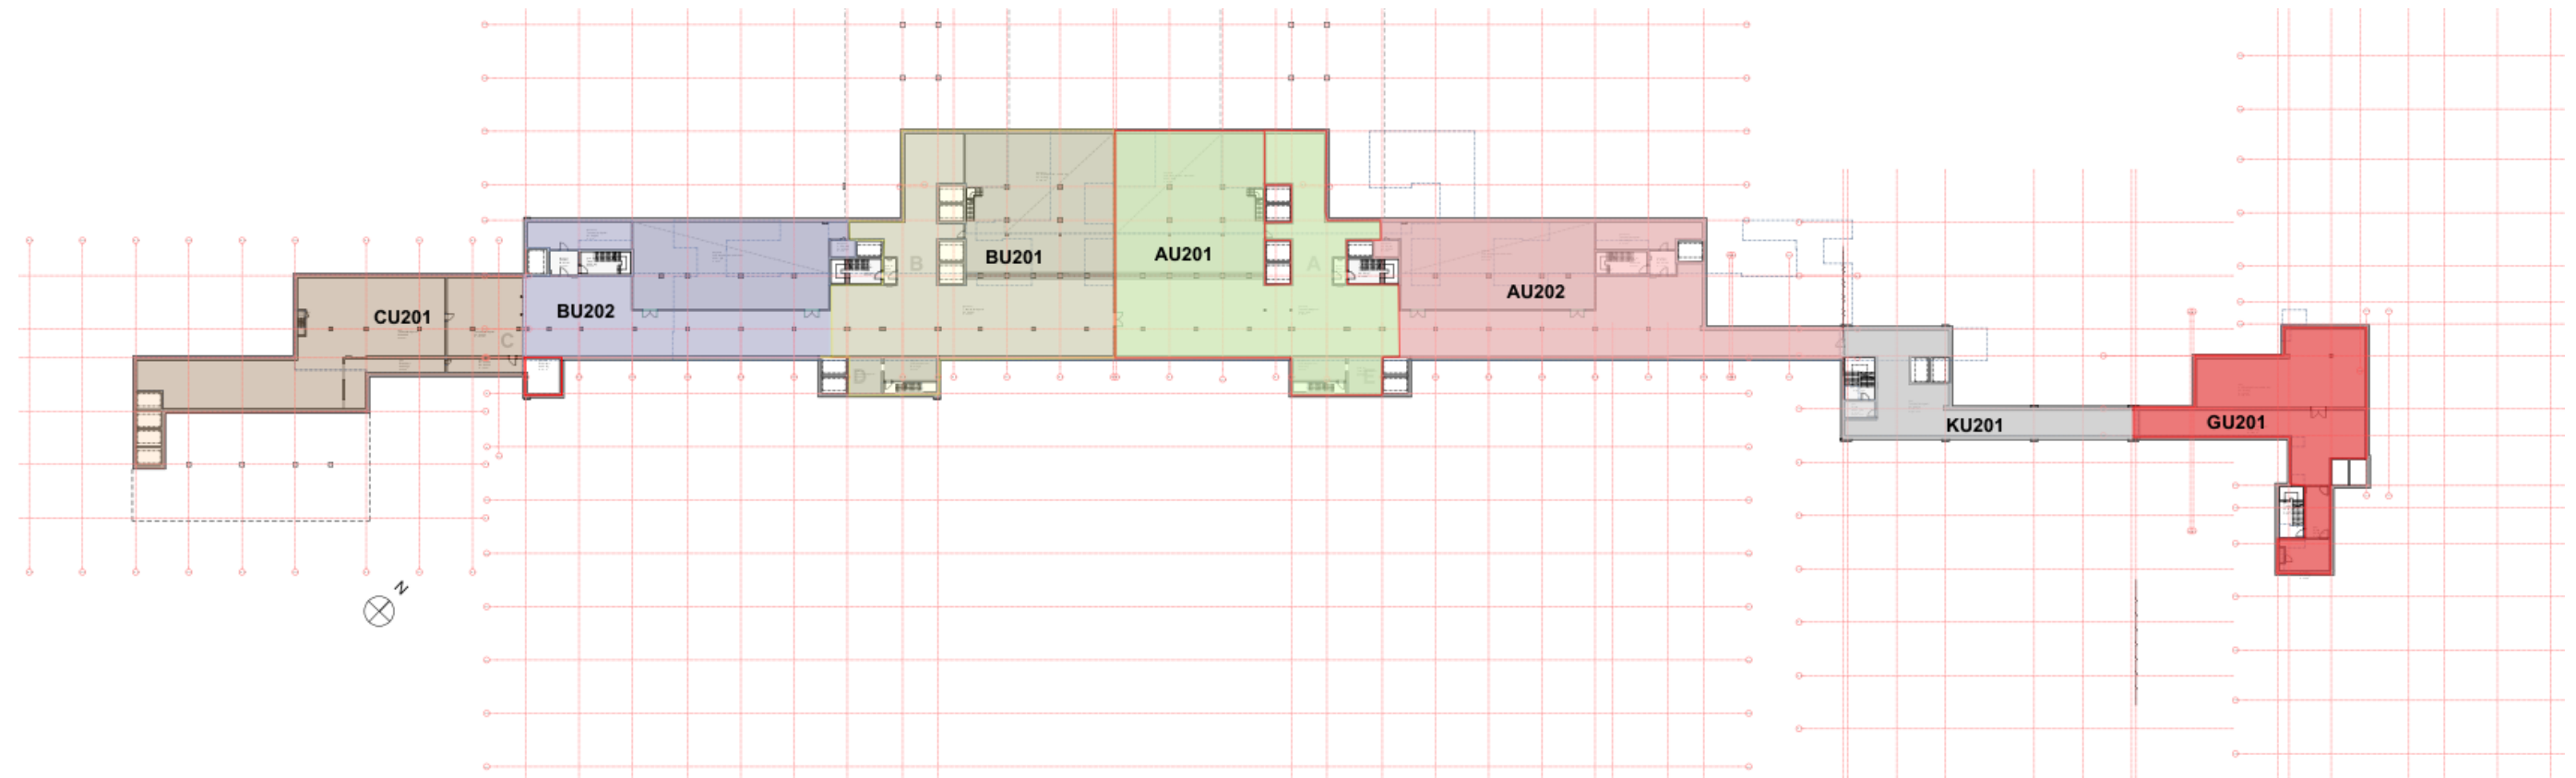

Plan U1 – kontrollområder Fase 3

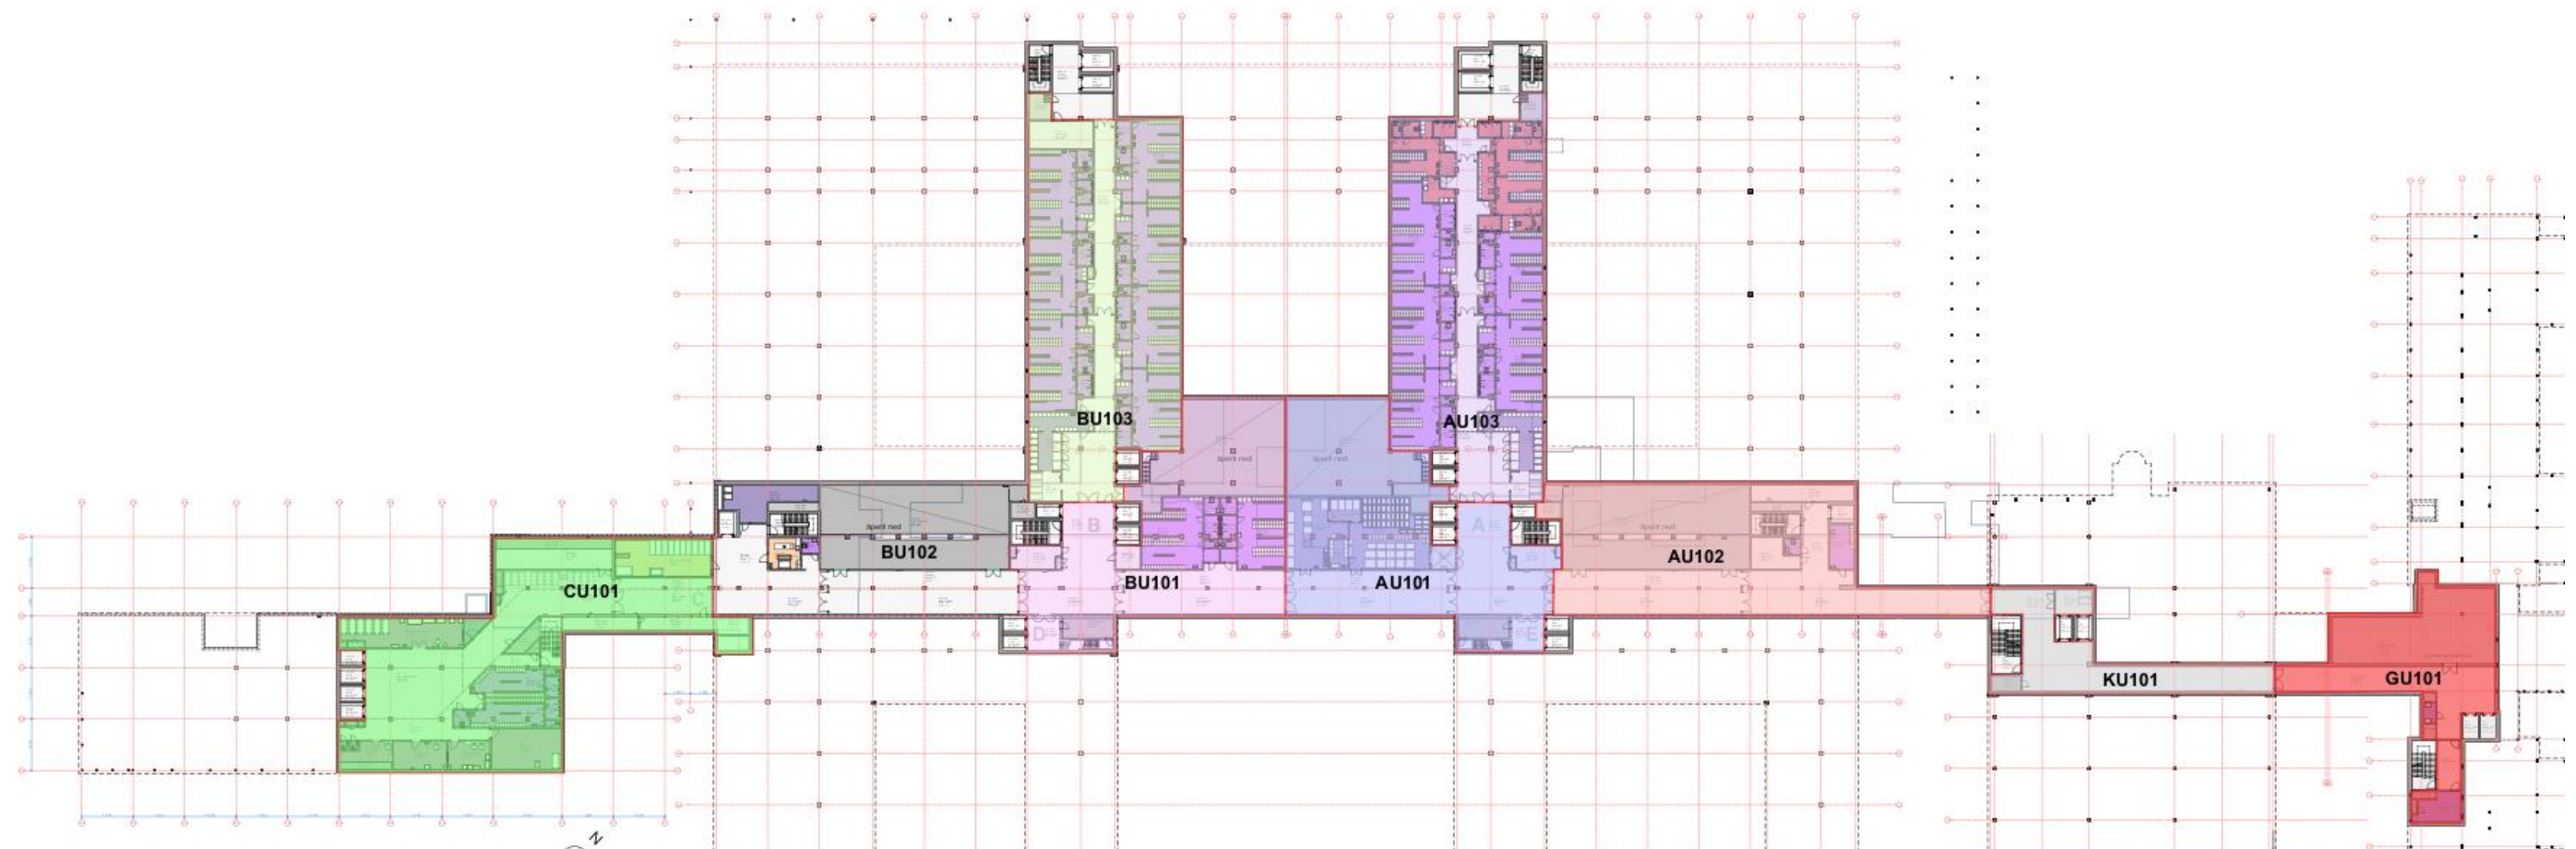


Plan 01 - kontrollområder Fase 3

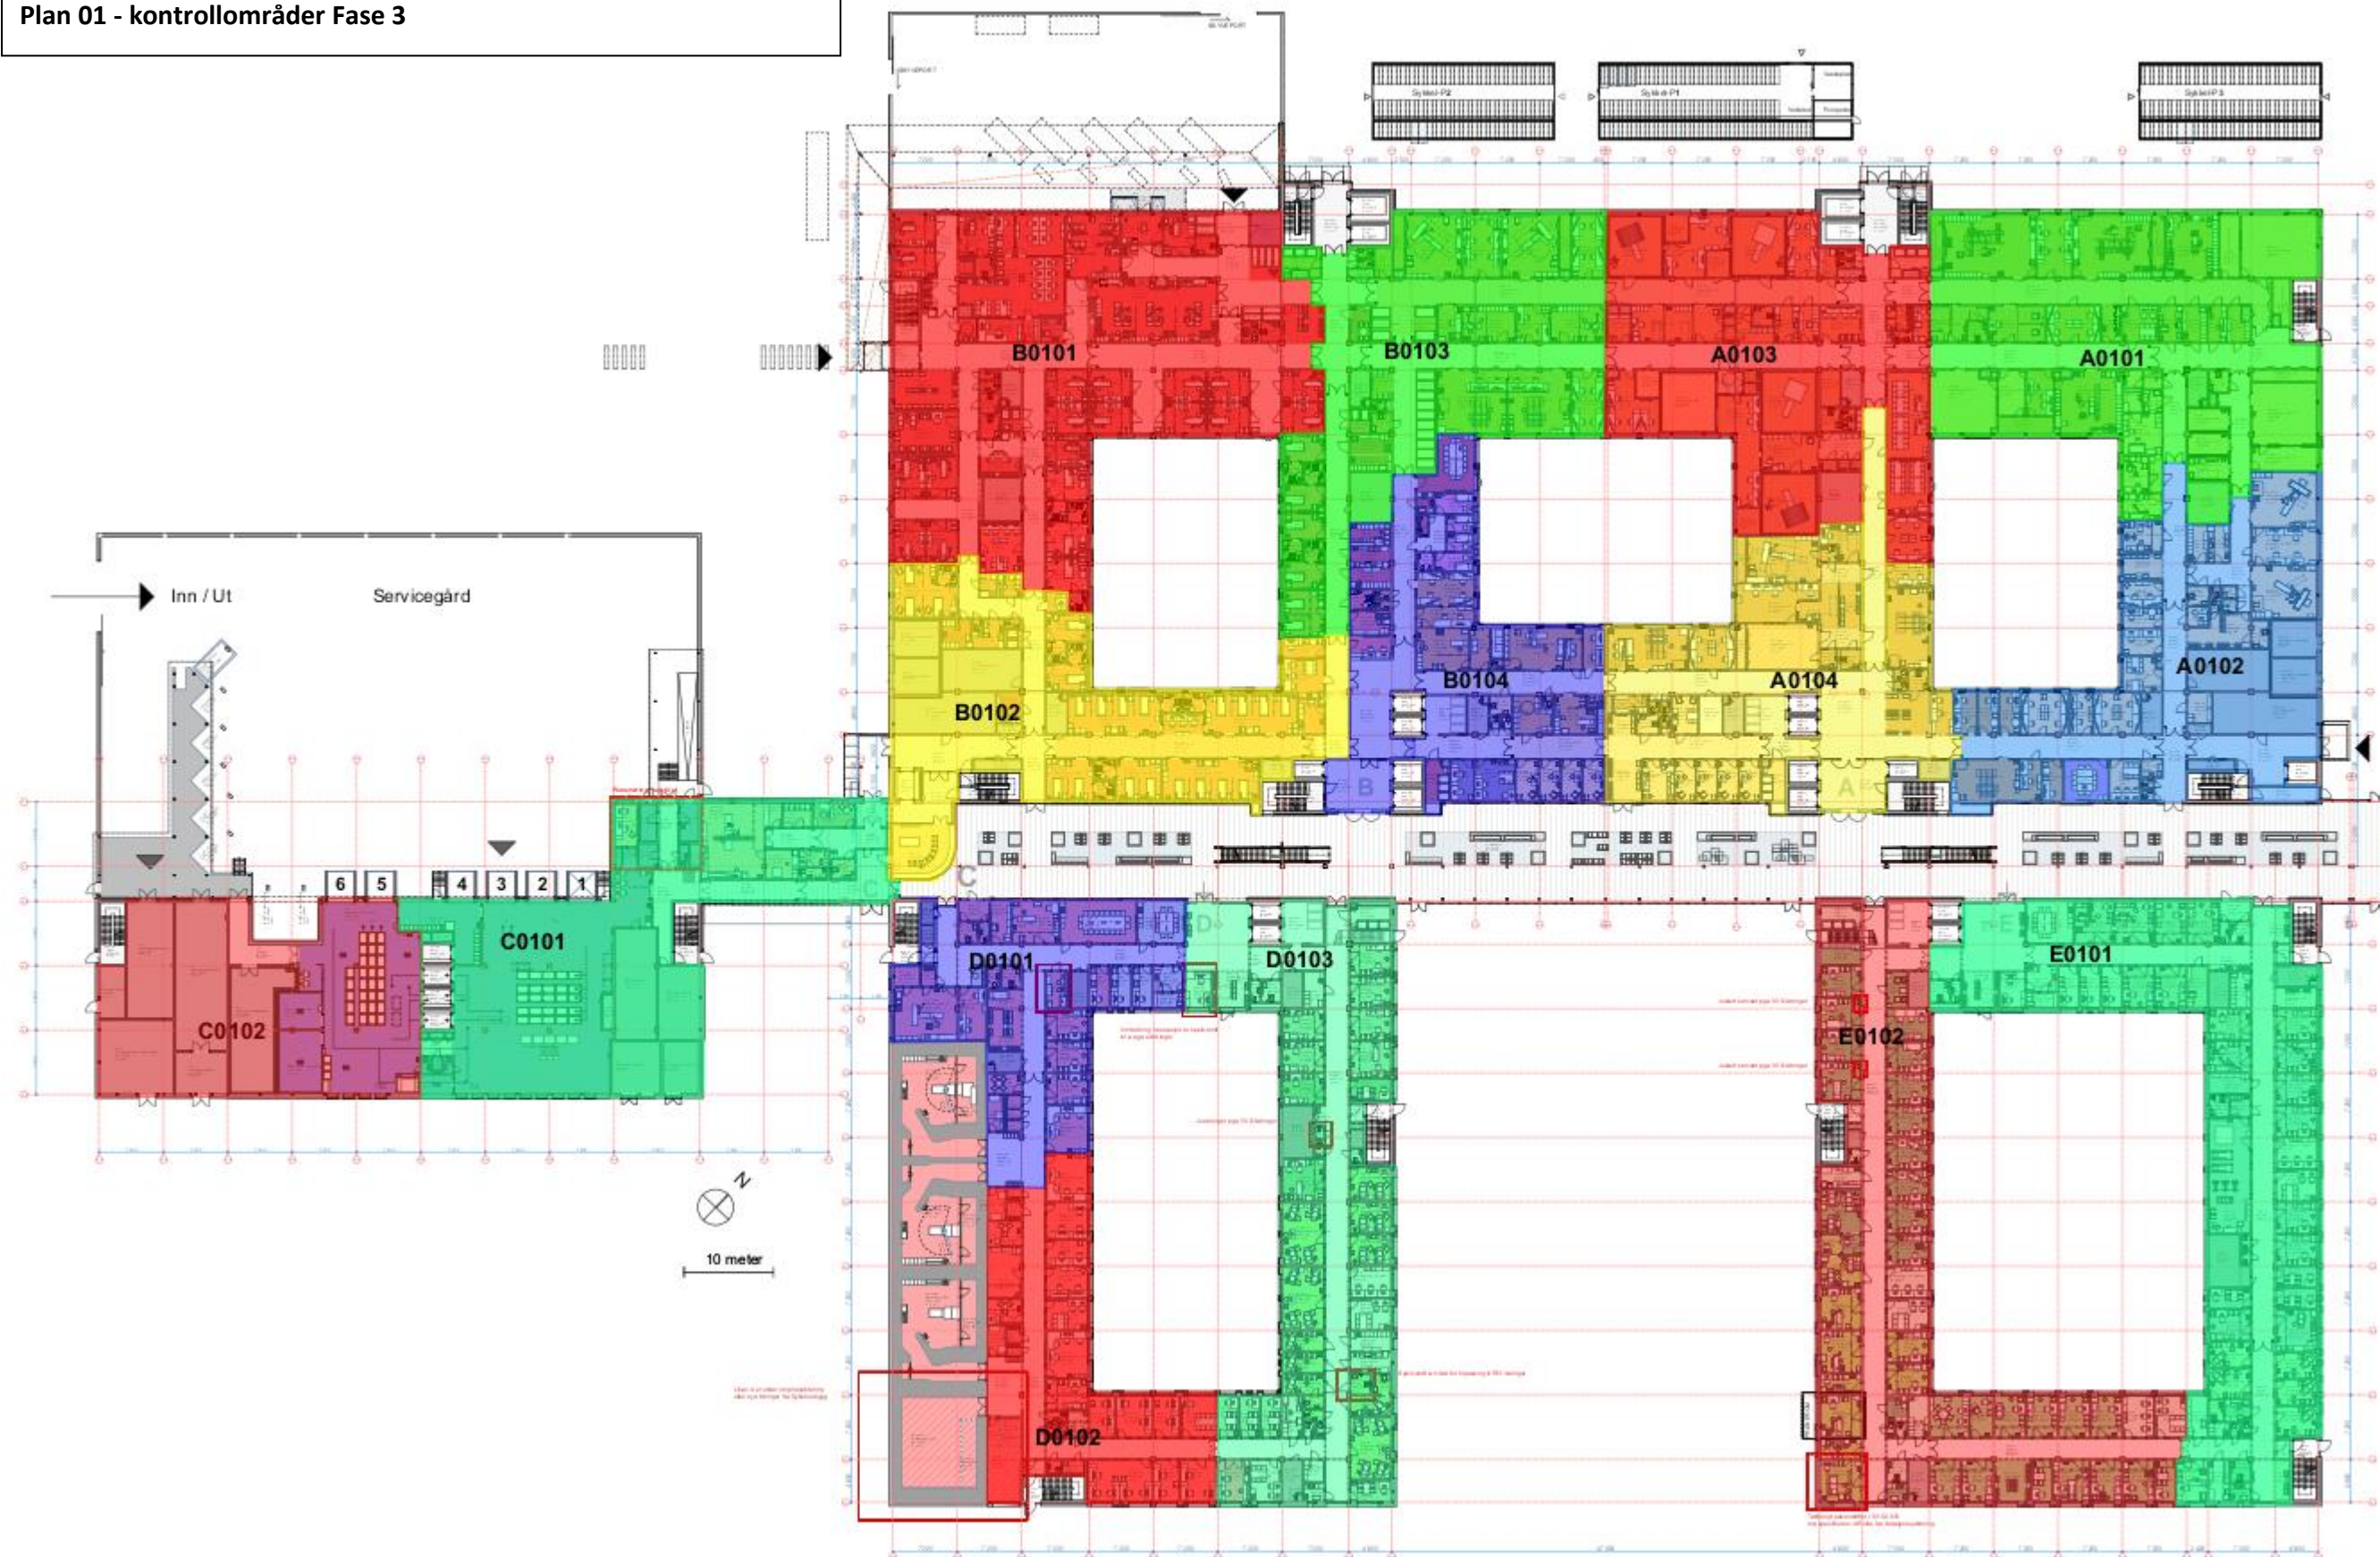


Plan 02 - kontrollområder Fase 3




Plan 03 - kontrollområder Fase 3

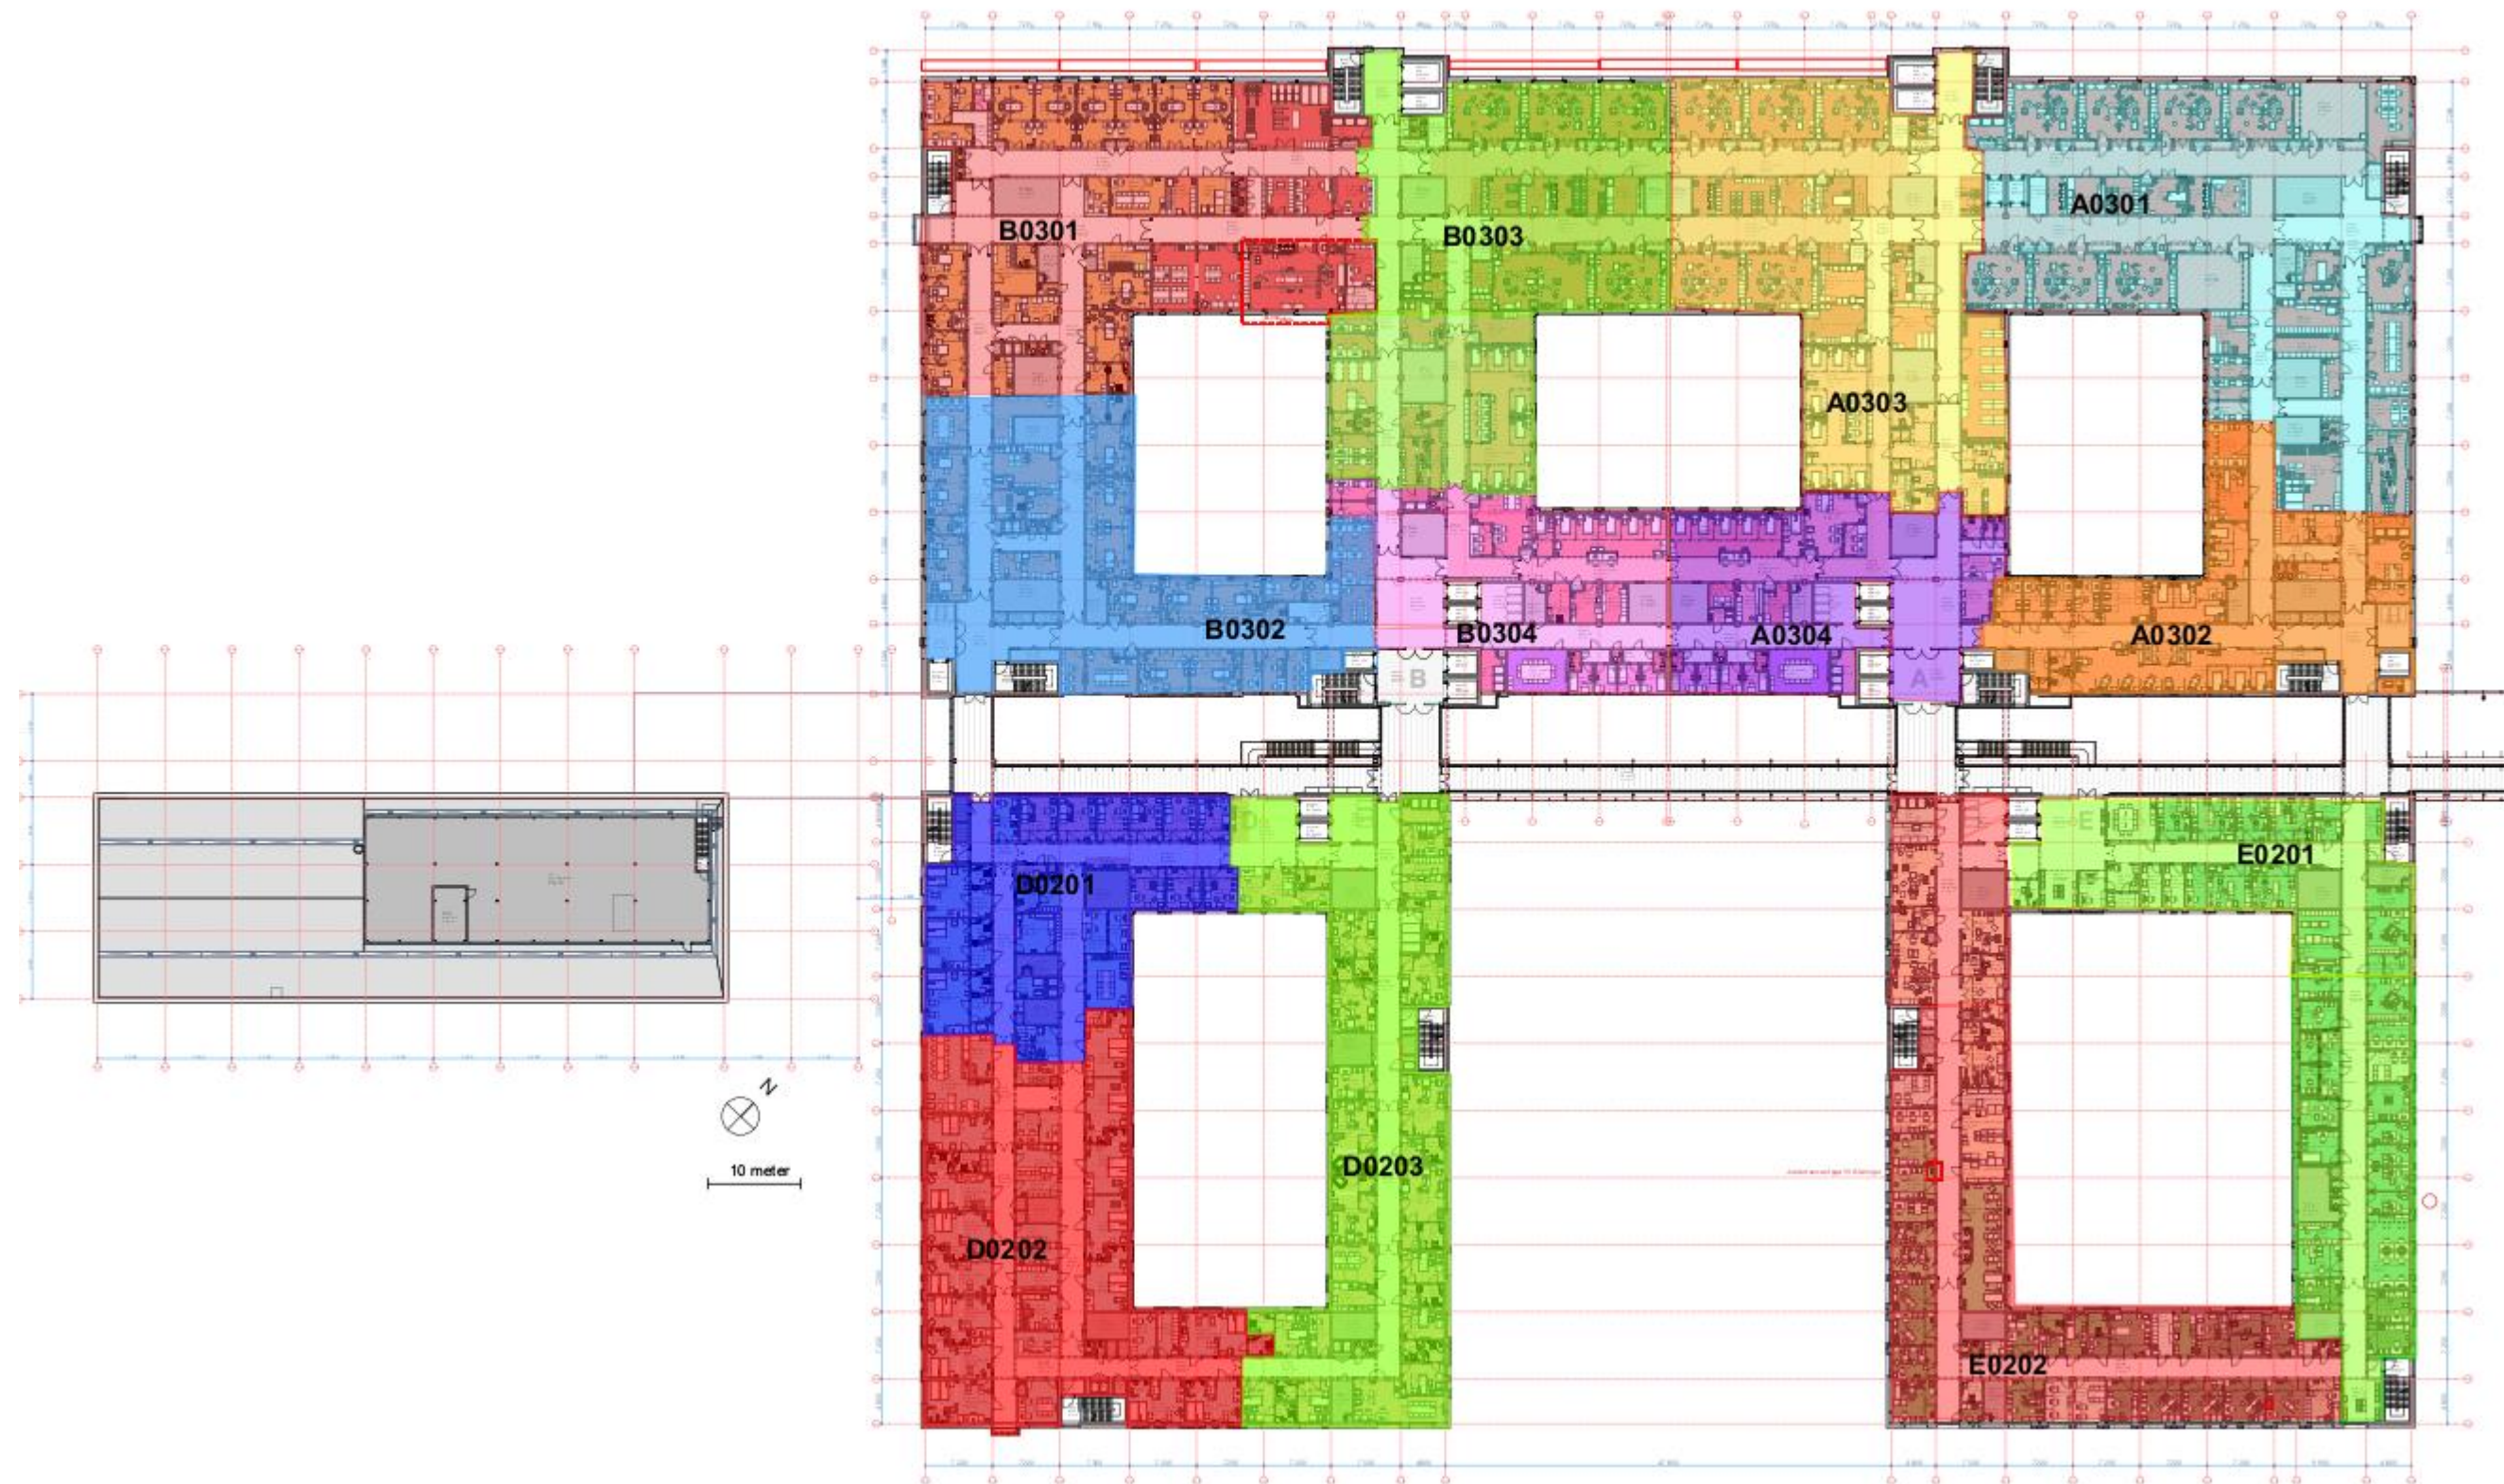


Plan 04 - kontrollområder Fase 3

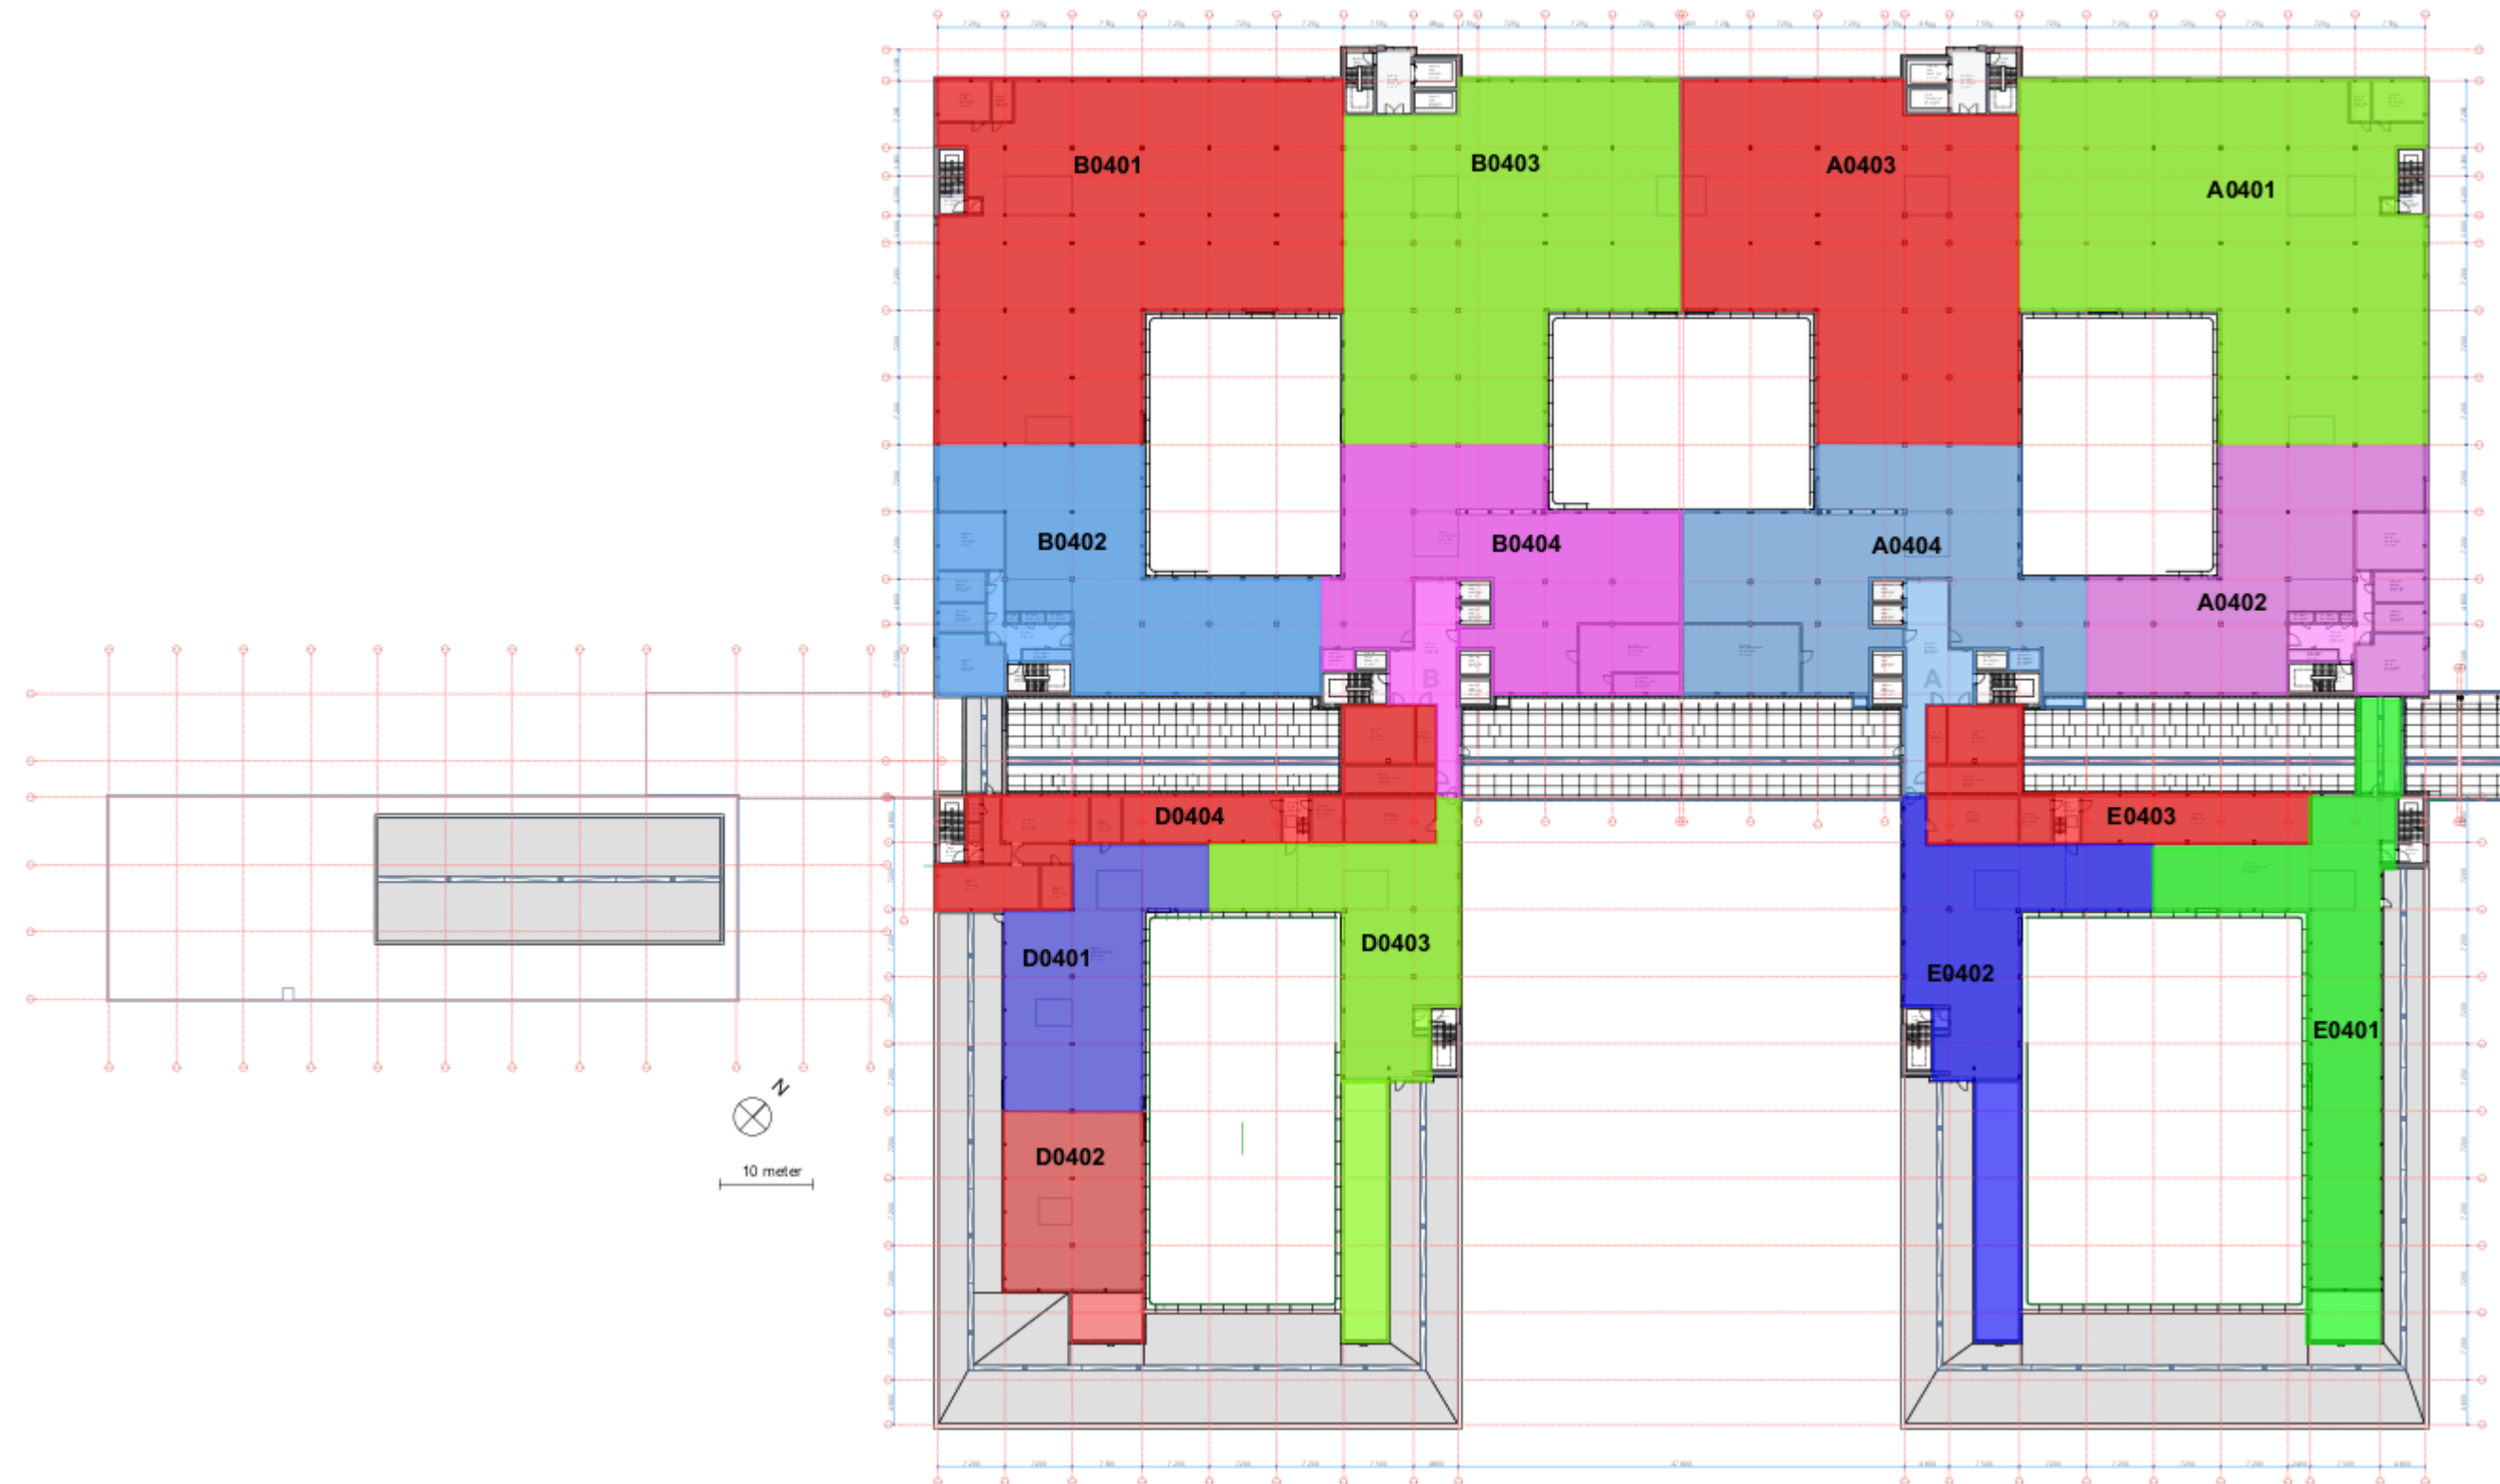


Plan 05 - kontrollområder Fase 3

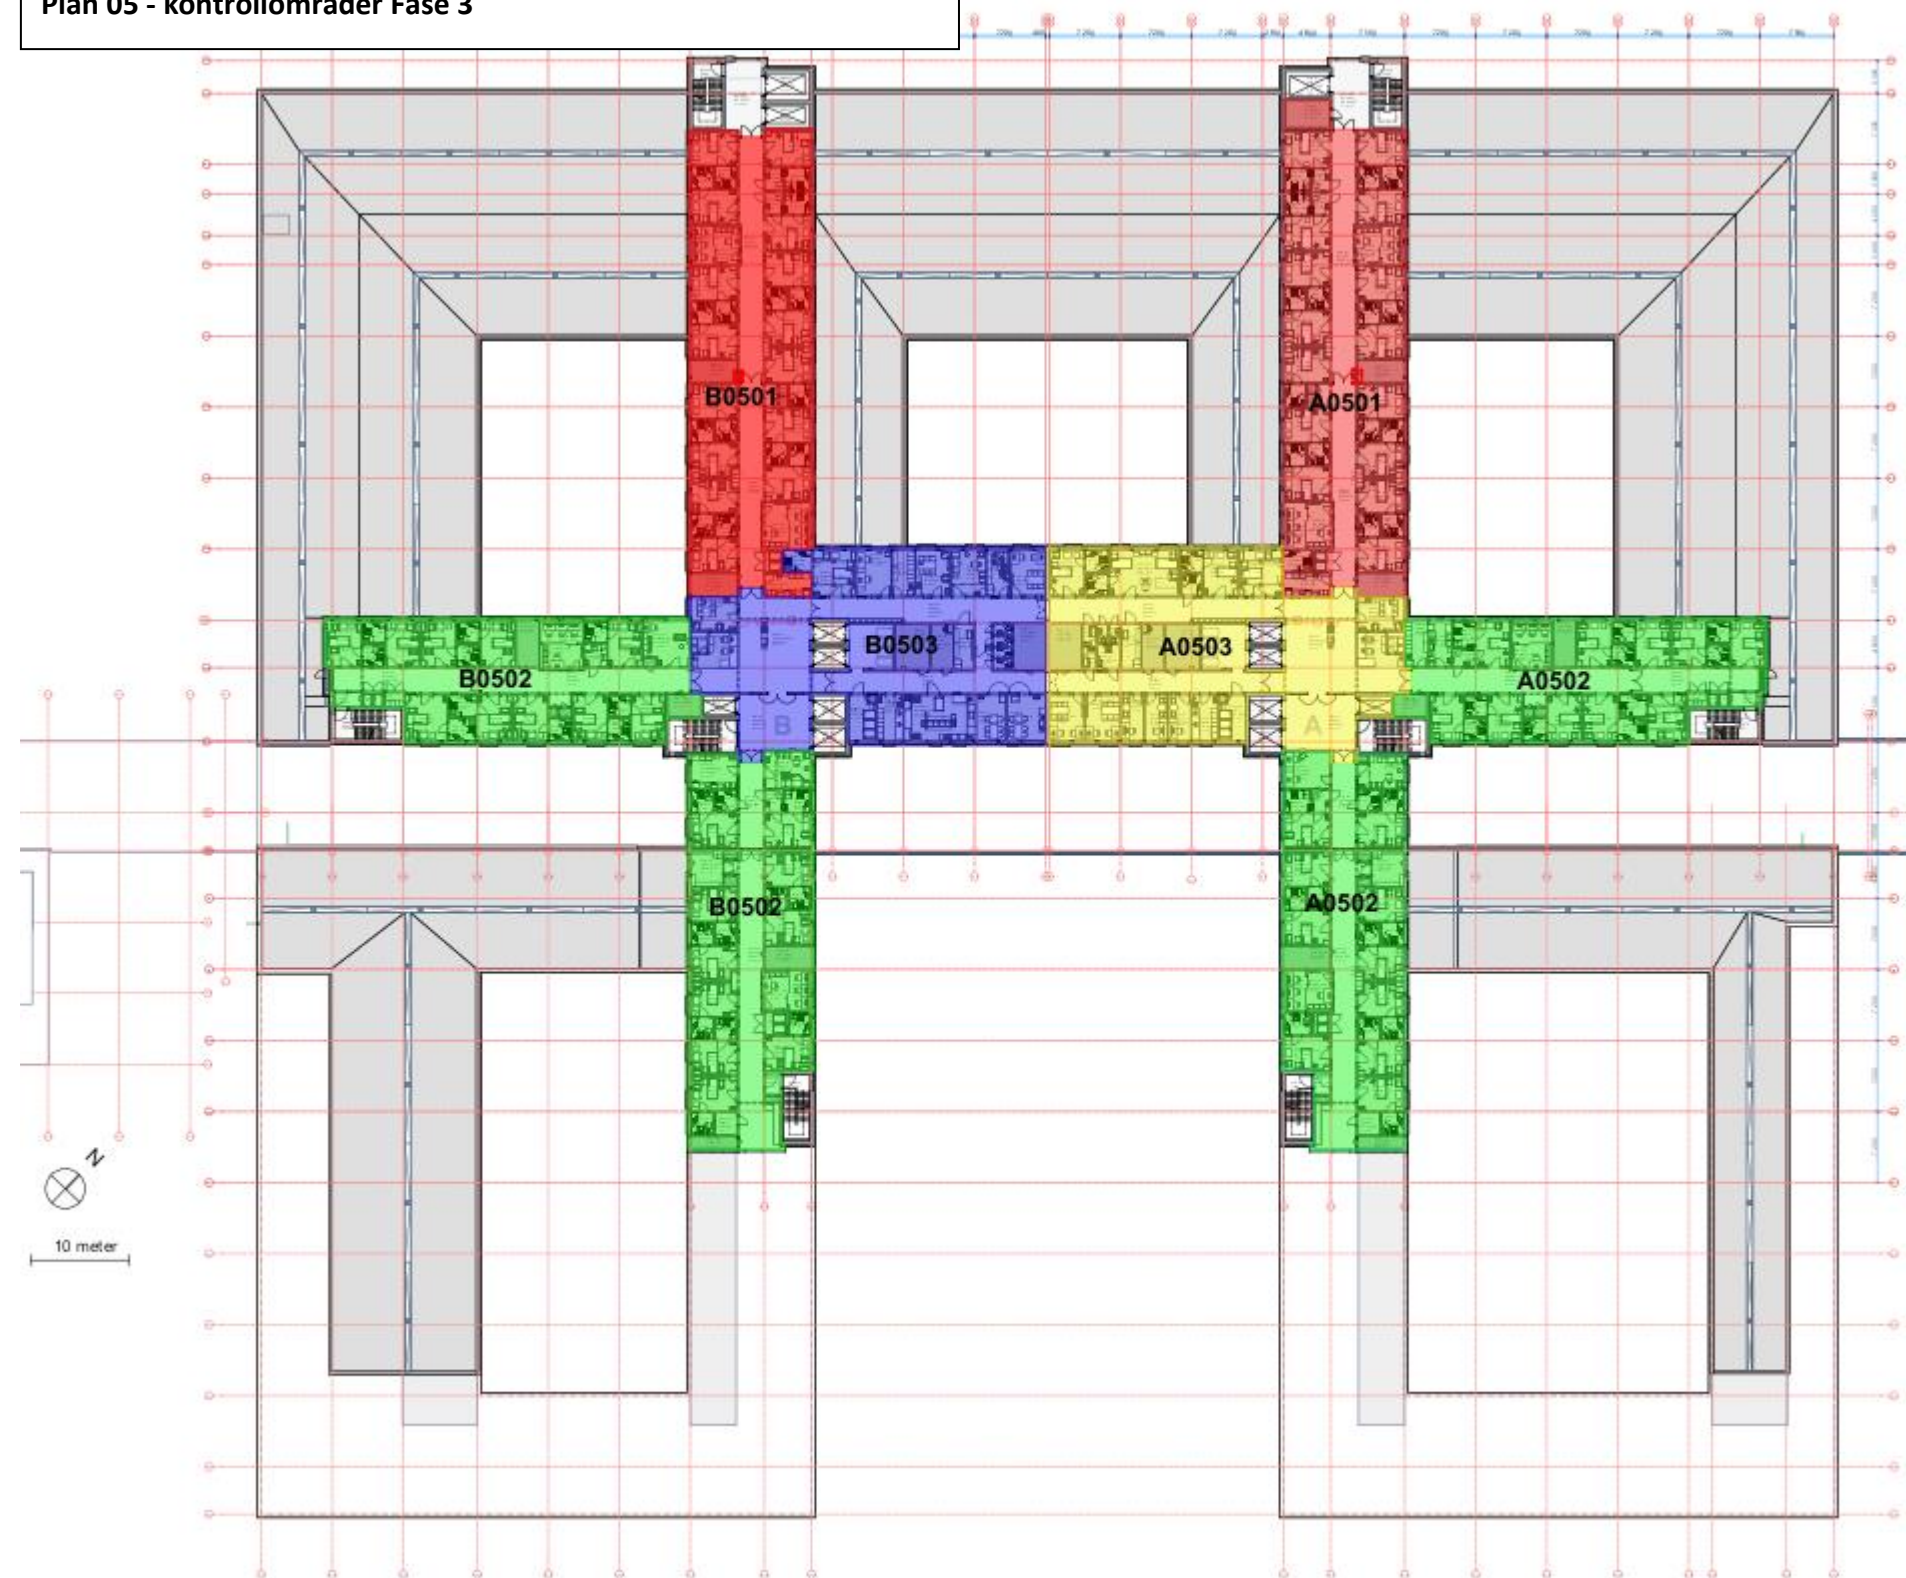


Plan 06 - kontrollområder Fase 3

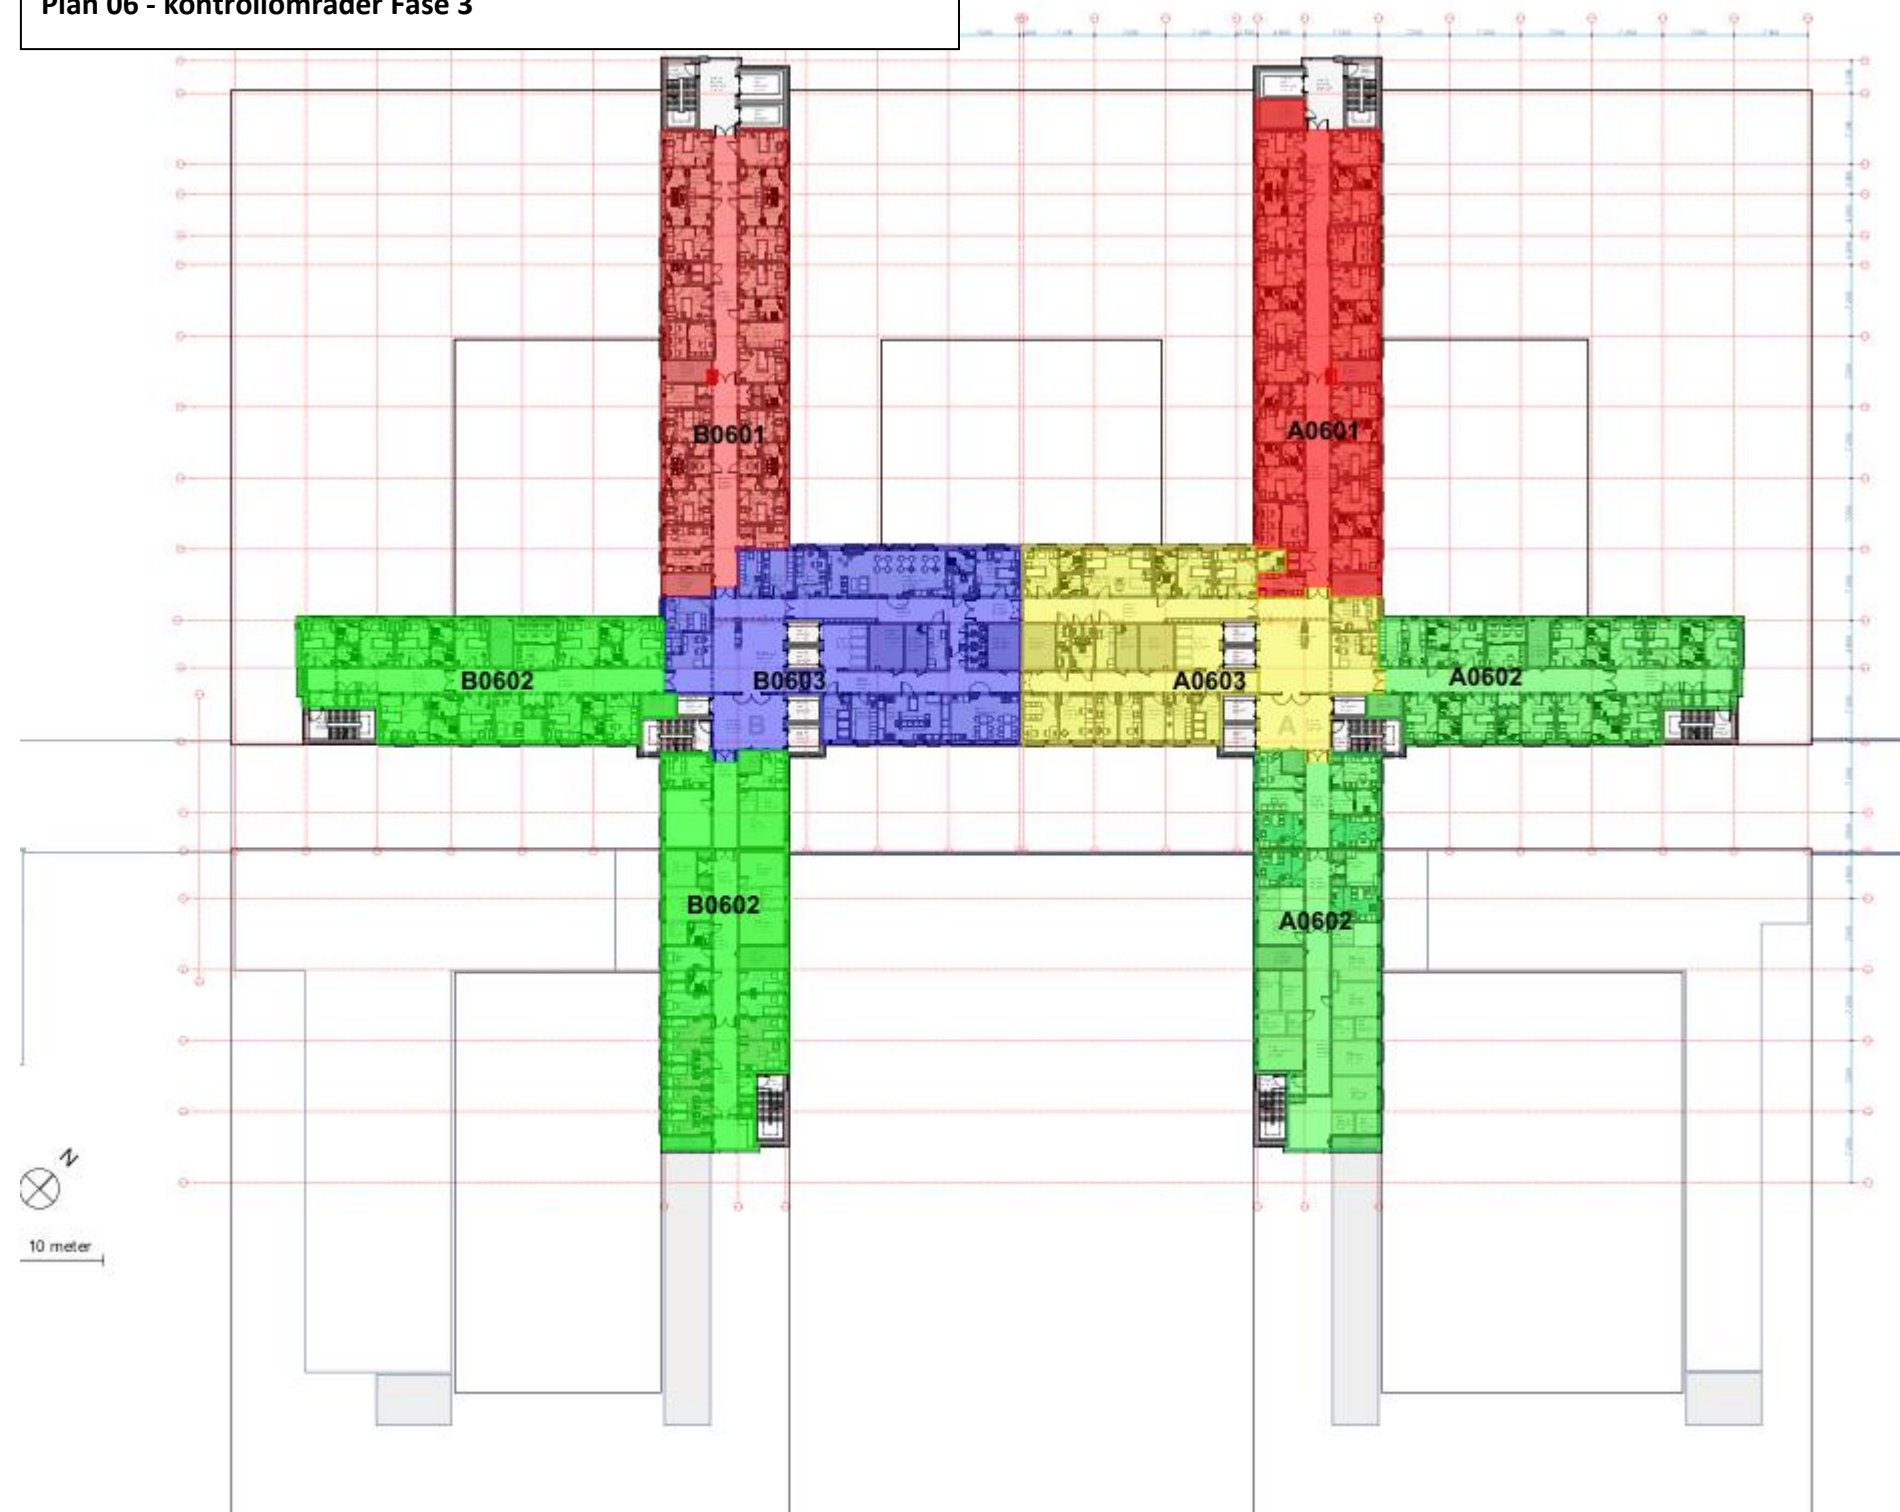


Plan 07 - kontrollområder Fase 3

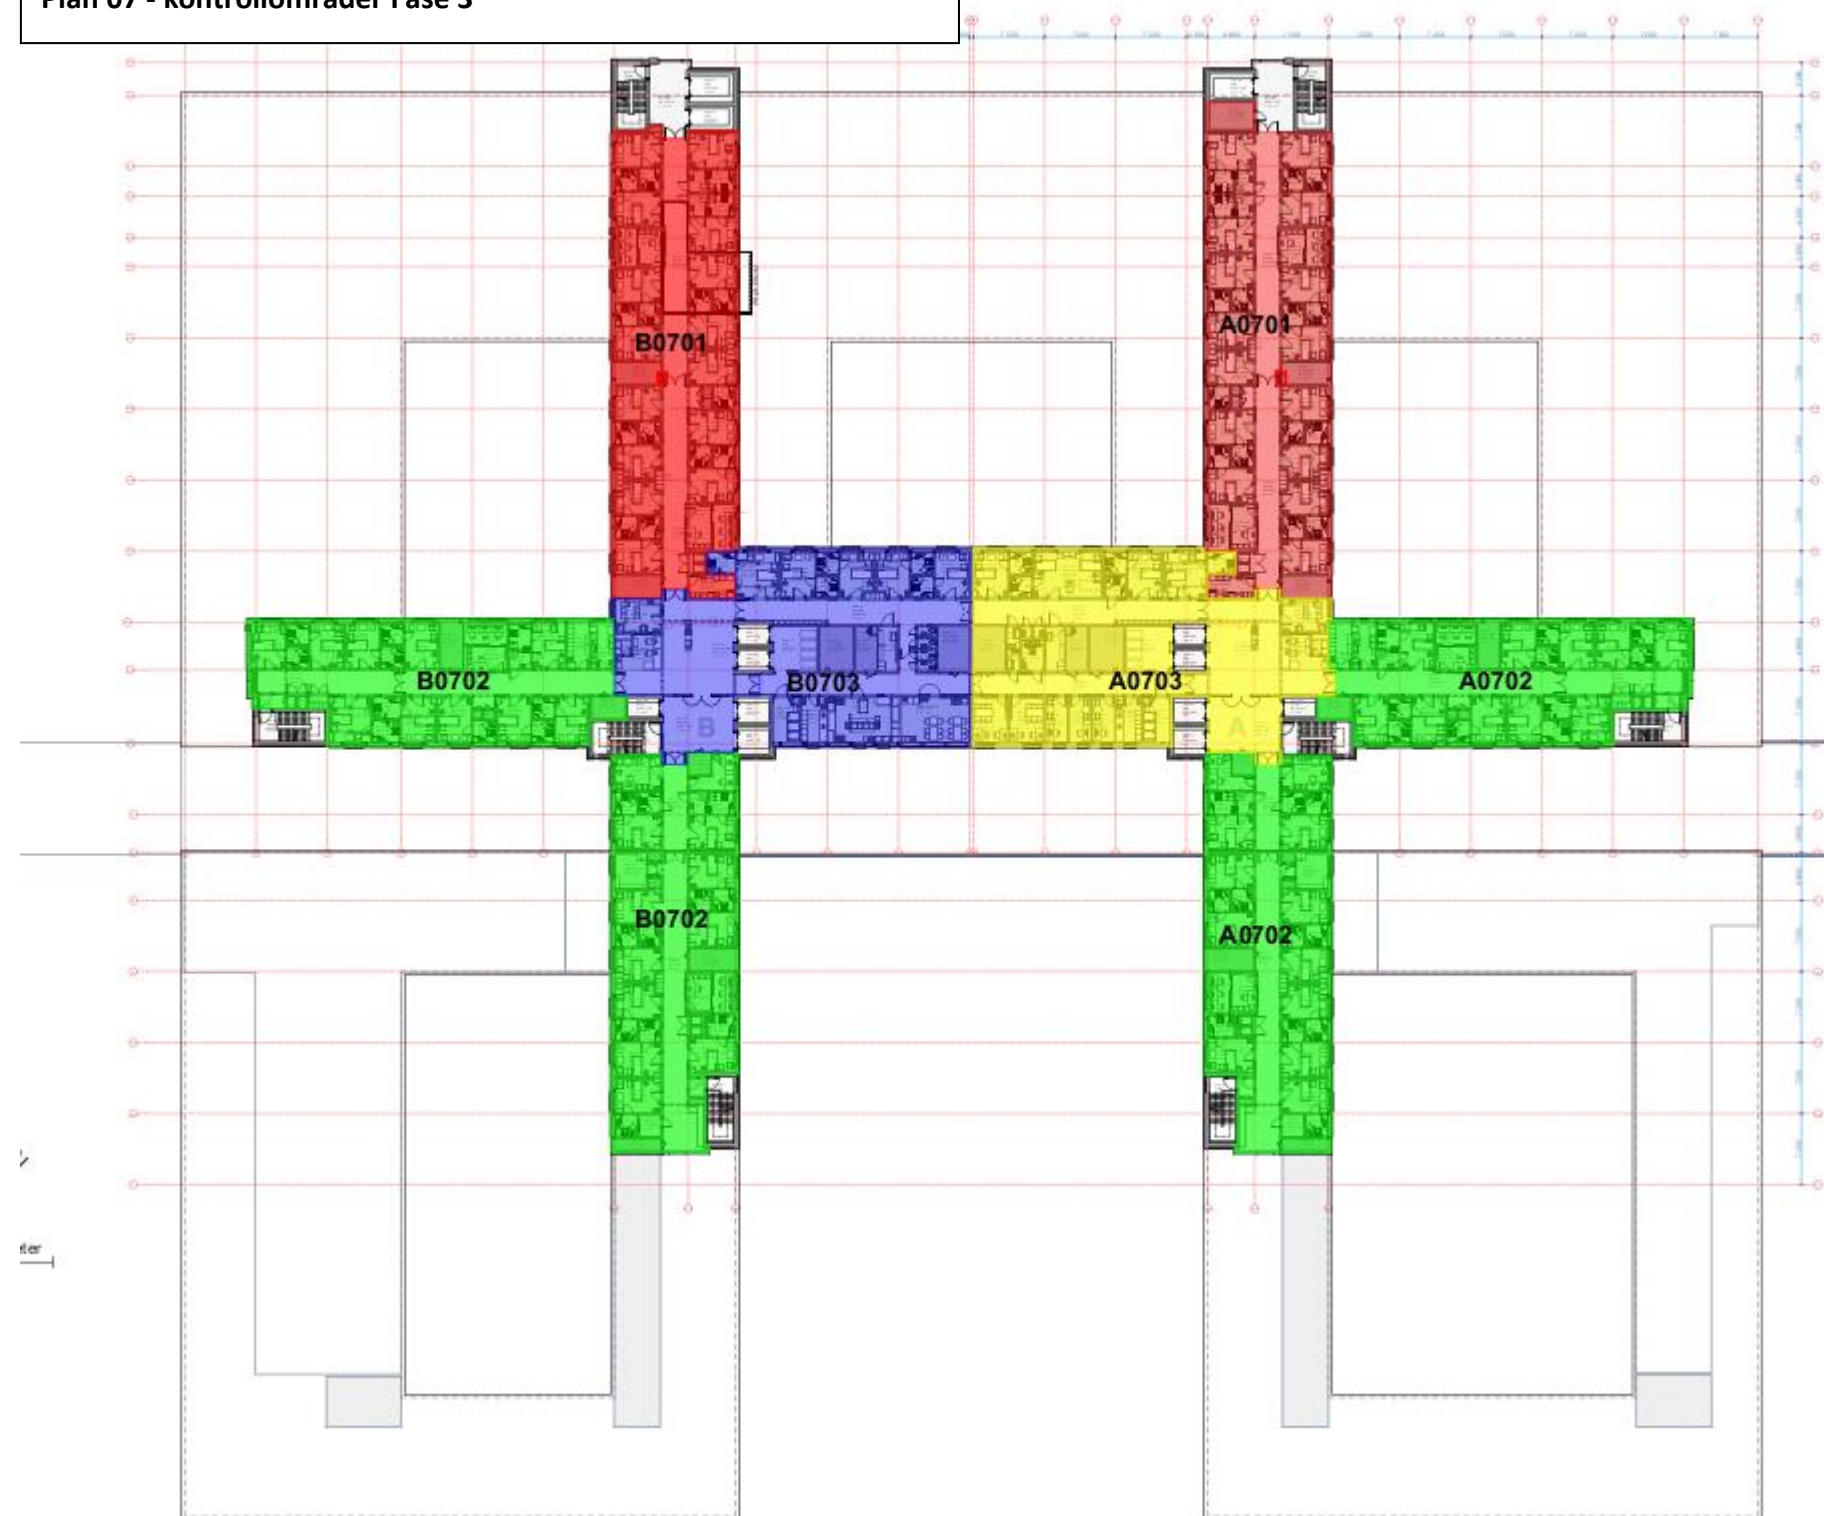


Plan 08 - kontrollområder Fase 3

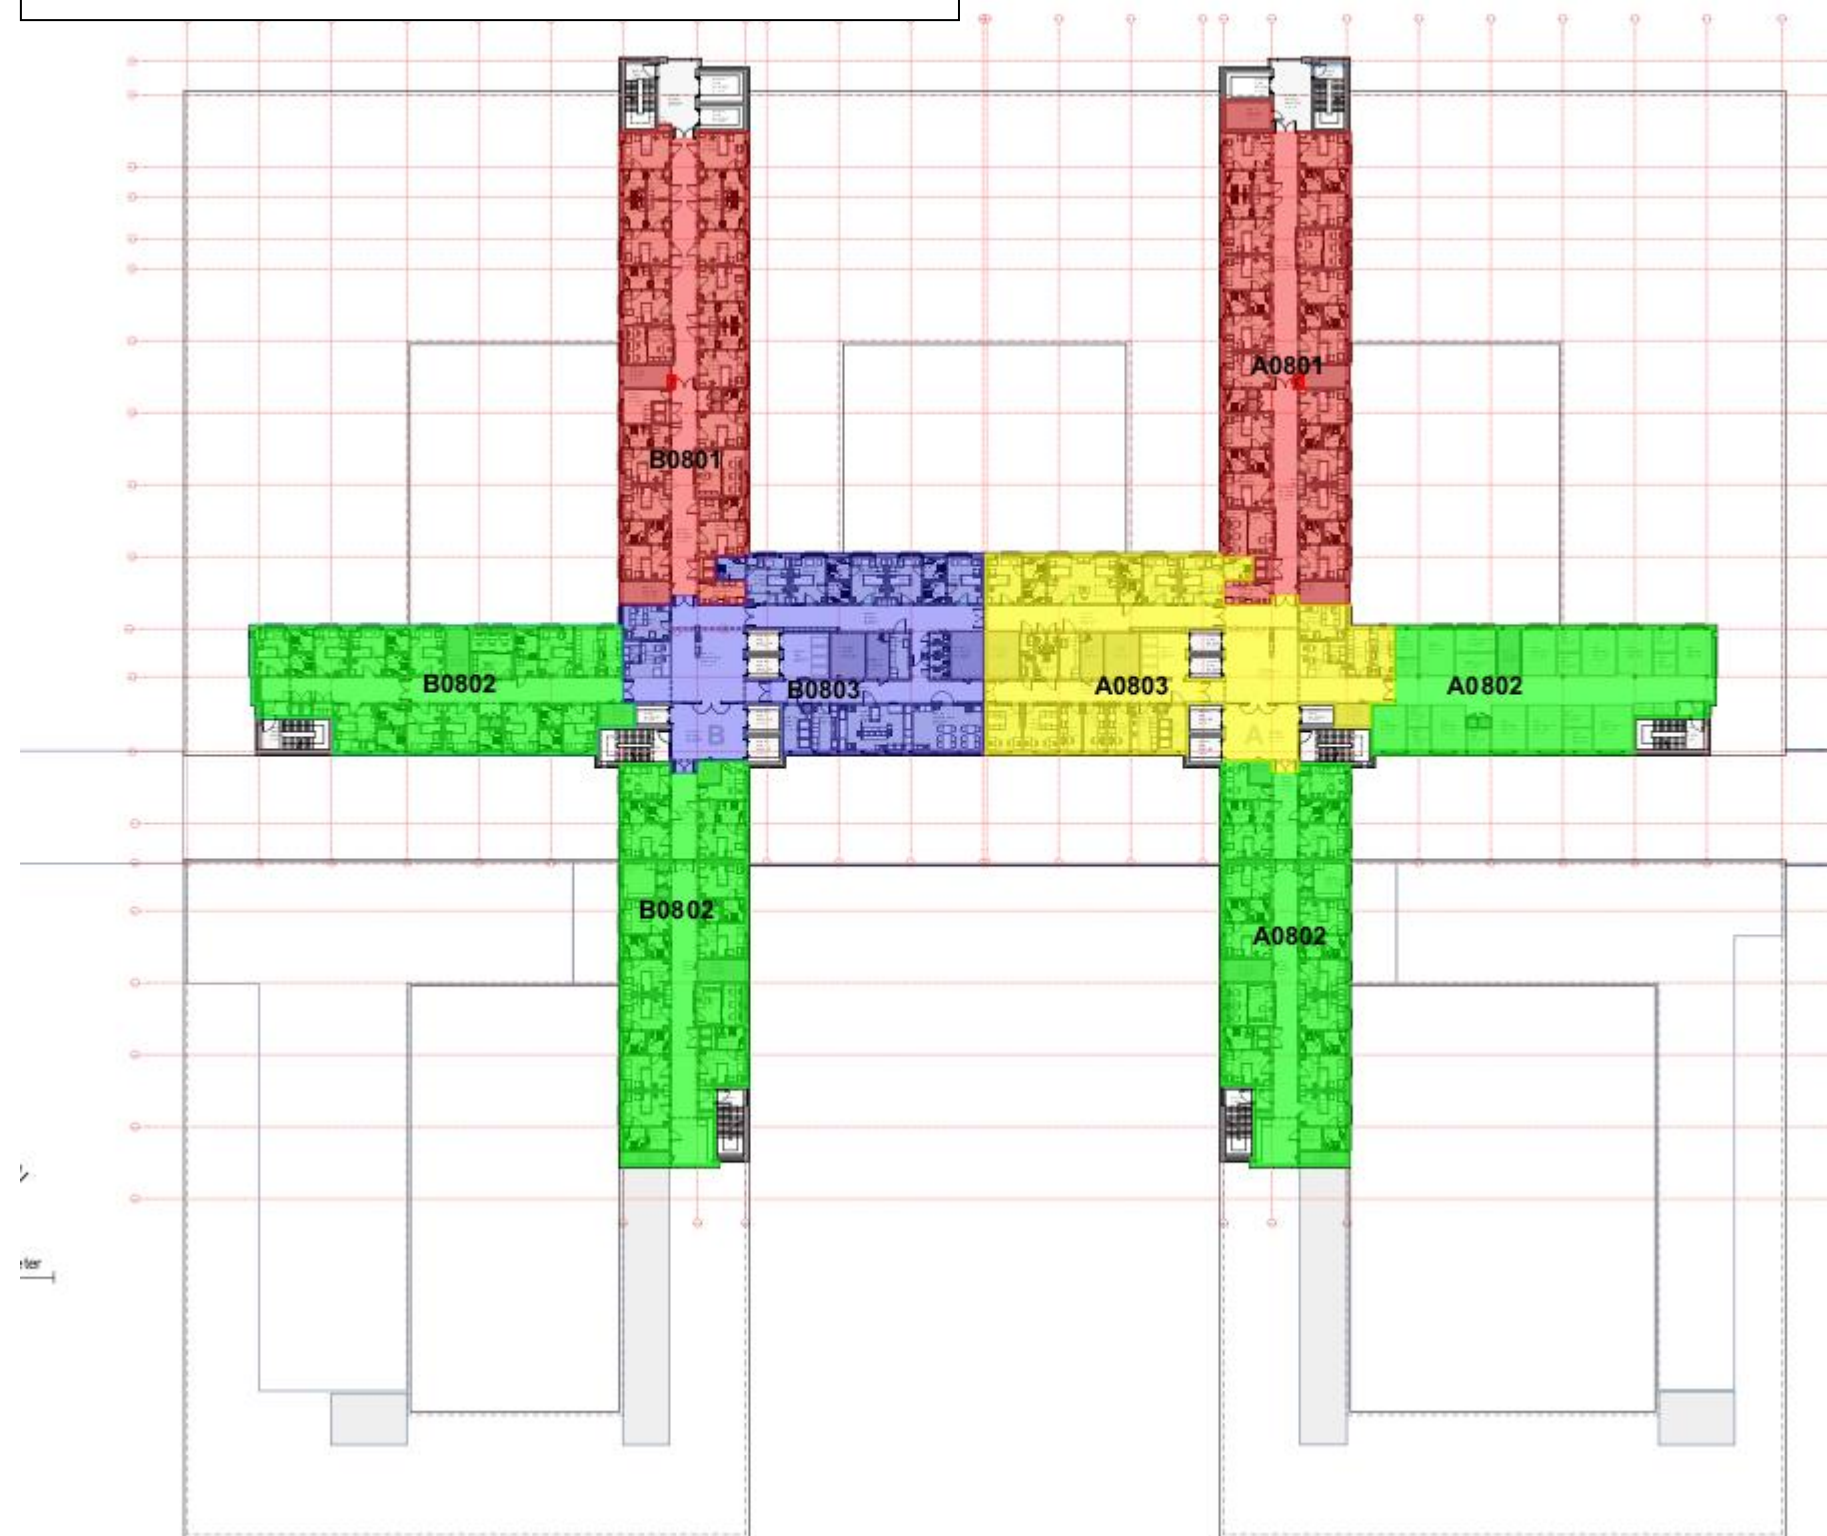

Plan 09 - kontrollområder Fase 3

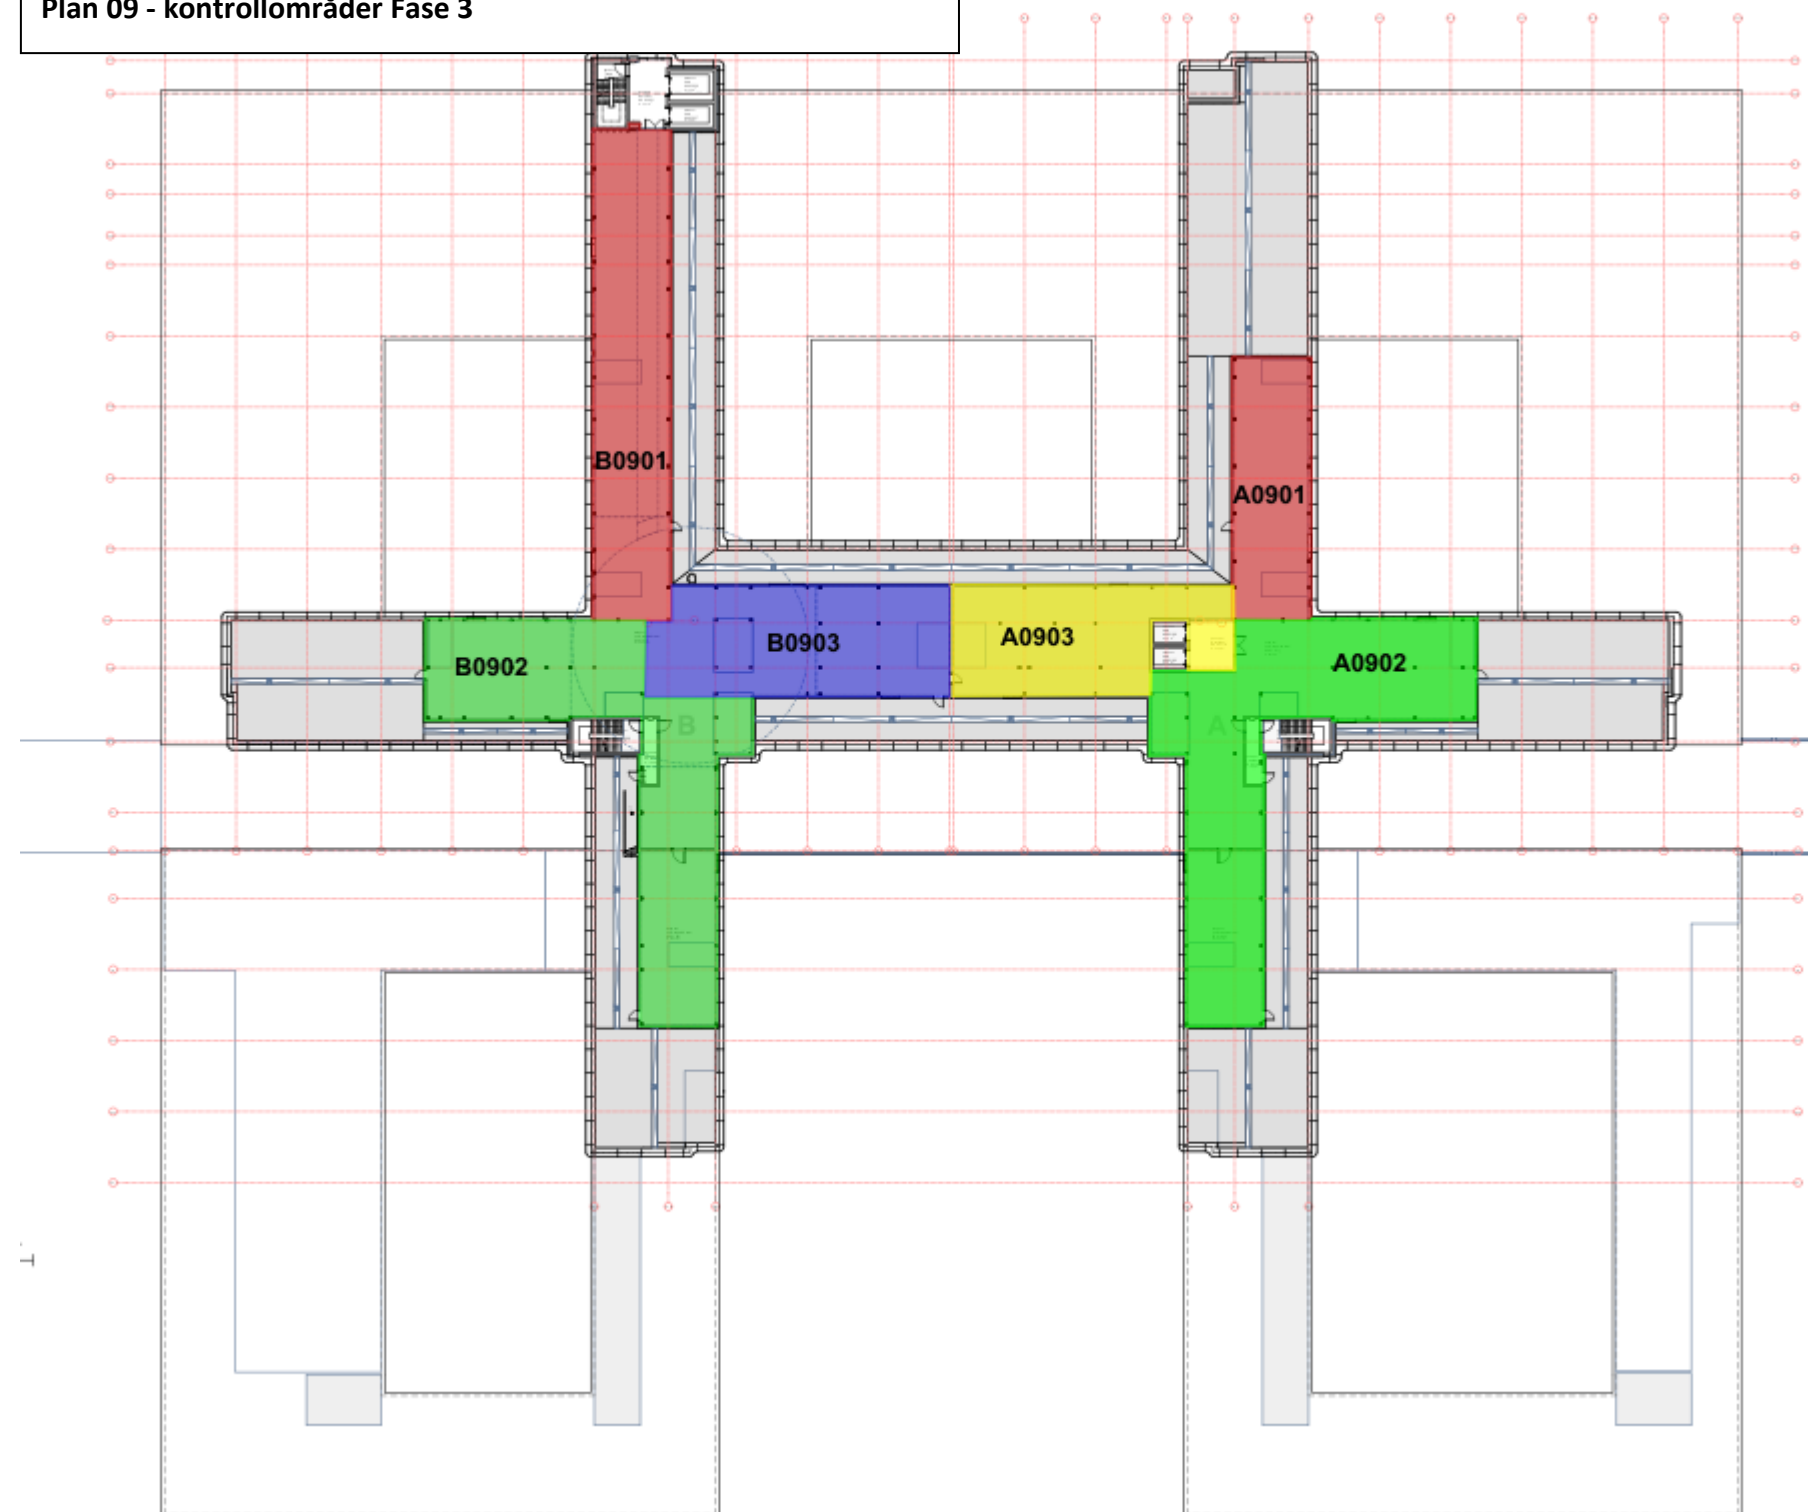

Fasader plan 1 til 4 – kontrollområder Fase 2

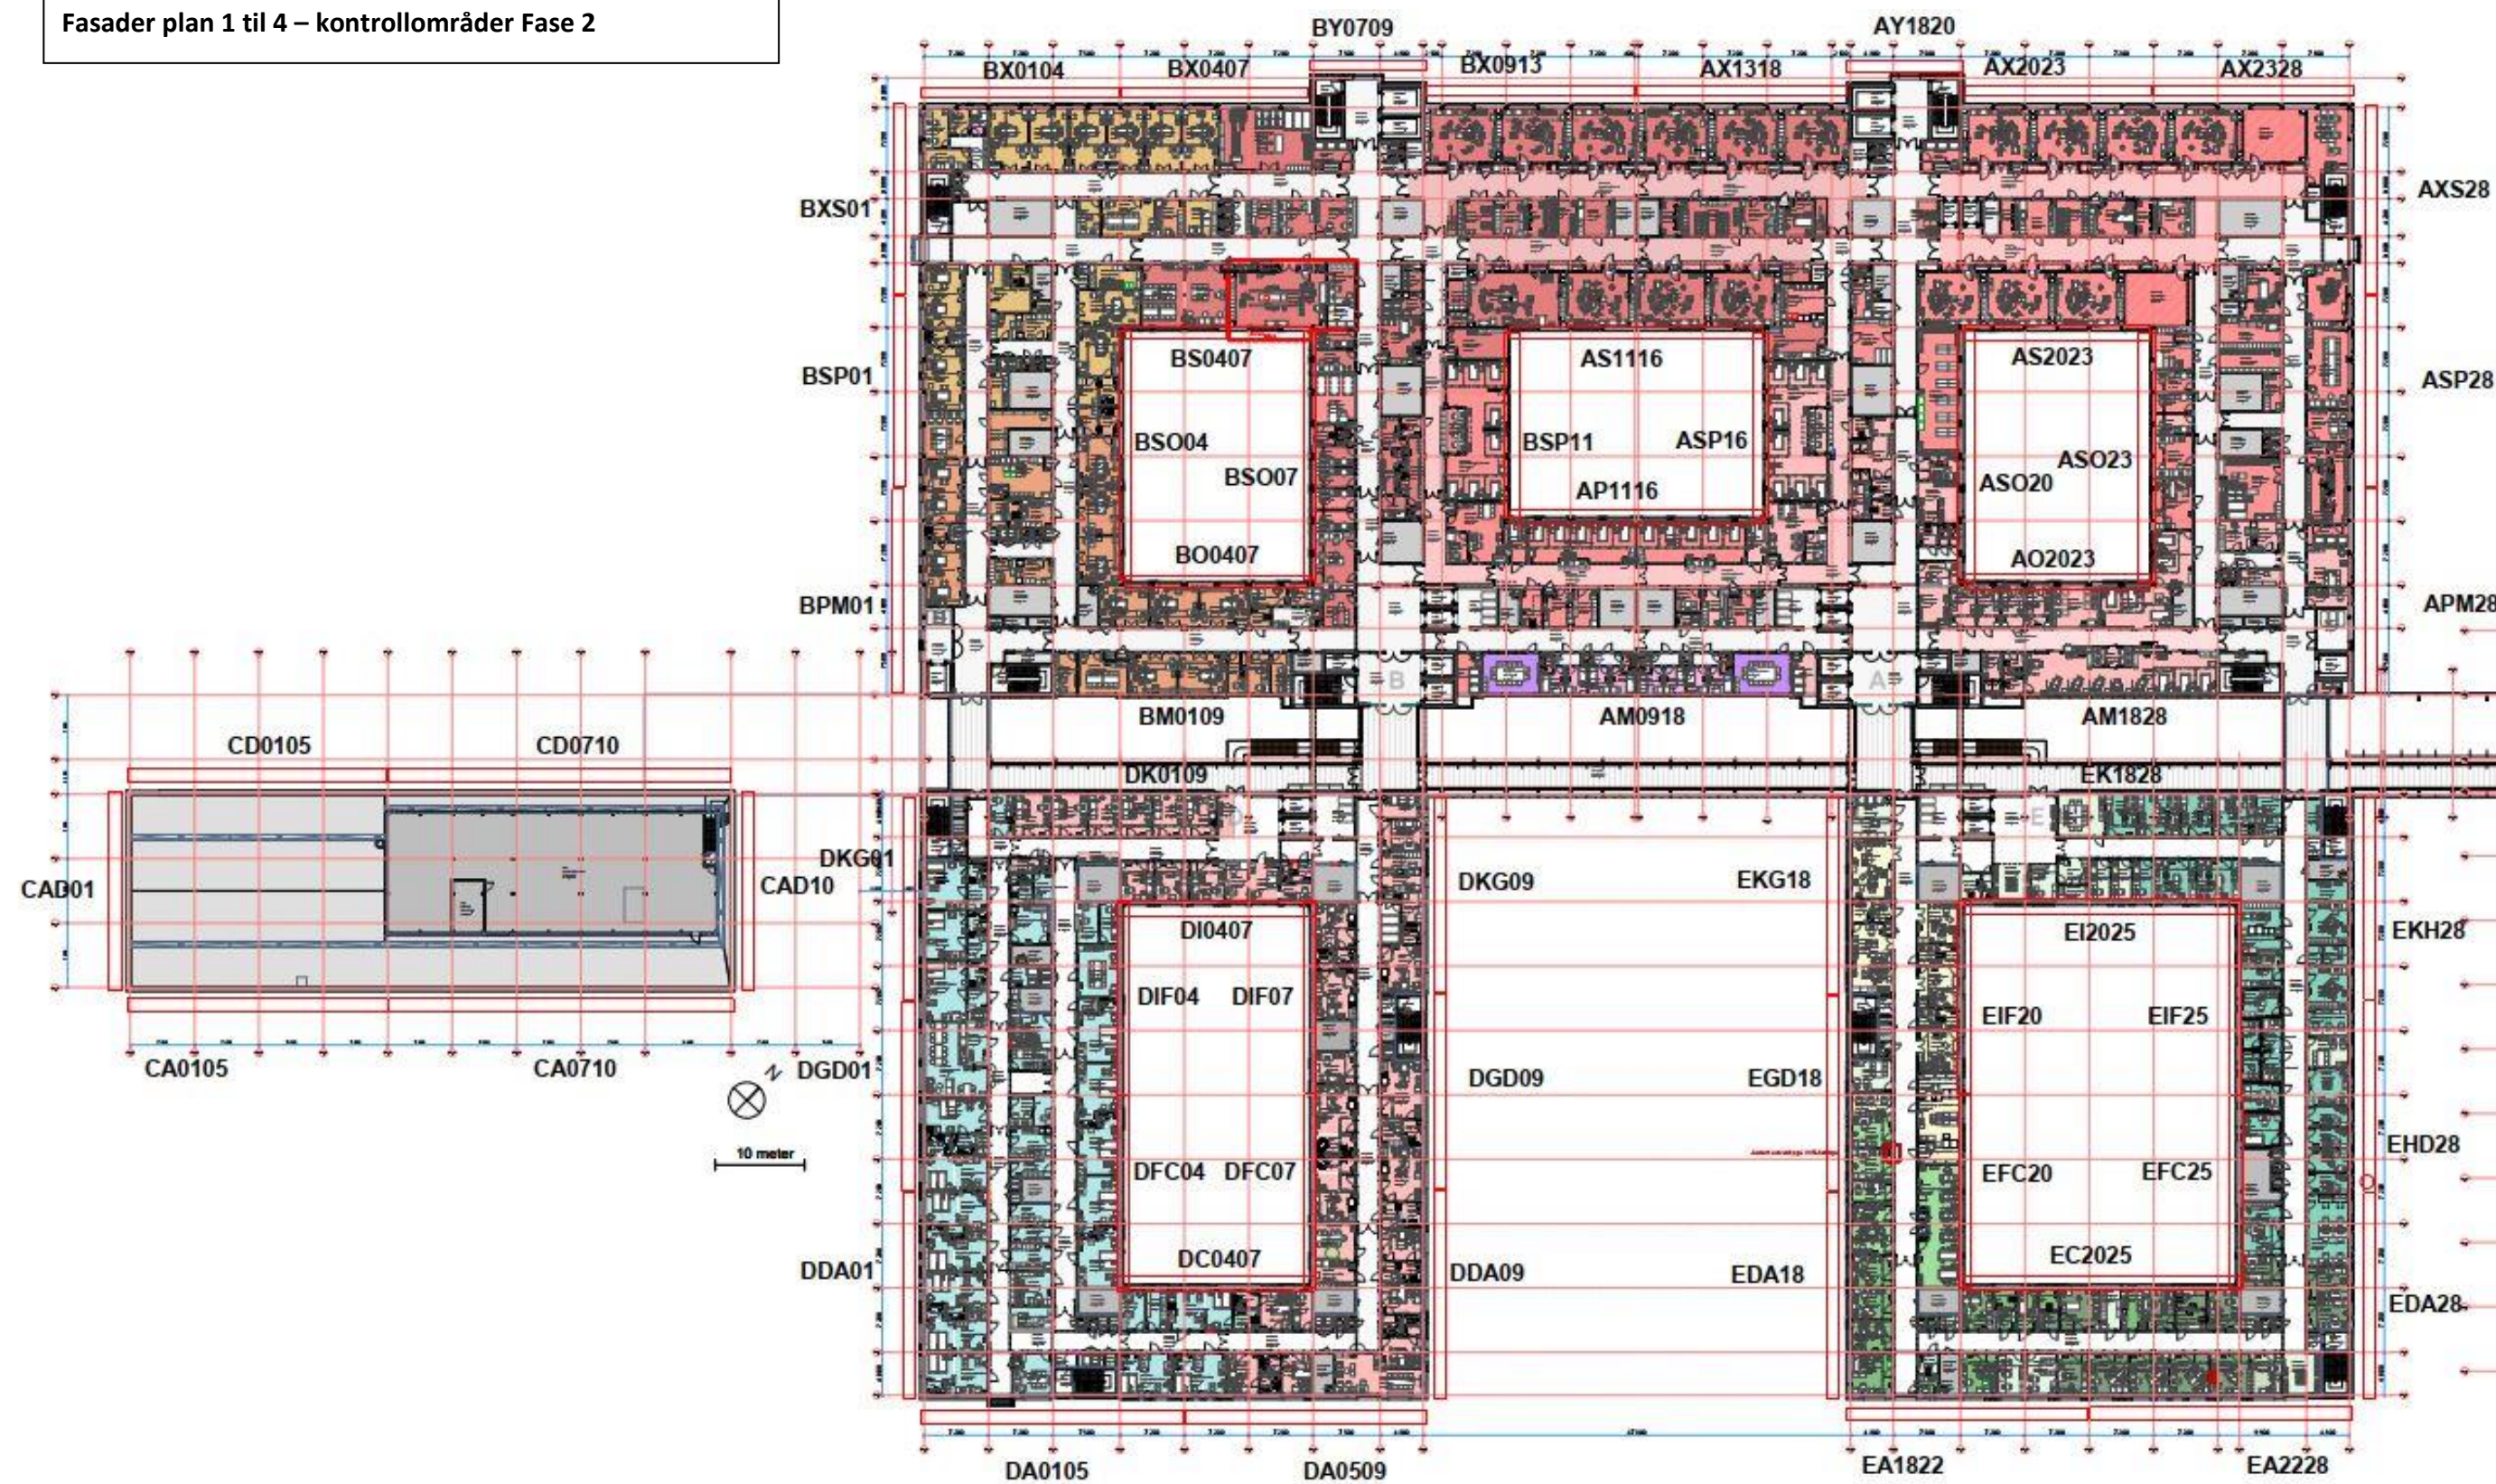

Fasader plan 5 til 10 - kontrollområder Fase 2

