ID	Aktivitetsr	Aktivitetsnavn	Start	Slutt
1		**Foreløpig fremdriftsplan**		
2				
3		**Superparken byggetrinn 1**	**ma 03.07.17**	**fr 31.05.19**
4		**Rigg og drift/permanent byggegjerde**	**ma 25.09.17**	**ti 30.04.19**
7		**Rivearb. inkl. midlert.byggegjerde**	**ma 03.07.17**	**fr 22.09.17**
11		**Energibrønner**	**ma 07.08.17**	**fr 26.01.18**
14		**Grunn og fundamentarbeider, VA**	**ma 25.09.17**	**fr 16.03.18**
19		**Betongarbeider ringmur /plate**	**ma 13.11.17**	**fr 01.06.18**
26		**Stålarbeider**	**ma 05.02.18**	**fr 02.03.18**
30		**Betongarbeider vegger /trapper**	**ma 29.01.18**	**fr 22.06.18**
32		**Betongelementer**	**ma 05.02.18**	**fr 27.04.18**
34		**Murerarbeider**	**ti 03.04.18**	**fr 21.12.18**
36		**Tømrerarbeider**	**ma 26.02.18**	**ma 01.04.19**
44		**Metallarbeider**	**ma 03.09.18**	**fr 14.12.18**
46		**Snekkerarbeider**	**ma 04.02.19**	**ma 29.04.19**
48		**Sprinklerarbeider**	**ma 09.07.18**	**ti 09.04.19**
51		**Rørleggerarbeider i grunn**	**ma 20.11.17**	**ma 08.04.19**
56		**Ventilasjonsarbeider**	**ma 16.04.18**	**fr 31.05.19**
57		Byggeperiode 1	ma 16.04.18	fr 31.08.18
58		Byggeperiode 2	ma 03.12.18	ti 30.04.19
59		Igangkjøring og innregulering	on 01.05.19	fr 31.05.19
60		**Taktekkerarbeider**	**ma 05.03.18**	**fr 08.06.18**
66		**Maler og gulvleggerarbeider**	**ma 01.10.18**	**to 28.02.19**
69		**Lås og beslag**	**ma 04.06.18**	**on 17.04.19**
71		**Elektrikerarbeider**	**fr 15.06.18**	**fr 05.04.19**
73		**SD-anlegg**	**ma 17.09.18**	**fr 19.04.19**
76		**Blikkenslagerarbeider**	**ma 30.04.18**	**fr 05.04.19**
78		**Heis**	**ma 01.10.18**	**fr 30.11.18**
80		**Branntetting**	**ti 02.01.18**	**to 28.02.19**
82		**Fast innredning**	**fr 01.03.19**	**fr 26.04.19**
84		**Utomhusarbeider**	**ma 16.10.17**	**ti 30.04.19**
88		**Overlevering**	ti 30.04.19	ti 30.04.19

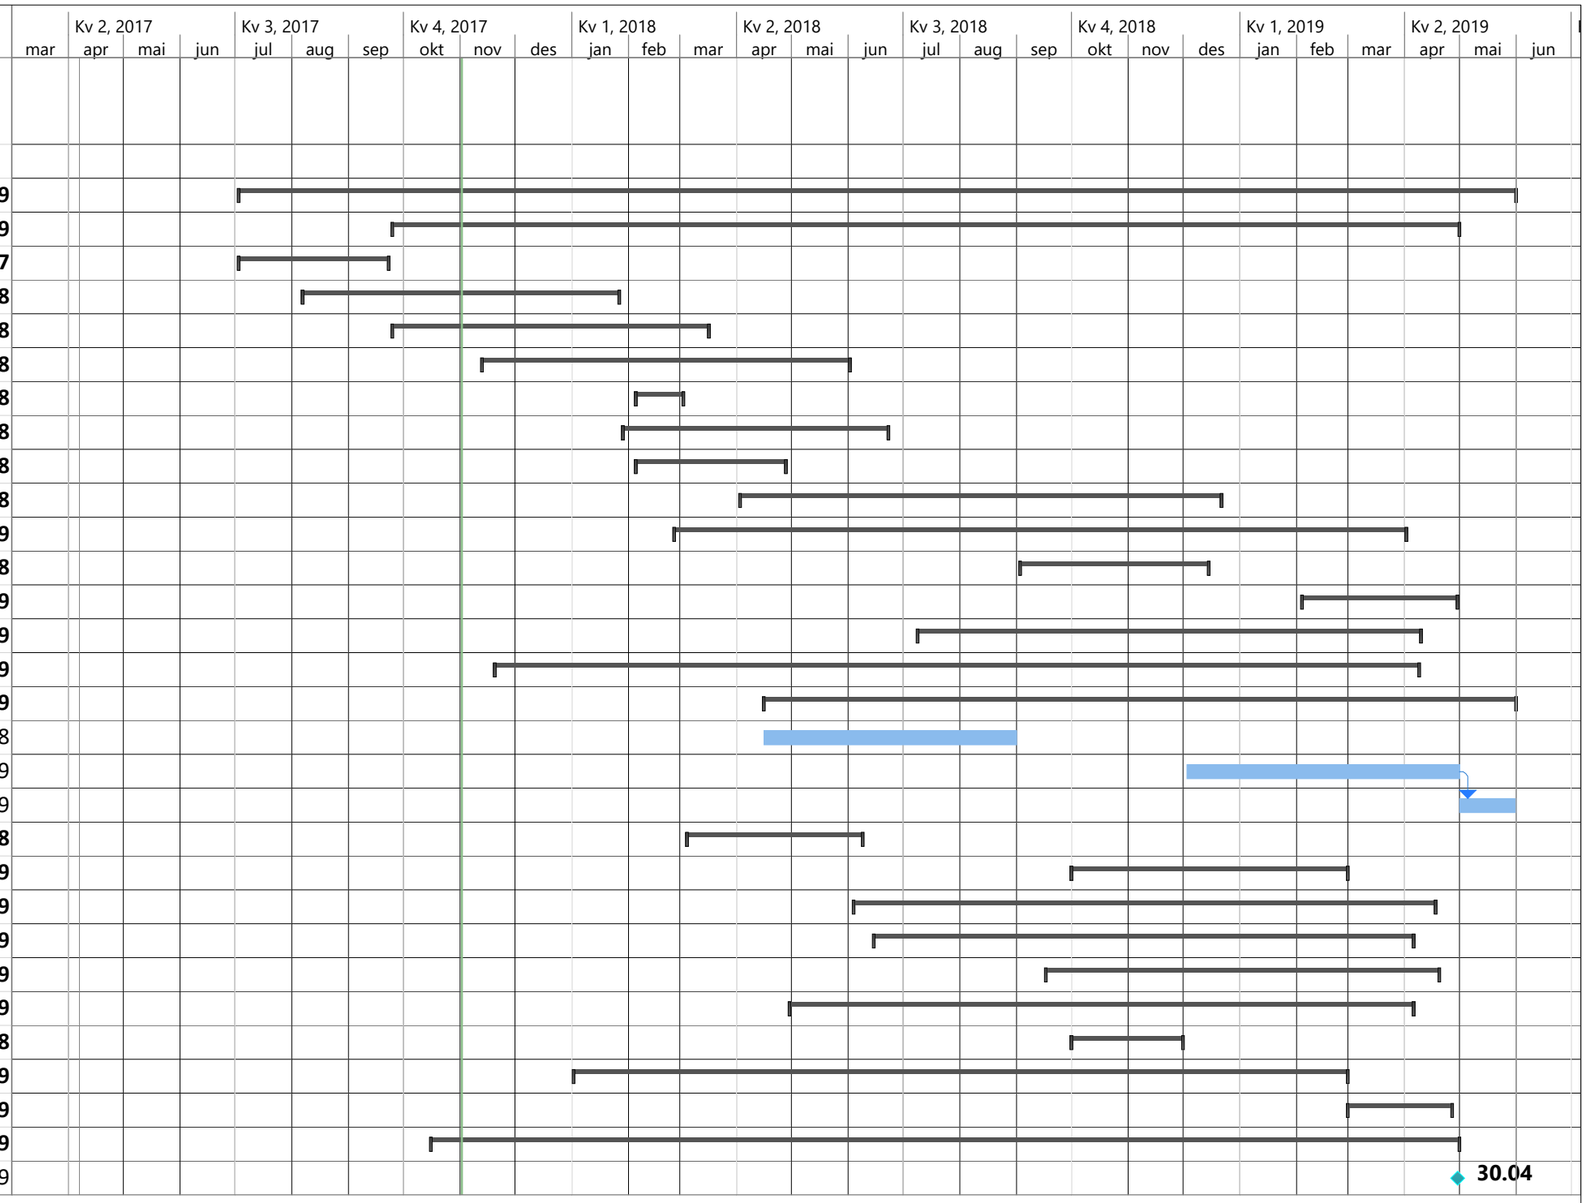

Prosjekt: Fremdrift byggeperiod
Dato: to 02.11.17

Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Ekstern milepæl	
Deling		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Tidsfrist	
Milepæl		Inaktivt sammendrag		Bare start		Fremdrift	
Sammendrag		Manuell aktivitet		Bare slutt		Manuell fremdrift	
Prosjektsammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter			
