I0700 Solenergianlegg ADO - Hovedfremdriftsplan
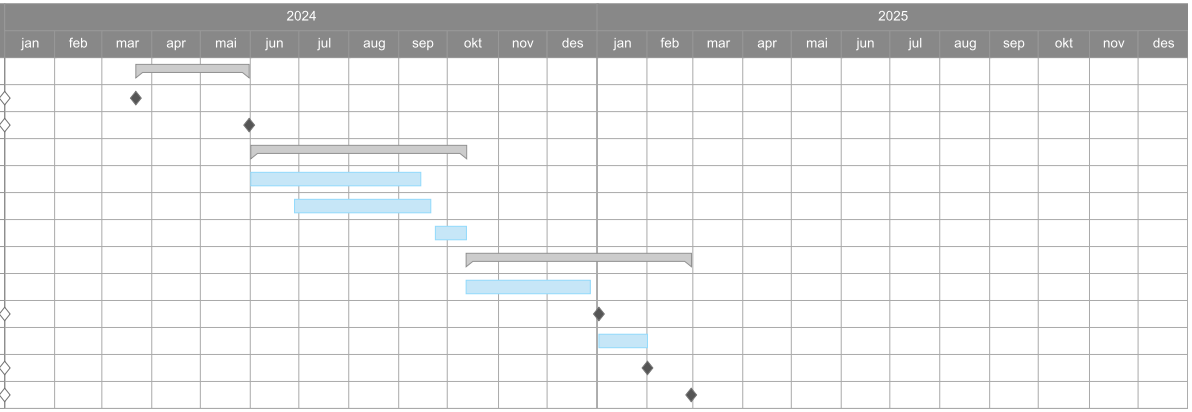
	Task Name	Duration	Start	Finish
1	**Konkurranseutlysning**	50d	22.03.24	31.05.24
2	Utlysning	0	22.03.24	22.03.24
3	Kontraktssignering	0	31.05.24	31.05.24
4	**Detaljprosjektering**	96d	01.06.24	11.10.24
5	Entreprenørs detaljprosjektering	76d	01.06.24	13.09.24
6	Rammesøknad	12w	28.06.24	19.09.24
7	Søknad om igangsetting (IG)	3w	23.09.24	11.10.24
8	**Produksjon og leveranser**	100d	12.10.24	28.02.25
9	Installasjon	56d	12.10.24	27.12.24
10	Mekanisk ferdigstillelse	0	02.01.25	02.01.25
11	Test & igangkjøring	22d	02.01.25	31.01.25
12	Søknad om ferdigattest	0	01.02.25	01.02.25
13	Overtakelsesforretning	0	28.02.25	28.02.25
