



Møre og Romsdal
fylkeskommune

-Ein tydeleg medspelar

K452 Spjelkavik vgs

Tilbudsbefaring E40 Elkraft og teletekniske arbeider 19.mai 2016



Agenda

- Orientering om prosjektet og E40 entreprisen
- Entrepriestructur
- Utomhusplan
- Overordnet fremdrift
- Orientering fra RIE
- Gjennomgang faseplaner
- Rutiner for innlevering av anbud
- Orientering om evaluering
- Befaring



Orientering om prosjektet

- Utbygging og renovering av Spjelkavik vgs. er en del av ny Ålesundstruktur for de videregående skolene.
- Ny Ålesundstruktur innebærer utbygging ved Fagerlia vgs, Spjelkavik vgs, Borgund vgs samt bygging av ny skole i Ålesund sentrum – (Ålesund vgs - Sørsida.)
- For Spjelkavik vgs innebærer vedtaket om ny Ålesund struktur at kapasiteten ved skolen skal økes fra 6 til 9 parallelle klasser.
- Skolen vil ved ferdigstilling bestå av ca. 8.200 m², hvor ca. 5.400 m² i eksisterende lokaler og 2.800m² i nye lokaler.



E40 Elkraft og teletekniske anlegg

- Etablering av tilbygg mot vest, sammenkobling mot eksisterende bygg
- Renovering av eksisterende skolebygg, delt opp i faser
- Komplette rivearbeider for elkraft og teletekniske fag
- Nye tekniske installasjoner i renoverert areal
- Gjennomføring av prosjektet med skole i drift
- Infrastruktur til skolen skal være operativ til en hver tid, lys, strøm, data, ect.
- Begrensning i tidspunkt for støyende arbeider, jf. bilag A3



Entreprisestruktur

- E10 Infrastruktur og Forberedende arbeider
- E20 Bygningsmessige arbeider (Hovedentreprenør)
- E30 Rørarbeider
- E36 Ventilasjon og automasjon
- E40 Elektro og teletekniske arbeider
- E60 Heis
- E92 Storkjøkken
- Evt. andre mindre entrepriser



Overordnet fremdrift E40

- | | |
|--|------------|
| • Tilbudskonferanse | 19.05.2016 |
| • Frist til å stille spørsmål ved konkurransen | 10.06.2016 |
| • Tilbudsfrist | 20.06.2016 |
| • Byggestart | 01.09.2016 |
| • Ferdigstillelse fase A | 03.07.2017 |
| • Ferdigstillelse fase B | 14.12.2017 |
| • Ferdigstillelse fase C | 30.05.2018 |
| • Ferdigstillelse fase D | 14.11.2018 |



Spjelkavik vgs.





Spjelkavik vgs



Utomhusplan







Orientering fra RIE



Faseinndeling plan 1

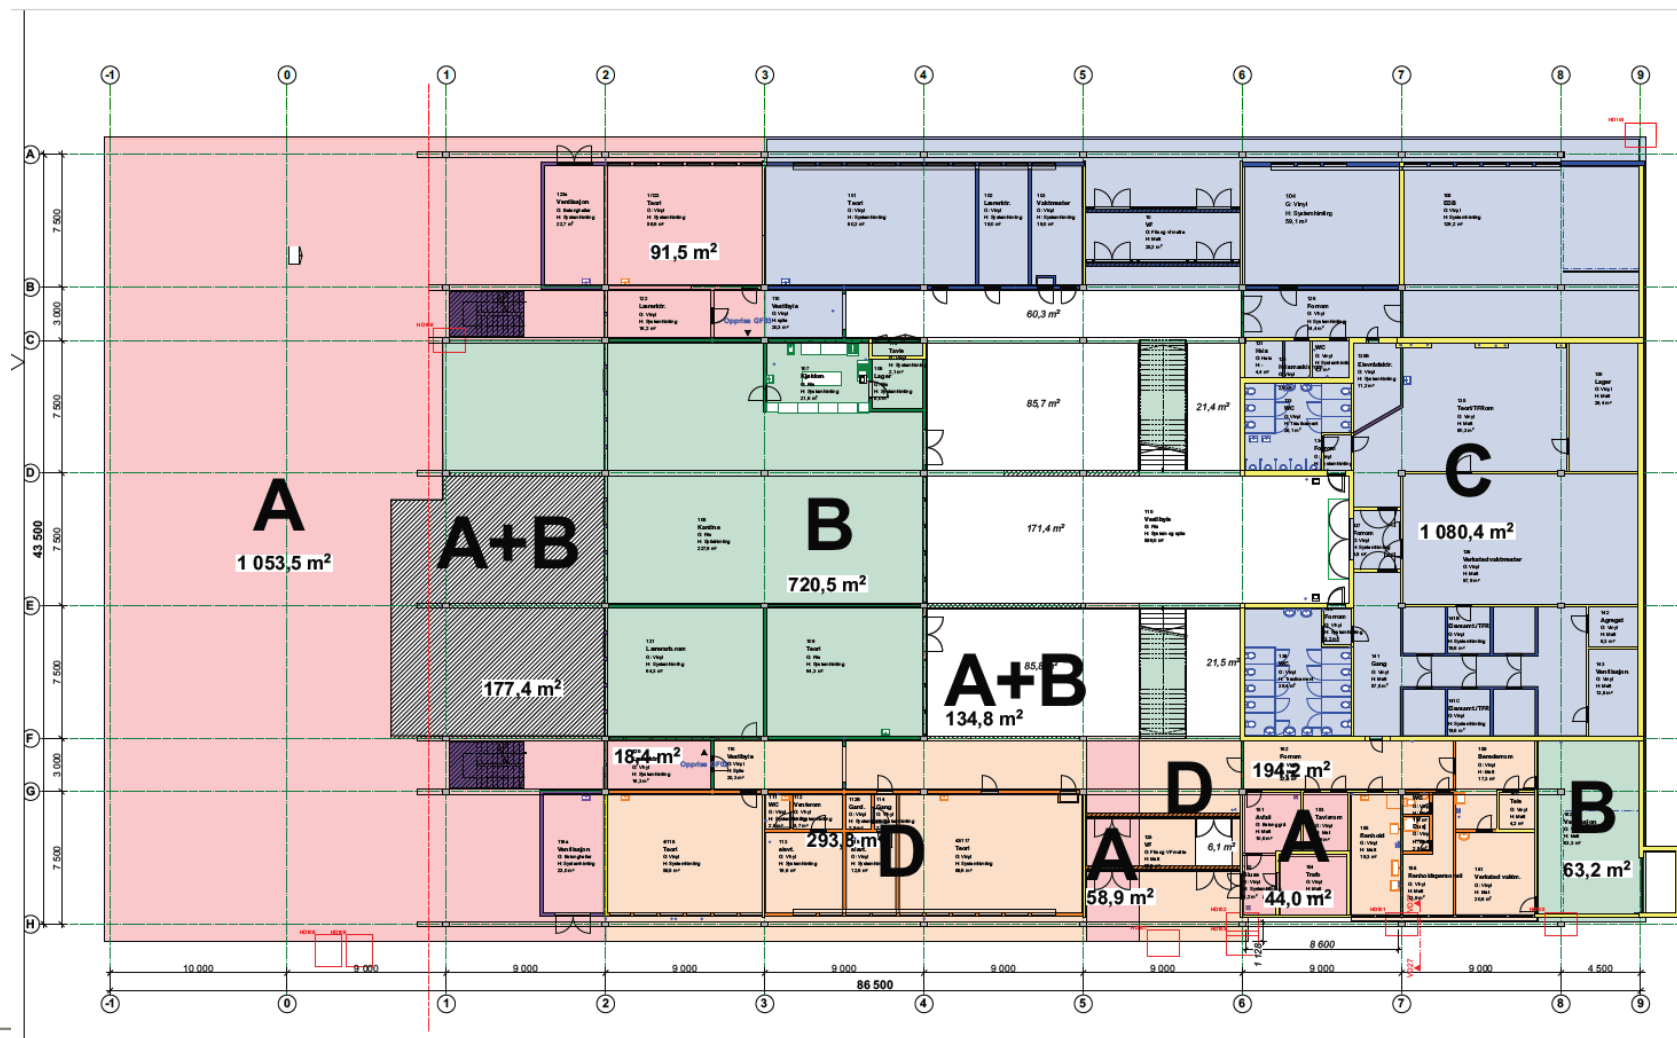

Faseinndeling plan 2

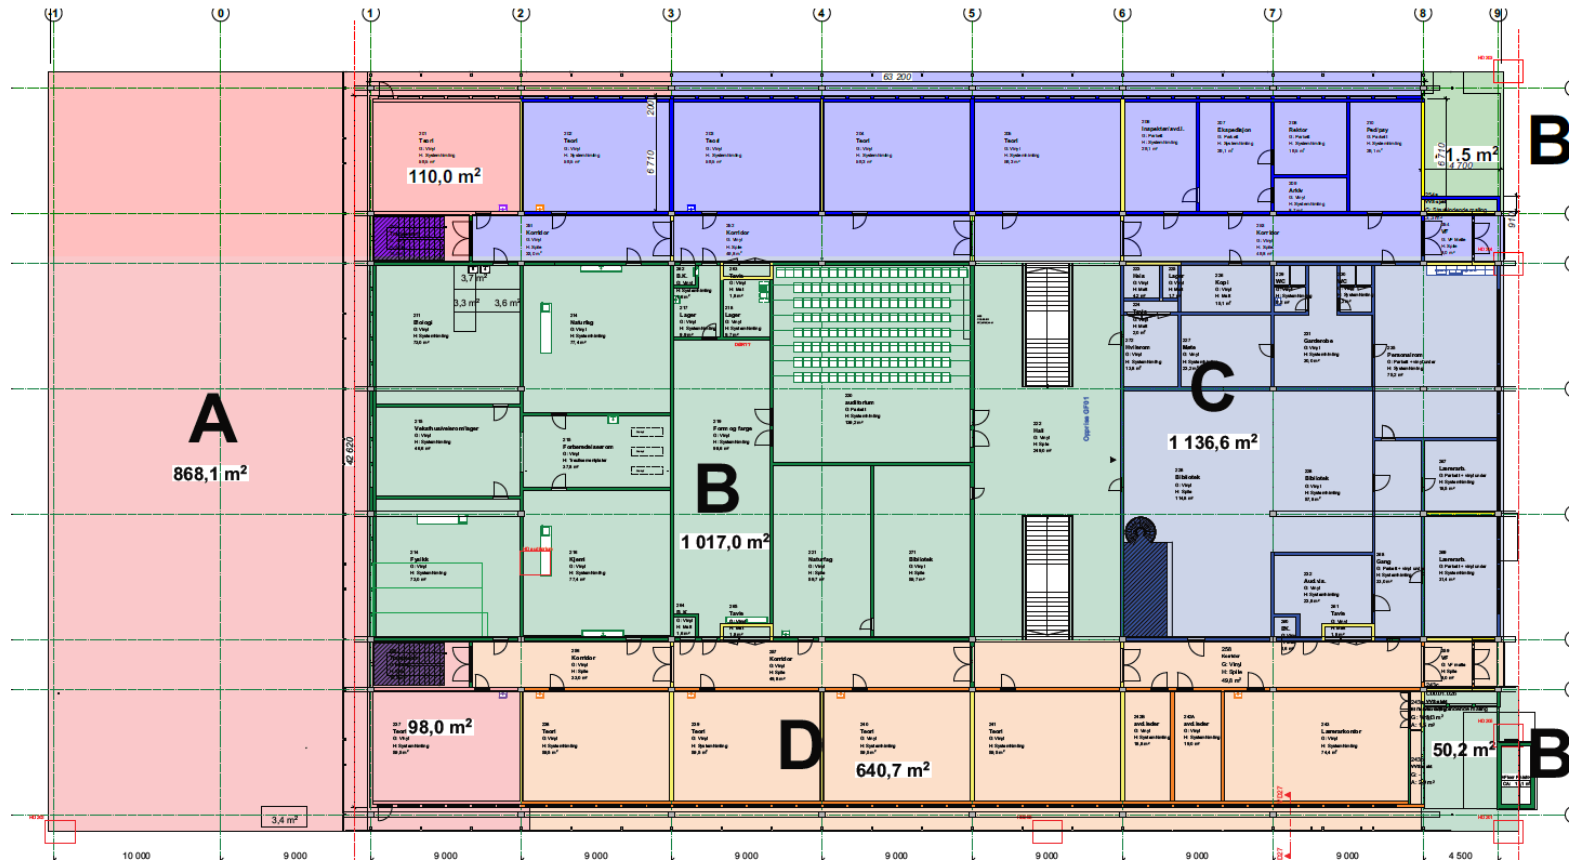



Rutiner for innlevering av anbud

- Leveres på Merzell
- Start i god tid
- Kan legge inn alle kvalifikasjonsdokumenter med en gang
- Husk at offentlige attester ikke skal være eldre enn 6 måneder ved innleveringsfristen
- Husk organisering av tilbudsdokument iht. kap 5.1.5 i Bilag I.

- Spørsmålsfrist: 10.06.2016
- Tilbudsfrist: 20.06.2016 kl. 12.00



Orientering om evaluering

Tildelingskriterier og vekting

Tildeling skal skje på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige. Følgende tildelingskriterier vil bli lagt til grunn og vektet ved evaluering av tilbud:

- | | |
|-------------------------------|-----|
| • 1. Vederlag | 70% |
| • 2. Gjennomføringskompetanse | 30% |



Gjennomføringskompetanse

- Organisasjonskart for prosjektgjennomføringen
 - CV og referanseliste for nøkkelpersonell
 - Kapasitet
 - Beskrivelse av gjennomføringen av prosjektet – Gjennomføringsplan
 - Beskrivelse av erfaring med KNX-programering
 - Beskrivelse av KS-systemet og hvordan dette blir prosjekt tilpasset
 - Vær nøye med å svare opp alt som blir etterspurt i kap. 4.3 i konkurransegrunnlagets del 1.
-



Befaring
